CineSoft Solutions

CineDoom

Manual de Processos de Software

ABNT NBR ISO/IEC/IEEE 12207:2021

GRUPO

Doomscoders

Carlos Eduardo Freire da Silva
Gabriel Henrique Lourenço Dias
Kayque Vicente Silva
Yury Nogueira de Oliveira Silva

ORIENTADORA

Profa. Dra. Juliana Pereira de Souza Zinader

ENGENHARIA DE SOFTWARE

INF INSTITUTO DE INFORMÁTICA

UFG UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS

Carlos Eduardo Freire da Silva
Gabriel Henrique Lourenço Dias
Kayque Vicente Silva
Yury Nogueira de Oliveira Silva

Manual de Processos de Software

Manual de Processos de Software apresentado à disciplina de Processos de Engenharia de Software do curso de Bacharelado em Engenharia de Software da Universidade Federal de Goiás (UFG), como requisito de avaliação para a obtenção da nota final integral da disciplina, referente ao Projeto Integrador.

Orientadora: Profª. Dra. Juliana Pereira de Souza Zinader

GOIÂNIA
2026

Histórico de Versões do Documento

Data	Versão	Descrição Sucinta da Alteração
10/09/2026	**Versão 1.0**	Criação do documento, identificação da equipe, elaboração da capa e estruturação inicial dos Capítulos 1 e 2.
16/09/2026	**Versão 1.1**	Elaboração e estruturação inicial do Capítulo 3.
24/09/2026	**Versão 1.2**	Revisão e adequação dos Capítulos 1 a 3 à norma ABNT NBR ISO/IEC/IEEE 12207:2021.
01/10/2026	**Versão 1.3**	Elaboração e estruturação inicial do Capítulo 4.
07/10/2026	**Versão 1.4**	Elaboração e estruturação inicial do Capítulo 5.
17/10/2026	**Versão 1.5**	Reestruturação da capa e padronização do controle documental.
22/10/2026	**Versão 1.6**	Padronização formal da estrutura editorial dos Capítulos 1 a 5.
23/10/2026	**Versão 1.7**	Consolidação do conteúdo dos Capítulos 1 a 5 e organização dos artefatos.
05/11/2026	**Versão 1.8**	Elaboração e estruturação inicial do Capítulo 6.
09/11/2026	**Versão 2.0**	Revisão das seções 4.1, 4.2 e 4.5 conforme o plano de melhoria e consolidação do Capítulo 6.
09/11/2026	**Versão 2.1**	Revisão e adequação dos elementos dos capítulos e integração à estrutura geral do manual.
12/11/2026	**Versão 2.2**	Revisão.

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Lista de Figuras

Figura 1 – Portal do Cliente: catálogo de filmes e mapa interativo de assentos 16

Figura 2 – Bilheteria presencial: mapa de assentos e operação de guichê 19

Figura 3 – Back-office gerencial: programação de sessões e indicadores de ocupação 20

Figura 4 – Ciclo Iterativo de Desenvolvimento e Roadmap de Evolução do Produto 34

Figura 5 – Organização corporativa CINESOFT-SOLUTIONS no GitHub e repositórios oficiais 37

Figura 6 – Quadro Kanban corporativo no GitHub Projects v2 37

Figura 7 – Estrutura Analítica do Projeto (EAP) do CineDoom 52

Figura 8 – Cronograma macro das macroentregas 54

Figura 9 – Quadro Kanban do projeto no GitHub Projects 58

Figura 10 – Estratégia de branches 62

Figura 11 – Fluxo de release, reversão e correção urgente 64

Figura 12 – Execução do pipeline de integração contínua 65

Figura 13 – Baseline da versão `v1.0.0` no GitHub 65

Figura 14 – Ciclo de vida de um ADR 66

Figura 15 – Registro dos ADRs no repositório 69

Figura 16 – Ciclo de medição e decisão 70

Figura 17 – Evidência do fluxo de trabalho 72

Figura 18 – Cadeia de Rastreabilidade: da Macroentrega 1 ao Teste de Código (exemplo real: Issues #9 e #10) 79

Figura 19 – Diagrama C4 Nível 2: Contêineres da Plataforma CineDoom 91

Figura 20 – Diagrama de Sequência UML: Reserva Online Atômica e Baixa Presencial no Balcão 92

Figura 21 – Diagrama de Classes UML: Modelo de Domínio do CineDoom 93

Figura 22 – Formulário da Pesquisa de Experiência do Usuário (Google Forms) 98

Lista de Tabelas

Tabela 1 – Matriz de Perfis de Usuários e Permissões de Acesso 17
Tabela 2 – Análise de Aquisição: Componentes de Software e Domínio (Make or Buy) 25
Tabela 3 – Análise de Aquisição: Infraestrutura Cloud e Serviços Gerenciados (Make or Buy) 26
Tabela 4 – Perspectiva de Fornecimento e Ativos Comercializáveis 28
Tabela 5 – Acordo de Nível de Serviço (SLA) e Suporte Pós-Entrega 30
Tabela 6 – Identificação dos Fornecedores e Parceiros Relevantes 31
Tabela 7 – Inventário de infraestrutura e ferramentas organizacionais 38
Tabela 8 – Composição da Equipe e Especialidades Técnicas 42
Tabela 9 – Matriz de Responsabilidades por Atividade (RACI) 42
Tabela 10 – Competências Requeridas, Lacunas e Ações 43
Tabela 11 – Plano de Capacitação 44
Tabela 12 – Diretrizes e Princípios de Engenharia Adotados 46
Tabela 13 – Métricas de Qualidade 47
Tabela 14 – Ativos de Conhecimento 48
Tabela 15 – Macroentregas, escopo e critérios de aceite 53
Tabela 16 – Execução das Sprints da Macroentrega 1 55
Tabela 17 – Recursos de infraestrutura e custo estimado 56
Tabela 18 – Protocolo de tratamento de desvios 57
Tabela 19 – Escalas de probabilidade e impacto 59
Tabela 20 – Matriz de prioridade (probabilidade × impacto) 59
Tabela 21 – Identificação e análise dos riscos 59
Tabela 22 – Tratamento e monitoramento dos riscos 60
Tabela 23 – Itens de configuração controlados 62
Tabela 24 – Branches e regras de proteção 62
Tabela 25 – Versionamento semântico e convenção de commits 63
Tabela 26 – Matriz de decisão ponderada da arquitetura base 67
Tabela 27 – Ficha do ADR-001 67
Tabela 28 – Índice dos ADRs 67

Tabela 29 – Plano de medição 70

Tabela 30 – Resultados na Macroentrega 1 (`v1.0.0`) e ação em caso de desvio 71

Tabela 31 – Catálogo Formal de Requisitos Funcionais (`RF-01` a `RF-18`) 74

Tabela 32 – Catálogo Formal de Requisitos Não Funcionais (`RNF-01` a `RNF-06` — ISO/IEC 25010) 77

Tabela 33 – Matriz de Rastreabilidade — Visão Compacta 80

Tabela 34 – Mapeamento de Stakeholders e Técnicas de Elicitação 84

Tabela 35 – Identificação e Escopo do Documento de Arquitetura 85

Tabela 36 – Zonas Internas da Arquitetura e Regras de Dependência 86

Tabela 37 – Catálogo de Componentes (Módulos de Domínio) 86

Tabela 38 – Decisões Arquiteturais (ADRs) e Efeito Verificável 87

Tabela 39 – Critérios Formais de Entrada e Saída de V&V 97

Tabela 40 – Relatório de Testes de Aceitação e Homologação em Produção 99

Tabela 41 – Planejamento da Transição por Branch e Ambiente 100

Tabela 42 – Modalidades de Manutenção 104

Tabela 43 – Etapas da Descontinuação e Migração de Dados 105

Tabela 44 – Diagnóstico de Avaliação e Maturidade de Processo (Versão 1.7) 108

Tabela 45 – Plano de Melhoria de Processo de Software (PMP) 109

Tabela 46 – Quadro Comparativo: Antes vs. Depois da Revisão de Processos 110

Tabela 47 – Reavaliação Pós-Melhoria da Conformidade do Manual (Versão 2.0) 115

Lista de Abreviaturas e Siglas

ABNT	Associação Brasileira de Normas Técnicas
ADR	*Architecture Decision Record*
API	*Application Programming Interface*
B2B / B2C	*Business-to-Business / Consumer*
CI / CD	*Continuous Integration / Deployment*
DoD / DoR	*Definition of Done / Definition of Ready*
GPP	Gerência de Portfólio de Projetos
GPR	Gerência de Projetos (MPS.BR — Nível G)
GQM	*Goal-Question-Metric*
GQA	Garantia da Qualidade (MPS.BR — Nível F)
GCO	Gerência de Configuração (MPS.BR — Nível F)
IEC	*International Electrotechnical Commission*
IEEE	*Institute of Electrical and Electronics Engineers*
ISO	*International Organization for Standardization*
JWT	*JSON Web Token* (RFC 7519)
LGPD	Lei Geral de Proteção de Dados (Lei 13.709/2018)
MED	Medição (MPS.BR — Nível F)
MPS.BR	Melhoria de Processo do Software Brasileiro
MTTR	*Mean Time To Recovery*
MVP	*Minimum Viable Product*
NFC-e	Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica
ORM	*Object-Relational Mapping*
PaaS	*Platform as a Service*
PIX	Pagamento Instantâneo Brasileiro
PMP	Plano de Melhoria de Processo
PPR	Processo Padrão de Requisitos
QA	*Quality Assurance*
RBAC	*Role-Based Access Control*
SaaS	*Software as a Service*
SLA / SLO	*Service Level Agreement / Objective*
SPICE	ISO/IEC 15504 Process Improvement
UFG	Universidade Federal de Goiás
UI / UX	*User Interface / User Experience*
V&V	Verificação e Validação
WBS / EAP	*Work Breakdown Structure* (Estrutura Analítica do Projeto)

Sumário

Capítulo 1 — Apresentação do Software 13

1.1 Nome e Descrição do Software 13

1.2 Qual é o Software? O que ele faz? Qual problema resolve? 13

O que ele faz? 13

Qual problema resolve? 14

Proposta de valor 14

1.3 Público-alvo e Contexto de Uso 14

Contextos de uso típicos 15

1.4 Quem vai usar? Em que situação? Qual o ambiente de operação esperado? 16

Perfis de Usuários e Situações de Uso 16

Ambiente de Operação Esperado 18

1.5 Escopo e principais funcionalidades 19

Funcionalidades Incluídas (Escopo Atual) 19

Fora do Escopo Imediato 21

1.6 Restrições e premissas 21

Restrições do Projeto 21

Premissas Adotadas 22

Capítulo 2 — Processos de Acordo 24

2.1 Processo de Aquisição: Decisões e Gestão de Provedores 24

O que construímos e o que contratamos (*Make or Buy*) 24

O Ciclo Prático de Aquisição de Provedores 26

2.2 Processo de Fornecimento: Comercialização, Entrega e Operação 27

Modelos de Negócio e Ativos Disponíveis 27

Jornada do Cliente: Da Contratação ao Pós-Venda 28

Entregáveis da Implantação e Evolução Funcional 29

Critérios de Aceite Formal 29

Níveis de Serviço (SLA) e Atendimento 30

2.3 Fornecedores e Parceiros de Tecnologia 30

Capítulo 3 — Processos Organizacionais Habilitadores 33

3.1 Modelo de Ciclo de Vida do Projeto 33

Fases de Engenharia e Evolução em Três Macroentregas 33
Fluxo de Trabalho no Git (Política Corporativa de Branches) 34
Organização das Iterações e Práticas de Trabalho 35
Governança, Avaliação e Melhoria Contínua do Ciclo de Vida 35
3.2 Infraestrutura e Ferramentas Organizacionais 36
Critérios de Seleção e Requisitos 36
A Organização no GitHub (`CINESOFT-SOLUTIONS`) 36
Inventário de Ferramentas Disponibilizadas 38
Ambientes de Execução e Manutenção Contínua 38
3.3 Justificativa Estratégica e Viabilidade do Projeto 39
Oportunidade e Alinhamento Estratégico 39
Identificação e Autorização do Projeto 40
Dimensões de Viabilidade 40
Alocação de Recursos 41
Avaliação, Sustentação e Encerramento 41
3.4 Papéis, Competências e Plano de Capacitação (RACI) 41
Composição da Equipe e Atribuição de Papéis 42
Matriz de Responsabilidades (RACI) 42
Competências Requeridas e Lacunas 43
Plano de Capacitação Contínua 44
Avaliação, Registros e Riscos da Equipe 44
3.5 Plano de Qualidade: Diretrizes, Critérios e Métricas 45
Política e Objetivos de Qualidade 45
Responsabilidades 45
Diretrizes e Princípios de Engenharia Adotados 45
Critérios de Qualidade e Bloqueios Automatizados (*Quality Gates*) 46
Métricas e Indicadores de Qualidade 47
Avaliação do Processo e Tratamento de Não Conformidades 47
Melhoria Contínua 48
3.6 Estratégia de Gestão do Conhecimento 48
Objetivos 48
Ativos de Conhecimento 48
Mecanismos de Registro e Preservação 49
Compartilhamento do Conhecimento 49
Manutenção e Controle 49

Medição da Eficácia 50

Capítulo 4 — Processos de Gerenciamento Técnico 52

4.1 Plano de projeto: escopo, cronograma, recursos e entregas 52

Estrutura Analítica do Projeto (EAP) 52

Escopo e Marcos por Macroentrega 52

Cronograma 54

Recursos 55

Premissas e Restrições 56

Rotina de Acompanhamento e Tratamento de Desvios 57

4.2 Plano de gestão de riscos: identificação, probabilidade, impacto e respostas 58

Critérios de Classificação 59

Registro de Riscos 59

4.3 Plano de gestão de configuração: controle de versões, branches e releases 61

Itens de Configuração 62

Estratégia de Branches 62

Baselines, Versionamento e Releases 63

Auditoria e Registro de Status 64

4.4 Registro de decisões técnicas relevantes (ADRs) 65

Processo de Decisão 65

Matriz de Decisão Ponderada: Arquitetura Base (ADR-001) 66

Índice de Decisões (ADR-001 a ADR-012) 67

4.5 Métricas de acompanhamento do projeto 69

Capítulo 5 — Processos Técnicos 74

5.1 Requisitos 74

5.1.1 Documento de requisitos do sistema 74

5.1.2 Rastreabilidade de requisitos 78

5.1.3 Critérios de aceitação (`CA-01` a `CA-15`) 81

5.1.4 Registro de stakeholders e necessidades elicitadas 83

5.2 Arquitetura e Design 84

5.2.1 Documento de arquitetura do sistema 84

5.2.2 Diagramas de design 90

5.2.3 Justificativa das escolhas tecnológicas 93

5.2.4 Estratégia de gestão de mídias e desacoplamento de storage 94

5.3 Implementação e Integração 94

5.3.1 Padrões de codificação e engenharia adotados 94
5.3.2 Plano de integração entre componentes (CI/CD) 95
5.3.3 Registro de testes unitários e de integração 95
5.3.4 Rastreabilidade entre código e requisitos 96
5.4 Verificação, Validação e Transição 96
5.4.1 Plano de verificação e validação 96
5.4.2 Critérios de aceitação por stakeholder 97
5.4.3 Relatório de testes de aceitação (Homologação e Produção) 98
5.4.4 Plano de transição/implantação do sistema 100
5.5 Operação, Manutenção e Descontinuação 103
5.5.1 Procedimentos de operação e monitoramento 103
5.5.2 Plano de manutenção 103
5.5.3 Estratégia de descontinuação e migração de dados 104
Capítulo 6 — Avaliação e melhoria dos processos 107
6.1 Referencial e recorte 107
6.2 Diagnóstico do manual 107
6.3 Plano de uma melhoria 108
6.4 Atualização e verificação 109
Quadro Comparativo: Antes vs. Depois da Revisão (Seções 4.1, 4.2 e 4.5) 110
Reavaliação Pós-Melhoria (Verificação da Eficácia Documental) 115
6.5 Acompanhamento da execução 115
Referências Normativas do Capítulo 116
Referências 117

CineDoom

Manual de Processos de Software

CAPÍTULO 1

Apresentação do Software

CineSoft Solutions | CineDoom

Capítulo 1 — Apresentação do Software

1.1 Nome e Descrição do Software

Nome do Software: CineDoom. **Organização desenvolvedora:** CineSoft Solutions.

O **CineDoom** é uma plataforma web de gerenciamento operacional e bilheteria para cinemas, desenvolvida no modelo **Software as a Service (SaaS) multi-tenant**. Sua arquitetura permite que diferentes cinemas utilizem o mesmo sistema em nuvem, mantendo os dados, configurações e operações de cada estabelecimento totalmente separados.

O produto é desenvolvido pela **CineSoft Solutions**, empresa de tecnologia focada em soluções para o mercado de exibição cinematográfica. O CineDoom foi concebido para atender cinemas de rua, circuitos independentes e redes de pequeno e médio porte, integrando a administração do estabelecimento, a bilheteria física e o atendimento digital aos espectadores em um sistema único.

1.2 Qual é o Software? O que ele faz? Qual problema resolve?

O **CineDoom** é uma plataforma SaaS multi-tenant que unifica a gestão operacional, o atendimento presencial e os serviços digitais de cinemas em uma única base transacional.

▶ O que ele faz?

A plataforma integra as três vertentes operacionais do cinema:

1. **Gestão e Back-office:** permite cadastrar filmes, configurar salas com layouts de assentos, programar sessões com preços específicos e acompanhar taxas de ocupação em tempo real.
2. **Bilheteria Presencial:** disponibiliza terminais de guichê para consulta de sessões, seleção de poltronas em mapa interativo, emissão de ingressos e baixa de reservas originadas na web.
3. **Portal do Espectador:** disponibiliza ao público a consulta da programação, escolha de assentos e aquisição ou reserva antecipada com emissão de comprovante digital.

O sistema mantém o mapa de assentos sincronizado entre a bilheteria e a web, garantindo que uma poltrona vendida ou reservada em um canal fique indisponível nos demais de forma imediata.

▶ **Qual problema resolve?**

Cinemas independentes frequentemente operam com sistemas de ponto de venda legados, planilhas ou controles em papel que não se comunicam com a internet.

Essa fragmentação gera três problemas críticos:

1. **Conflito de assentos (*double-booking*):** risco permanente de vender a mesma poltrona no balcão e na web para a mesma sessão.
2. **Inacessibilidade para o público:** dependência exclusiva de filas físicas, impedindo o espectador de consultar horários e garantir lugares com antecedência.
3. **Decisões sem visibilidade de dados:** ausência de métricas consolidadas sobre ocupação real das salas e horários de maior demanda.

O CineDoom elimina esses problemas ao unificar o inventário de assentos e as vendas em um banco relacional compartilhado, substituindo controles paralelos por uma operação única e auditável.

▶ **Proposta de valor**

Para o cinema, o CineDoom entrega redução de custos operacionais, segurança contra vendas duplas e visibilidade da ocupação em tempo real. Para o espectador, proporciona comodidade na consulta da programação e autonomia para escolher suas poltronas com antecedência.

1.3 Público-alvo e Contexto de Uso

O público-alvo do CineDoom é estruturado em três segmentos principais:

- **Clientes Corporativos (B2B):** Cinemas de rua, circuitos independentes, cineclubes e redes exibidoras de pequeno e médio porte. São organizações que necessitam modernizar sua bilheteria e gestão operacional, mas que não dispõem de equipes internas de TI ou recursos para investir em soluções corporativas proprietárias de alto custo.
- **Consumidores Finais (B2C):** Espectadores de cinema que utilizam navegadores em smartphones, tablets ou computadores para consultar a programação em cartaz, verificar horários, escolher assentos em mapas visuais e garantir ingressos ou reservas com comodidade antes de se deslocarem ao local.
- **Usuários Operacionais Locais:** Funcionários do próprio cinema (gerentes e atendentes de guichê) responsáveis pela operação diária das salas, atendimento ao público presencial e administração das sessões.


Contextos de uso típicos

O sistema opera de forma integrada em três cenários de uso distintos:

1. **Canal Web do Espectador (Acesso Remoto):** Utilizado pelo público externo em trânsito ou no domicílio, com foco em facilidade de navegação em telas móveis e desktop para tomada rápida de decisão e reserva antecipada de assentos.
2. **Ambiente de Bilheteria Presencial (Ponto de Venda Físico):** Terminais de guichê operados pelos atendentes no saguão do cinema. O contexto de uso exige interface ágil e tempo mínimo de resposta por transação para dar vazão rápida ao fluxo de clientes em horários de pico pré-sessão.
3. **Ambiente Administrativo de Back-office (Escritório do Cinema):** Utilizado pela gerência para o planejamento estratégico semanal, parametrização do catálogo de filmes, agendamento de horários na grade e monitoramento em tempo real dos indicadores de ocupação das salas.

A Figura 1 ilustra a interface do Portal do Cliente, apresentando o catálogo de filmes em cartaz e o mapa interativo de assentos disponível para o espectador.

Figura 1 – Portal do Cliente: catálogo de filmes e mapa interativo de assentos

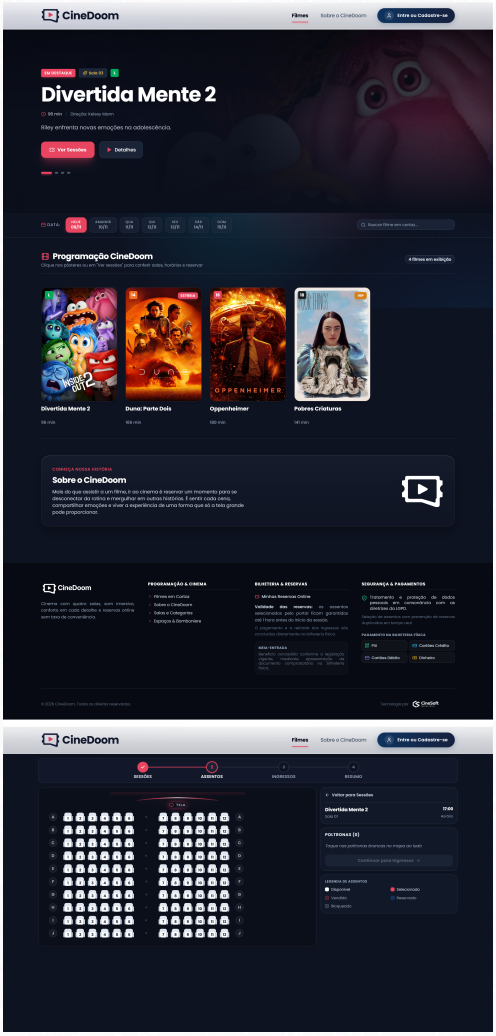

Fonte: CineSoft Solutions (2026)

1.4 Quem vai usar? Em que situação? Qual o ambiente de operação esperado?

▶ Perfis de Usuários e Situações de Uso

- **Espectador (Cliente B2C):**
  - *Quem é:* O público consumidor que busca lazer e entretenimento cinematográfico.
  - *Em que situação atua:* Acessa o Portal do Cliente pelo smartphone ou computador pessoal em momentos de lazer para consultar filmes em cartaz, verificar horários, escolher assentos em mapas visuais, efetuar reservas antecipadas e consultar seus vouchers digitais ao comparecer ao cinema.
- **Atendente de Bilheteria (Operador de Guichê):**
  - *Quem é:* O funcionário responsável pela operação física de venda e recepção no cinema.

  - *Em que situação atua:* Atua nos pontos de venda presenciais do saguão durante os horários de funcionamento, especialmente nos momentos de pico pré-sessão, realizando vendas rápidas no balcão, localizando reservas digitais por código ou CPF para confirmação de pagamento e emitindo ingressos físicos.

- **Gerente do Cinema (Gestor Operacional):**
  - *Quem é:* O administrador local responsável pelas salas, programação e equipe.
  - *Em que situação atua:* Atua no back-office administrativo (rotina semanal e diária) para cadastrar acervo de filmes, configurar o layout de salas e poltronas, agendar a grade de sessões com seus respectivos valores, gerenciar as contas dos atendentes e analisar relatórios de ocupação das salas.
- **Administrador da Plataforma (Operação Técnica CineSoft):**
  - *Quem é:* A equipe técnica de sustentação da desenvolvedora.
  - *Em que situação atua:* Atua na ativação e configuração inicial de novos cinemas (*onboarding* de *tenants*), monitoramento de telemetria, análise de logs de auditoria e suporte aos gestores dos estabelecimentos.

A Tabela 1 sintetiza a matriz de perfis de usuários, seus respectivos canais de acesso, escopos de isolamento e permissões na plataforma:

Tabela 1 – **Matriz de Perfis de Usuários e Permissões de Acesso**

Perfil (RBAC)	Canal de Acesso	Escopo de Dados	Permissões e Operações no Domínio
Espectador `CLIENTE`	Portal do Espectador *Web Responsivo*	Dados pessoais e reservas do titular (*LGPD Art. 18*)	Consultar catálogo e sessões; selecionar poltronas em mapa interativo; solicitar reserva com bloqueio atômico; emitir voucher transacional; cancelar reserva dentro do prazo.
Atendente `ATENDENTE`	Bilheteria Presencial *PDV Guichê Físico*	Sessões, assentos e vendas do cinema (`tenant_id`)	Venda direta no balcão com trava anti-*double-booking*; busca de reservas web por CPF ou código; baixa presencial com emissão de ingressos; cancelamento assistido auditado.
Gerente `GERENTE`	Painel Gerencial *Back-office Administrativo*	Gestão operacional do cinema local (`tenant_id`)	Cadastrar filmes; configurar salas e matrizes de poltronas; agendar grade de sessões com valores de ingresso; gerenciar operadores de guichê; acompanhar relatórios de ocupação.
Administrador `ADMIN`	Console de Operações *Plataforma CineSoft*	Infraestrutura e cinemas clientes (*cross-tenant*)	Ativação de novos cinemas (*onboarding* de *tenants*); auditoria de segurança e integridade de dados; monitoramento de telemetria; suporte técnico à operação.

Fonte: CineSoft Solutions (2026)


Ambiente de Operação Esperado

O CineDoom é uma aplicação 100% web operada em nuvem, eliminando a necessidade de instalação de softwares locais:

- **Dispositivos de Hardware:**
  - *Bilheteria Física:* Computadores desktop, notebooks ou tablets com teclado, mouse ou tela sensível ao toque nos guichês de atendimento.
  - *Acesso do Espectador:* Smartphones (iOS e Android), tablets, notebooks e computadores pessoais.
  - *Administração:* Computadores de escritório convencionais.
- **Navegadores Homologados:** Principais navegadores web modernos com suporte a padrões ECMAScript atuais (Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari e Microsoft Edge).
- **Conectividade:** Conexão estável com a internet (banda larga fixa ou rede móvel 4G/5G), necessária para a sincronização contínua dos assentos e processamento das transações em nuvem.
- **Responsividade e Telas:** Interface adaptativa homologada para operar desde telas móveis compactas (a partir de 320px de largura) até monitores desktop de alta resolução (Full HD e superiores).

A Figura 2 apresenta a interface da bilheteria presencial, utilizada pelo atendente para a venda direta de ingressos e a baixa de reservas originadas no portal.

Figura 2 – Bilheteria presencial: mapa de assentos e operação de guichê

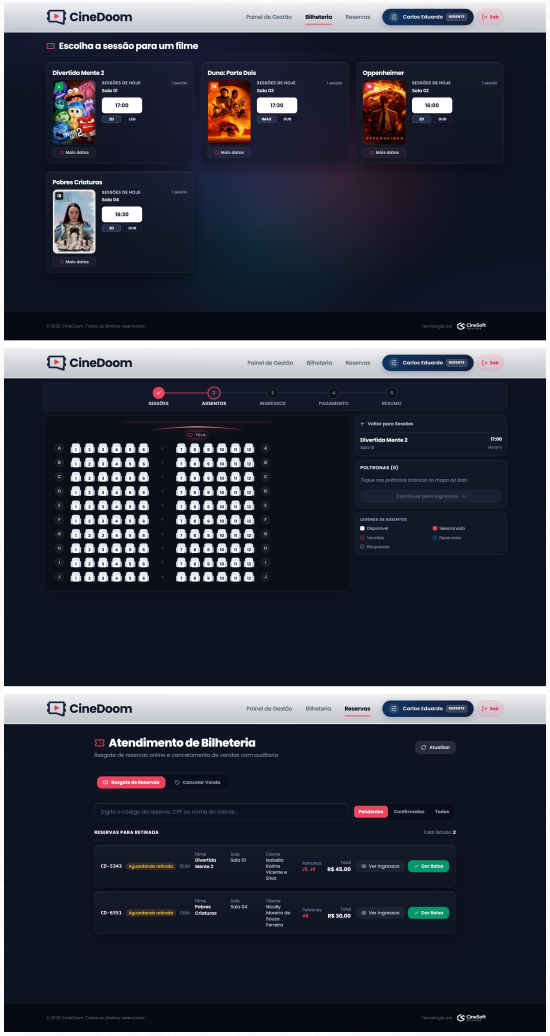

Fonte: CineSoft Solutions (2026)

1.5 Escopo e principais funcionalidades

O CineDoom é desenvolvido em entregas incrementais. O escopo atual compreende o núcleo operacional do produto (**Macroentrega 1 — Release 1.0**), enquanto funcionalidades complementares estão alocadas no roadmap futuro.

▶ Funcionalidades Incluídas (Escopo Atual)


O núcleo operacional entregue pela equipe contempla quatro grupos de funcionalidades:

- **Gestão e Programação (Back-office):** Cadastro de filmes em cartaz, montagem de salas com layouts de assentos, agendamento de sessões com prevenção de choques de horário e painel com taxas de ocupação em tempo real.

- **Bilheteria Presencial (Ponto de Venda):** Consulta rápida de sessões, seleção visual de poltronas, venda de ingressos com trava contra assentos duplicados (*anti-double-booking*), baixa de reservas web e cancelamento auditado.
- **Portal do Espectador (Canal Digital):** Consulta da programação, seleção de assentos no mapa interativo, reserva antecipada, emissão de voucher por e-mail e cancelamento voluntário pelo cliente.
- **Segurança e Governança:** Controle de acesso por perfis (`GERENTE`, `ATENDENTE` e `CLIENTE`), isolamento multi-tenant de dados e proteção de CPF com suporte a anonimização (LGPD).

A Figura 3 apresenta a interface do back-office, utilizada pela gerência para acompanhar a programação e a ocupação das salas.

Figura 3 – **Back-office gerencial: programação de sessões e indicadores de ocupação**

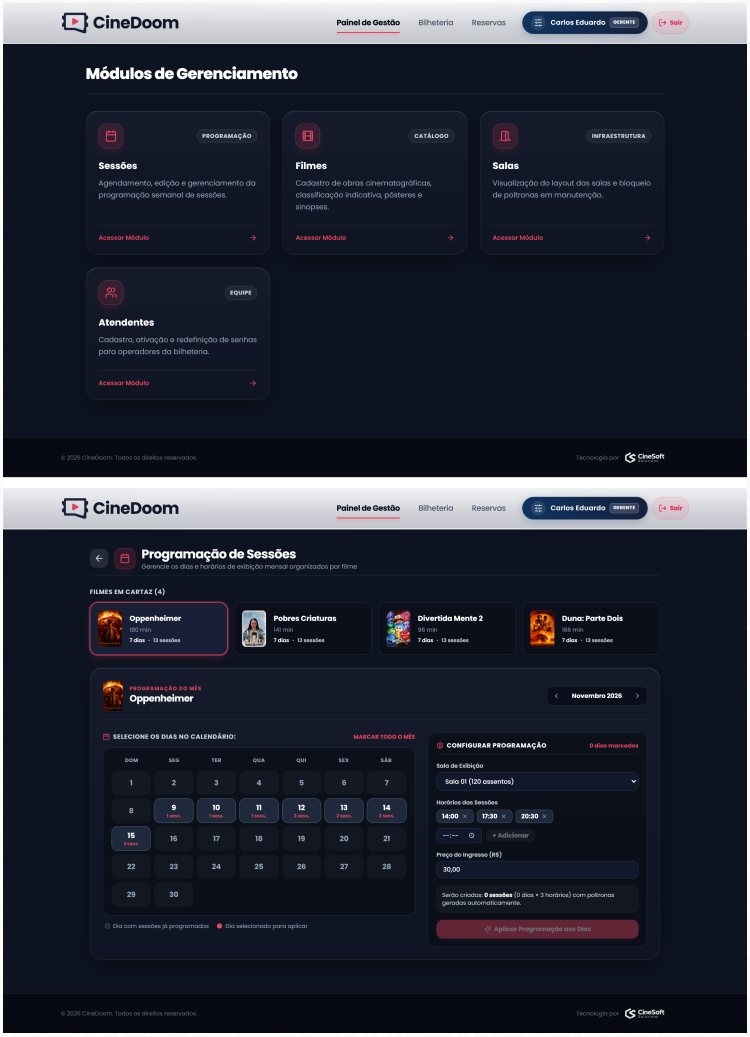

Fonte: CineSoft Solutions (2026)

Fora do Escopo Imediato

Em conformidade com as boas práticas de engenharia de software e gestão de produto, delimita-se expressamente o que não faz parte da entrega atual:

A. Funcionalidades Planejadas no Roadmap Evolutivo (Macroentregas 2 e 3)

- **Macroentrega 2 (Escala e Pagamentos Digitais):** Integração de gateway de pagamento online para checkout web (PIX com QR Code dinâmico e cartão de crédito), serviço de mensageria em larga escala (`Resend Pro`) e migração para banco de dados dedicado com alta disponibilidade.
- **Macroentrega 3 (Enterprise e Fiscal):** Módulo de emissão fiscal automatizada de cupons (NFC-e / SAT integrada à SEFAZ), ponto de venda integrado para bomboniere (gestão de pipoca, bebidas e estoque), faturamento recorrente automatizado de assinaturas SaaS (*Billing*) e programas de fidelidade.

B. Funcionalidades Fora do Escopo Global da Plataforma

- **Aplicativos Móveis Nativos:** O CineDoom não prevê publicação de instaladores em lojas (App Store / Google Play); a experiência é provida integralmente por aplicação web responsiva moderna.
- **Streaming e Distribuição Audiovisual:** A plataforma destina-se exclusivamente à gestão de exibição cinematográfica física, não realizando transmissão ou streaming de arquivos de vídeo.

1.6 Restrições e premissas

Restrições do Projeto

As seguintes imposições legais, regulatórias e arquiteturais delimitam o projeto global do CineDoom:

- **Conformidade com a LGPD (Lei 13.709/2018):** Exige consentimento explícito, proteção criptográfica de identificadores (CPF cifrado com `AES-256-GCM` e indexado via `HMAC-SHA256`) e mecanismos para anonimização irreversível dos dados a pedido do titular (Art. 18), preservando registros fiscais e contábeis do cinema.
- **Segurança em Pagamentos Digitais (PCI-DSS e Bacen):** O processamento de pagamentos online deve ser delegado a gateways homologados. É vedado à plataforma armazenar dados sensíveis de cartões (*PAN* e *CVV*), operando exclusivamente por tokenização e webhooks seguros.

- **Operação Exclusiva em Nuvem (Sem Modo Offline):** Para manter a sincronização dos assentos em tempo real e eliminar o risco de venda duplicada (*double-booking*), o sistema opera 100% em nuvem, exigindo conectividade contínua com a internet.
- **Isolamento de Dados em Arquitetura Multi-Tenant:** Em infraestrutura compartilhada, a camada de dados é estritamente condicionada à segregação lógica por cinema (`tenant_id`), sendo inadmissível qualquer vazamento de informações entre clientes.
- **Regulação Cinematográfica (Ancine):** A exibição de catálogo e sessões deve atender às normas regulatórias do setor, como a exibição obrigatória da classificação indicativa e o controle de cotas de tela nacionais.
- **Dependência de Serviços Gerenciados em Nuvem:** A disponibilidade da plataforma está sujeita aos acordos de nível de serviço (SLA) e limites de uso dos provedores de nuvem parceiros (banco gerenciado e serviço de mensageria).

▶ Premissas Adotadas

As seguintes condições foram assumidas como verdadeiras para viabilizar as regras e a operação da plataforma:

- **Infraestrutura Local nos Cinemas:** Assume-se que os estabelecimentos clientes dispõem de computadores ou tablets funcionais nos guichês e conexão estável à internet durante todo o horário de exibição.
- **Acesso Digital dos Espectadores:** Assume-se que o público-alvo possui dispositivos conectados (smartphones ou computadores) para consultar horários e garantir ingressos ou reservas pela web.
- **Atomicidade Transacional por Banco Relacional:** Assume-se que o mecanismo de bloqueio pessimista do banco relacional (PostgreSQL) é suficiente para serializar tentativas de compra simultânea, impedindo conflito de assentos em picos de demanda.
- **Política Operacional de Desistências (*No-Show*):** Assume-se que reservas web não confirmadas dentro do prazo limite programado configuram desistência, permitindo ao sistema liberar essas poltronas para nova comercialização.
- **Confiabilidade de Provedores Externos:** Assume-se que as APIs integradas de nuvem, mensageria e pagamentos manterão índices de disponibilidade superiores a 99% e contratos de integração estáveis.

CineDoom

Manual de Processos de Software

CAPÍTULO 2

Processos de Acordo

Capítulo 2 — Processos de Acordo

Este capítulo estabelece como a **CineSoft Solutions** gerencia suas relações comerciais e técnicas, fundamentando-se nas boas práticas da norma ABNT NBR ISO/IEC/IEEE 12207:2021 para os processos de **Aquisição** e **Fornecimento**.

A abordagem adotada busca equilibrar rigor de engenharia e pragmatismo operacional: define claramente o que construir internamente versus o que contratar de terceiros (*Make or Buy*), estrutura a jornada de entrega e suporte da plataforma **CineDoom** para os cinemas clientes, e mapeia os parceiros de infraestrutura que viabilizam o sistema.

2.1 Processo de Aquisição: Decisões e Gestão de Provedores

No papel de adquirente, a CineSoft Solutions adota uma diretriz clara: **o esforço interno de desenvolvimento é concentrado no coração das regras de negócio do cinema e nos diferenciais competitivos do CineDoom**. Todo serviço em que o mercado já oferece soluções maduras, seguras e com economia de escala é contratado como serviço ou biblioteca, reduzindo tempo de desenvolvimento e custo operacional.

▶ O que construímos e o que contratamos (*Make or Buy*)

- **Desenvolvimento Interno (*Make*):** O motor de bilheteria e reservas atômicas com bloqueio pessimista (`SELECT FOR UPDATE`), a máquina de estados de assentos com liberação automática de ingressos expirados, o isolamento lógico multi-tenant entre diferentes redes de cinema e os mecanismos de anonimização exigidos pela LGPD. Esses itens compõem a propriedade intelectual e o diferencial de confiabilidade da CineSoft.
- **Soluções Prontas de Terceiros (*Buy*):** Infraestrutura de banco de dados gerenciado (PostgreSQL no Supabase), hospedagem serverless com distribuição global (Vercel), mensageria de e-mails transacionais (Resend), retenção de logs para auditoria (Axiom), processamento de pagamentos digitais (Stripe/Pagar.me na Macroentrega 2) e mensageria fiscal de notas (Focus NFe na Macroentrega 3).

As tabelas a seguir detalham a justificativa técnica e econômica de cada decisão:

Tabela 2 – Análise de Aquisição: Componentes de Software e Domínio (Make or Buy)

Elemento do sistema	Adquirir pronto?	Justificativa	Possível fornecedor
Motor de Bilheteria e Reserva Atômica ACID	**Não**	Diferencial competitivo central. Exige controle estrito sobre locks pessimistas (`SELECT FOR UPDATE`) para impedir venda dupla entre web e guichê físico.	Desenvolvimento interno (CineSoft Solutions)
Isolamento Multi-Tenant e Governança de Dados	**Não**	Núcleo do modelo SaaS B2B. A injeção automática de `tenant_id` via Prisma Client Extensions garante isolamento seguro na mesma base relacional com baixo custo.	Desenvolvimento interno sobre Prisma Extensions
Módulo de Criptografia e Anonimização LGPD	**Não**	Requisito legal (LGPD Art. 18 e 46). Exige anonimização irreversível sob demanda sem corromper o histórico fiscal de ingressos vendidos pelo cinema.	Desenvolvimento interno (`Node.js crypto`)
Autenticação, Sessão JWT e Controle RBAC	**Parcial**	Adota biblioteca madura (`NextAuth.js`) para gerenciar sessões e cookies seguros, desenvolvendo internamente a matriz de perfis (`RBAC`) e o vínculo por cinema.	`NextAuth.js` + Middleware proprietário CineSoft
Interface Gráfica e Mapa Interativo de Salas	**Parcial**	Aproveita bibliotecas de mercado (`Tailwind`, `Lucide`) para primitivas visuais, desenvolvendo sob medida a matriz reativa de poltronas e o fluxo do guichê.	`Tailwind CSS`, `Lucide Icons` + Componentes CineSoft
ORM e Validação de Schemas de Entrada	**Sim**	Padrão de mercado que provê tipagem estrita (*type-safety*) e proteção nativa contra *SQL Injection*, sendo antieconômico construir do zero.	`Prisma ORM` e `Zod` (Open Source / MIT)

Fonte: CineSoft Solutions (2026)

Tabela 3 – Análise de Aquisição: Infraestrutura Cloud e Serviços Gerenciados (Make or Buy)

Elemento do sistema	Adquirir pronto?	Justificativa	Possível fornecedor
Banco de Dados Relacional Gerenciado (DBaaS)	**Sim**	Elimina custos de DBA, provendo restauração pontual automatizada (PITR), *connection pooling* para serverless e alta disponibilidade ($\geq 99{,}9\%$).	**Supabase Pro (PostgreSQL)**
Plataforma de Hospedagem Serverless e CDN	**Sim**	Elimina a manutenção de servidores dedicados, entregando deploys atômicos com reversão para a versão anterior, proteção DDoS e distribuição global na borda.	**Vercel Pro** (Cloud PaaS)
Serviço de Disparo de E-mails Transacionais	**Sim**	Evita que vouchers caiam em caixas de spam; a API especializada assegura entrega em milissegundos com autenticação SPF, DKIM e DMARC.	**Resend** (SaaS de E-mail Transacional)
Observabilidade e Retenção Legal de Logs	**Sim**	Cumpre a retenção legal de logs por 1 ano (Marco Civil e LGPD) sem sobrecarregar o armazenamento do banco relacional, com busca indexada rápida.	**Axiom Cloud** (Log Drain SaaS)
Gateway de Pagamento Online (Macroentrega 2)	**Sim**	Transfere a complexidade regulatória da certificação PCI-DSS Nível 1 e antifraude, automatizando a liquidação de PIX dinâmico e cartões.	**Stripe / Pagar.me**
Motor de Mensageria Fiscal NFC-e (Macroentrega 3)	**Sim**	Abstrai as constantes mudanças tributárias estaduais da SEFAZ, contingência offline e assinatura digital com certificado A1, evitando passivos fiscais.	**Focus NFe / PlugNotas**

Fonte: CineSoft Solutions (2026)

▶ O Ciclo Prático de Aquisição de Provedores

Para selecionar e manter esses provedores em operação contínua, a CineSoft Solutions estrutura a contratação em cinco etapas práticas:

1. **Definição de Requisitos e Critérios:** O Arquiteto e os líderes técnicos mapeiam as restrições de cada necessidade — limites de latência (priorizando servidores na América do Sul), compatibilidade com Node.js/Next.js, conformidade com a LGPD e facilidade de integração local.

2. **Avaliação Técnica e Financeira:** São realizados testes práticos de integração (provas de conceito) entre alternativas de mercado (por exemplo, comparando Supabase versus PostgreSQL autogerenciado, ou Resend versus AWS SES), analisando a previsibilidade de custos à medida que o volume de bilheteria cresce.

3. **Contratação e Formalização:** Assinatura digital dos planos corporativos, formalização de Aditivos de Proteção de Dados (*Data Processing Agreements* – DPA) para garantir sigilo sob a LGPD e armazenamento seguro de chaves de API em gerenciadores de segredos com rotação periódica.

4. **Monitoramento e Acompanhamento de SLA:** A equipe monitora a disponibilidade real dos provedores via telemetria contínua, páginas de status e relatórios mensais de consumo, garantindo que o tempo de resposta e a taxa de erros permaneçam dentro dos padrões acordados.

5. **Homologação e Aceite Técnico:** Antes de qualquer serviço entrar em produção com clientes reais, o fluxo é validado em ambiente de testes (*sandbox*) na esteira de integração contínua (CI/CD), com procedimento de reversão (*rollback*) documentado caso ocorram falhas.

2.2 Processo de Fornecimento: Comercialização, Entrega e Operação

Como fornecedora de software, a CineSoft Solutions atende cinemas independentes, cinemas de rua e pequenas redes de exibição que buscam modernizar sua bilheteria física e expandir suas vendas online de forma integrada e sem riscos de sobreposição de assentos.

Modelos de Negócio e Ativos Disponíveis

O principal produto fornecido é a plataforma **CineDoom** em modelo SaaS (*Software as a Service*), cobrada por assinatura mensal mais taxa por sala ativa. No entanto, sua arquitetura modular também permite licenciar componentes específicos para parceiros ou exibidores com sistemas legados:

Tabela 4 – Perspectiva de Fornecimento e Ativos Comercializáveis

Ativo potencial	Possíveis adquirentes	Modelo de fornecimento e preço estimado
Plataforma CineDoom (completa)	Cinemas independentes, cinemas de rua e pequenas redes de exibição.	SaaS B2B: R$ 790/mês de assinatura-base, acrescidos de R$ 120/mês por sala ativa e R$ 1.500 de implantação (faixa efetiva de R$ 910 a R$ 1.270/mês para complexos de uma a quatro salas).
Engine de Trava Atômica (API)	Plataformas de venda de ingressos, teatros e sistemas de reservas de eventos.	Licenciamento de API: R$ 0,08 por assento confirmado, com cobrança mínima de R$ 200/mês.
Módulo de Governança LGPD (SDK)	Empresas de desenvolvimento de software e plataformas de entretenimento.	Licenciamento de SDK: R$ 8.900/ano ou R$ 16.000 por licença perpétua, incluindo 10 horas de consultoria técnica.
Portal White-Label de Reservas	Exibidores que utilizam sistemas administrativos próprios e desejam oferecer reservas on-line.	SaaS White-Label: R$ 490/mês por exibidor, com domínio próprio, SSL e taxa de implantação de R$ 800.

Fonte: CineSoft Solutions (2026). Valores comerciais estimados para fins de planejamento

▶ Jornada do Cliente: Da Contratação ao Pós-Venda

A relação entre a CineSoft Solutions e o cinema contratante segue um ciclo transparente e estruturado em cinco etapas:

1. **Alinhamento e Diagnóstico Inicial:** A CineSoft compreende o perfil do cinema — quantidade de salas físicas, categorias de poltronas, volume médio de sessões semanais e necessidade de equipamentos físicos de guichê.
2. **Proposta e Escopo de Implantação:** Apresentação da proposta comercial contendo valores claros, cronograma de parametrização e requisitos mínimos de rede e navegadores para os computadores da bilheteria.
3. **Formalização Contratual:** Assinatura do Contrato de Licenciamento SaaS e do Termo de Tratamento de Dados (LGPD), definindo os níveis de serviço garantidos (SLA de 99,5%), a propriedade exclusiva dos dados pelo cinema e as regras de confidencialidade.
4. **Implantação e Treinamento:** Provisionamento do ambiente isolado do cinema (`tenant_id`), cadastro de salas e filmes, simulação de vendas com a equipe de atendentes e treinamento operacional dos gerentes de bilheteria.

5. **Entrada em Operação e Suporte Contínuo:** Liberação assistida do primeiro dia de operação em guichê (*go-live* assistido), assinatura do Termo de Aceite após comprovação prática de ausência de erros ou vendas duplicadas, e início do suporte técnico diário.

▶ Entregáveis da Implantação e Evolução Funcional

Cada cinema contratante recebe:

- **Tenant Exclusivo e Isolado:** Criação do identificador da organização (`tenant_id`) no banco de dados com isolamento lógico garantido em todas as consultas.
- **Configuração de Salas e Catálogo:** Montagem do mapa visual de poltronas de cada sala física (comun, VIP, acessibilidade) e treinamento prático para cadastro de sessões e preços.
- **Manual do Operador e Capacitação:** Guia rápido de utilização do ponto de venda no balcão e no portal web.
- **Evolução Contínua em Três Fases (Macroentregas):**
  - *Fase 1 (Atual):* Bilheteria presencial completa, controle de sessões, catálogo de filmes e portal web de reserva antecipada com pagamento no balcão.
  - *Fase 2 (Próxima):* Venda online direta com pagamento imediato via PIX dinâmico e cartão, com emissão de vouchers digitais no e-mail do cliente.
  - *Fase 3 (Futura):* Emissão integrada de notas fiscais (NFC-e na SEFAZ), controle de vendas de bomboniere/pipoca e relatórios consolidados de faturamento.

▶ Critérios de Aceite Formal

O cinema cliente formaliza a aceitação do sistema quando os seguintes requisitos são atendidos:

1. Aprovação de todos os testes da suíte automatizada do sistema (26 arquivos e 770 testes) e execução bem-sucedida dos testes práticos de balcão.
2. Inexistência de qualquer defeito impeditivo ou crítico em aberto.
3. Comprovação prática de que a trava atômica impede rigorosamente a venda simultânea da mesma poltrona entre a web e o guichê.
4. Assinatura do Termo de Aceite de Implantação (TAI) pelo responsável do cinema.

Níveis de Serviço (SLA) e Atendimento

Para manter a bilheteria funcionando sem interrupções nas horas de pico (finais de semana e estreias), a CineSoft estabelece tempos máximos de resposta e resolução:

Tabela 5 – **Acordo de Nível de Serviço (SLA) e Suporte Pós-Entrega**

Severidade / Modalidade	Descrição do Cenário	Tempo de 1ª Resposta	Meta de Resolução / Contorno
Crítica (P1 — Corretiva Urgente)	Indisponibilidade total da bilheteria ou falha na emissão de ingressos em horário de sessão.	Até **15 minutos**	Até **2 horas** (reversão documentada para a versão anterior)
Alta (P2 — Corretiva Prioritária)	Degradação no painel gerencial, falha no envio de voucher por e-mail ou lentidão acima do SLA.	Até **1 hora**	Até **8 horas**
Normal (P3 — Adaptativa / Preventiva)	Ajustes de compatibilidade de navegador, dúvidas operacionais ou otimização preventiva de índices.	Até **4 horas úteis**	Até **24 horas úteis**
Evolutiva (P4 — Perfectiva)	Solicitação de novos relatórios, filtros ou melhorias de usabilidade no Portal do Cliente.	Até **2 dias úteis**	Planejada na próxima *Sprint / Release*

Fonte: CineSoft Solutions (2026)

2.3 Fornecedores e Parceiros de Tecnologia

Para manter a plataforma CineDoom estável, rápida e segura com custos proporcionais à escala dos cinemas, a CineSoft selecionou parceiros especializados para cada camada do sistema:

Tabela 6 – **Identificação dos Fornecedores e Parceiros Relevantes**

Fornecedor	Categoria e serviço	Plano e custo comercial	Impacto e mitigação de riscos
Vercel Inc.	**PaaS & CDN Edge:** Next.js 14 e serverless	**US$ 20/mês** por dev (Vercel Pro; piloto Hobby grátis)	SLA 99,99% na borda. Mitigação: build determinístico e rollback instantâneo.
Supabase	**DBaaS PostgreSQL:** Persistência ACID e pooling	**US$ 25 a US$ 69/mês** (Plano Pro compute dedicado)	Crítico para locks `SELECT FOR UPDATE`. Mitigação: réplicas e migrações Prisma.
Resend	**E-mail transacional:** API de vouchers (DKIM/SPF)	**US$ 20/mês** (franquia de 50.000 e-mails/mês)	Impacta envio de voucher (`CA-11`). Mitigação: exibição imediata em tela.
Axiom Inc.	**Log drain:** Observabilidade e auditoria LGPD	**US$ 25/mês** (1 TB/mês; retenção de 365 dias)	Rastreabilidade legal (Marco Civil/LGPD). Mitigação: mascaramento de PII.
GitHub Inc.	**CI/CD & Git:** Repositórios e GitHub Actions	**US$ 4/usuário/mês** (Plano Team e branch rules)	Sustenta testes automatizados. Mitigação: bloqueio de merge sem testes.
Stripe / Pagar.me *(M2)*	**Gateway financeiro:** Checkout PIX e cartão	**0,99% PIX / 3,99% + R$ 0,39 Cartão** (sem mensalidade)	Certificação PCI-DSS. Mitigação: webhooks idempotentes e balcão físico.
Focus NFe *(M3)*	**Mensageria fiscal:** Emissão de NFC-e SEFAZ	**R$ 149/mês** (até 2.000 notas fiscais/mês)	Conformidade tributária. Mitigação: fila assíncrona com contingência offline.

Fonte: CineSoft Solutions (2026)

CineDoom

Manual de Processos de Software

CAPÍTULO 3

Processos Organizacionais Habilitadores

Capítulo 3 — Processos Organizacionais Habilitadores

Este capítulo apresenta a estrutura organizacional, as políticas de engenharia e os recursos que sustentam a operação da **CineSoft Solutions** no desenvolvimento contínuo da plataforma **CineDoom**. As práticas aqui descritas alinham-se aos processos organizacionais da norma ABNT NBR ISO/IEC/IEEE 12207:2021, demonstrando como a organização fornece governança, infraestrutura centralizada, equipe capacitada e controle de qualidade para que o projeto atinja seus objetivos com previsibilidade.

3.1 Modelo de Ciclo de Vida do Projeto

A CineSoft Solutions adota o modelo de ciclo de vida **Iterativo e Incremental**, com práticas ágeis de desenvolvimento. O trabalho é organizado em ciclos de duas semanas (*Sprints*), nos quais são planejadas, desenvolvidas e avaliadas partes funcionais do sistema. O acompanhamento das atividades ocorre por meio de um quadro Kanban, enquanto práticas de integração contínua (CI) e entrega contínua (CD) apoiam a integração, a verificação e a disponibilização das alterações.


▶ Fases de Engenharia e Evolução em Três Macroentregas

O desenvolvimento do CineDoom é conduzido por iterações sucessivas, nas quais as atividades de engenharia são realizadas conforme as necessidades de cada incremento. Essas atividades compreendem:

1. **Requisitos e planejamento:** refinamento das necessidades, priorização do backlog e definição dos critérios de aceitação.
2. **Arquitetura e design:** avaliação das soluções técnicas, definição de componentes e registro de decisões arquiteturais relevantes (ADRs), quando necessário.
3. **Implementação e revisão:** desenvolvimento das funcionalidades, integração do código e revisão por pares (*Code Review*).
4. **Verificação e testes:** execução de testes automatizados e verificações de qualidade para avaliar o comportamento das alterações.
5. **Publicação e acompanhamento:** disponibilização dos incrementos em ambiente apropriado e monitoramento de seu funcionamento.

As atividades não constituem fases sequenciais rígidas: podem ocorrer de maneira sobreposta e ser retomadas ao longo de uma mesma iteração, conforme a complexidade e as necessidades do desenvolvimento.

Figura 4 – **Ciclo Iterativo de Desenvolvimento e Roadmap de Evolução do Produto**



Fonte: CineSoft Solutions (2026)

A evolução do produto está organizada em três macroentregas, que agrupam funcionalidades relacionadas e representam marcos de evolução da solução:

- **Macroentrega 1 (v1.0 – MVP):** bilheteria presencial, mapa de assentos 2D, reservas pela web e funcionalidades de governança e proteção de dados.
- **Macroentrega 2 (v2.0 – Expansão Digital):** pagamento on-line por PIX e cartão, emissão de vouchers por e-mail e ampliação das funcionalidades de venda digital.
- **Macroentrega 3 (v3.0 – Operação Fiscal e Financeira):** integração para emissão de NFC-e, módulo de bomboniere e painel financeiro.

Cada macroentrega pode envolver diversas Sprints, e os incrementos produzidos ao longo desses ciclos contribuem progressivamente para sua conclusão.

▶ Fluxo de Trabalho no Git (Política Corporativa de Branches)

Para garantir estabilidade em produção e permitir desenvolvimento paralelo sem conflitos, a organização adota um fluxo de ramificação estruturado no Git:

- **`main`:** ramo estável que reflete o código atualmente implantado em produção (`https://cinedoom.vercel.app/`). Commits diretos são bloqueados; apenas Pull Requests testados e aprovados vindos de `staging` são integrados.
- **`staging`:** ambiente de pré-produção e homologação, que recebe as versões consolidadas de `develop` para validação com usuários e testes de ponta a ponta.
- **`develop`:** ramo principal de integração contínua do dia a dia, onde as novas funcionalidades são unificadas e testadas pela esteira automática.
- **`feat/*` e `fix/*`:** ramos temporários criados a partir de `develop` para uma história específica ou correção de não conformidade, excluídos após o merge do Pull Request.

Organização das Iterações e Práticas de Trabalho

Durante os ciclos de desenvolvimento, a equipe adota práticas de planejamento, acompanhamento, revisão e melhoria contínua:

1. **Planejamento da Sprint (*Sprint Planning*):** seleção e detalhamento dos itens priorizados do backlog, com definição dos objetivos do ciclo e dos critérios de aceitação.
2. **Alinhamento diário (*Daily Check-in*):** acompanhamento do progresso, predominantemente assíncrono pelos canais de comunicação da equipe, com reuniões síncronas quando necessário para discutir impedimentos.
3. **Revisão de código (*Code Review*):** análise das alterações por outro desenvolvedor antes da integração à base comum, utilizando Pull Requests.
4. **Revisão dos incrementos (*Sprint Review*):** demonstração e avaliação das funcionalidades desenvolvidas, com coleta de feedback e identificação de ajustes necessários.
5. **Retrospectiva (*Sprint Retrospective*):** avaliação das práticas de trabalho, identificação de dificuldades e definição de melhorias para os ciclos seguintes.

Essas práticas são complementadas pelo quadro Kanban, que permite visualizar o estado das atividades nas etapas de Backlog, Em progresso, Bloqueado, Em review e Feito.

Governança, Avaliação e Melhoria Contínua do Ciclo de Vida

A governança do modelo adotado é sustentada por quatro diretrizes:

- **Padronização do processo:** as práticas de desenvolvimento, revisão e validação são documentadas para orientar a execução das atividades e manter a consistência entre os ciclos.
- **Responsabilidades:** o Gerente de Projeto e QA Lead, Kayque Vicente Silva, e o Tech Lead, Gabriel Henrique Lourenço Dias, acompanham a aplicação do processo em suas respectivas atribuições, apoiando sua manutenção e evolução.
- **Avaliação periódica:** ao término de cada Sprint e na conclusão das macroentregas, a equipe avalia a eficácia do processo por meio de indicadores de fluxo, como Lead Time, tempo de revisão e identificação de gargalos no GitHub Projects.
- **Melhoria contínua:** as oportunidades identificadas nas retrospectivas são avaliadas e, quando aprovadas, incorporadas à *Definition of Done* (DoD) e às práticas de desenvolvimento.

Entre os critérios de qualidade estabelecidos para as entregas, destacam-se a execução de testes automatizados de concorrência nas operações críticas de bilheteria e a verificação estática de dependências circulares no código, por meio de ferramentas de análise configuradas no projeto.

Dessa forma, o modelo adotado estabelece uma dinâmica de evolução progressiva do CineDoom, combinando planejamento, desenvolvimento, verificação e avaliação contínua, com mecanismos de acompanhamento e melhoria dos processos da CineSoft Solutions.

3.2 Infraestrutura e Ferramentas Organizacionais

A infraestrutura da CineSoft Solutions provê os recursos computacionais, serviços em nuvem e ferramentas necessários para desenvolver, testar, implantar e manter o **CineDoom** ao longo de todo o seu ciclo de vida.

▶ Critérios de Seleção e Requisitos

A infraestrutura foi desenhada para viabilizar um SaaS multi-tenant sem a sobrecarga de gerenciar servidores físicos dedicados. A escolha dos recursos guiou-se por três requisitos centrais:

- **Operação 100% em Nuvem:** Adoção de serviços gerenciados com alta disponibilidade e cobrança por uso, mantendo o custo fixo próximo de zero na fase inicial de validação.
- **Consistência Transacional Estrita:** Banco relacional com suporte a travas de concorrência (`SELECT FOR UPDATE`), essencial para impedir reserva duplicada da mesma poltrona entre web e guichê.
- **Segregação de Ambientes:** Isolamento rigoroso entre desenvolvimento local, homologação (*Preview*) e produção, com segredos protegidos fora do código-fonte.


▶ A Organização no GitHub (`CINESOFT-SOLUTIONS`)

Como base institucional de governança e trabalho colaborativo, a empresa estruturou a organização **`CINESOFT-SOLUTIONS`** no GitHub (`https://github.com/CINESOFT-SOLUTIONS`), centralizando:

1. **Repositórios Segregados:** Separação formal entre a aplicação (`cinedoom-app`) e a documentação de engenharia e requisitos (`manual-processos-software`), tratada como código (*Docs-as-Code*).
2. **Governança de Acessos:** Controle centralizado de permissões nominais da equipe com autenticação em dois fatores (2FA).


3. **Gestão Visual com GitHub Projects v2:** Quadro Kanban corporativo para planejamento das Sprints e acompanhamento contínuo do fluxo de trabalho.

Figura 5 – Organização corporativa CINESOFT-SOLUTIONS no GitHub e repositórios oficiais

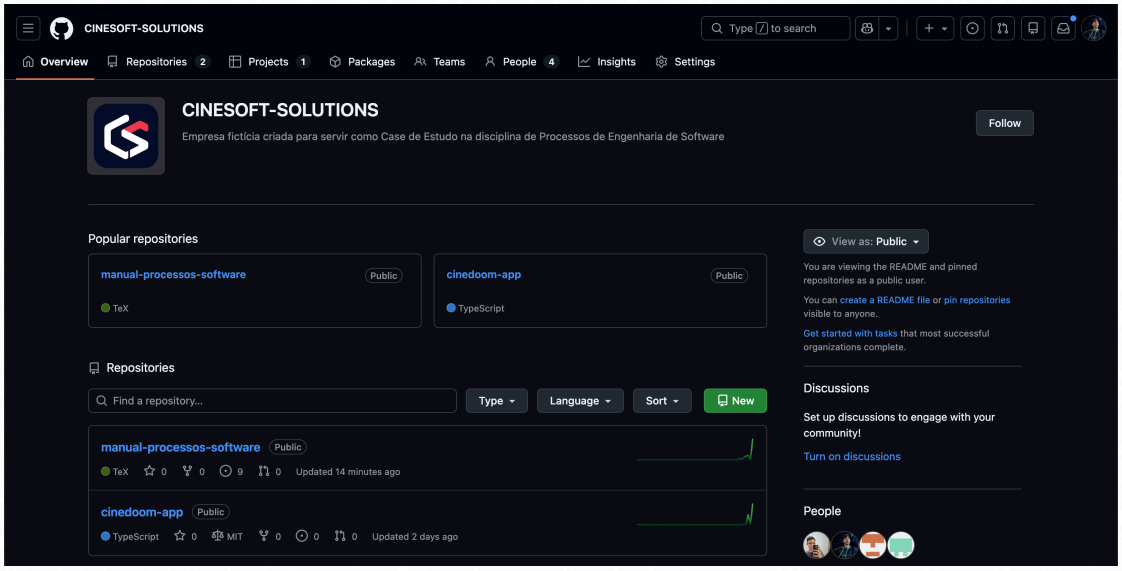

Fonte: CineSoft Solutions (2026)

Figura 6 – Quadro Kanban corporativo no GitHub Projects v2

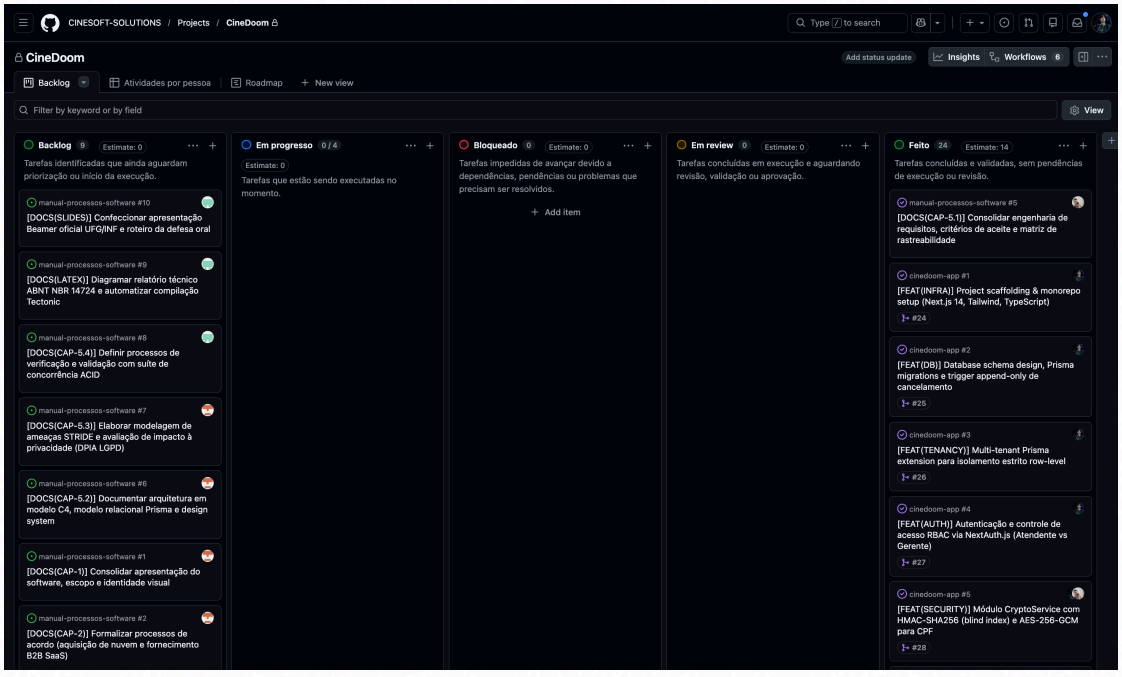

Fonte: CineSoft Solutions (2026)

Inventário de Ferramentas Disponibilizadas

A tabela a seguir consolida os recursos selecionados para sustentar o ciclo de vida da plataforma:

Tabela 7 – Inventário de infraestrutura e ferramentas organizacionais

Categoria	Recurso / Ferramenta	Papel e Justificativa no Projeto
Código e Governança	**Git e GitHub (`CINESOFT-SOLUTIONS`)**	Hospedagem dos repositórios, controle de versões e gestão centralizada de membros.
Gestão do Trabalho	**GitHub Projects v2**	Quadro Kanban para priorização do backlog, acompanhamento de Sprints e identificação de gargalos.
Integração e Entrega (CI/CD)	**GitHub Actions**	Pipelines automatizadas de compilação, validação de lint e execução de testes a cada Pull Request.
Hospedagem e Servidores	**Vercel**	Execução serverless do Next.js 14, distribuição em borda (CDN) e geração de ambientes de *Preview* e produção.
Banco de Dados Relacional	**PostgreSQL (Supabase) + Prisma ORM**	Persistência transacional ACID com bloqueio pessimista de assentos e migrações versionadas.
Qualidade e Testes	**Vitest + TypeScript 5**	Execução rápida de testes automatizados de unidade, concorrência e tipagem estática estrita.
Observabilidade e Auditoria	**Axiom Cloud (Log Drain)**	Ingestão e retenção de logs estruturados por 365 dias para auditoria e conformidade com a LGPD.
E-mail Transacional	**Resend API**	Disparo de vouchers e confirmações de reserva com autenticação SPF e DKIM.
Design de Interface	**Figma + Tailwind CSS + Lucide**	Prototipação de telas e padronização do Design System no tema escuro (*Dark Cinema UI*).

Fonte: CineSoft Solutions (2026)

Ambientes de Execução e Manutenção Contínua

O ciclo de vida do CineDoom opera em três ambientes segregados:

- **Desenvolvimento Local:** Onde os desenvolvedores escrevem código, executam migrações e rodam os testes automatizados.
- **Preview (Homologação):** Gerado automaticamente a cada Pull Request na Vercel para validação funcional e visual da equipe antes do merge.
- **Produção:** Instância estável (`https://cinedoom.vercel.app`) acessível pelos cinemas e clientes finais, atualizada exclusivamente após aprovação da esteira de CI/CD.

A sustentação dessa infraestrutura é mantida por três rotinas contínuas da liderança técnica:

1. **Segurança de Credenciais:** Tokens e chaves de API residem exclusivamente em cofres de variáveis protegidas (GitHub Secrets e painel da Vercel).
2. **Controle de Cotas e Consumo:** Monitoramento quinzenal do uso de banco, logs e e-mails para garantir previsibilidade de custos.
3. **Auditoria de Vulnerabilidades:** Execução frequente de `pnpm security:audit`, que bloqueia vulnerabilidades altas ou críticas fora do baseline documentado em `security/audit-baseline.json`.

3.3 Justificativa Estratégica e Viabilidade do Projeto

O investimento no desenvolvimento do CineDoom decorre de uma decisão estratégica da CineSoft Solutions para atender a um segmento de mercado historicamente desassistido por soluções tecnológicas acessíveis. Esta seção registra a justificativa do investimento, os critérios de autorização, a alocação de recursos e as regras de avaliação, continuidade e encerramento do projeto, conforme o Processo de Gerenciamento de Portfólio da ISO/IEC/IEEE 12207.

▸ Oportunidade e Alinhamento Estratégico

O mercado brasileiro de exibição cinematográfica conta com centenas de salas independentes, cinemas de rua, centros culturais e redes regionais que frequentemente operam com processos manuais (planilhas) ou dependem de sistemas legados de alto custo, que cobram taxas excessivas sobre cada ingresso emitido.

O CineDoom posiciona a CineSoft Solutions como fornecedora de um SaaS moderno, cobrado por mensalidade fixa previsível, democratizando a tecnologia de reserva online e gestão de bilheteria para exibidores de pequeno e médio porte.

Identificação e Autorização do Projeto

O CineDoom foi identificado como oportunidade prioritária por atender aos seguintes critérios:

- **Alinhamento estratégico:** atende ao objetivo de oferecer um SaaS acessível a exibidores de pequeno e médio porte.
- **Viabilidade:** apresenta viabilidade técnica, operacional e financeira, descrita a seguir.
- **Retorno esperado:** possui modelo de receita recorrente, com mensalidade fixa por cinema.

O início do projeto foi autorizado pela direção da CineSoft Solutions, que é responsável por decidir sobre sua continuidade, redirecionamento ou cancelamento. A gestão do projeto é atribuída ao gerente do projeto, que responde à direção pelo cumprimento de prazos, custos e requisitos.

Dimensões de Viabilidade

- **Viabilidade Técnica:** A arquitetura adotada combina Next.js 14, TypeScript e PostgreSQL sobre Prisma ORM. A escolha de um monólito modular com isolamento lógico multi-tenant no banco relacional eliminou a alta complexidade e os custos de infraestrutura de microsserviços distribuídos, garantindo transações atômicas nativas e fácil manutenção.
- **Viabilidade Operacional:** Por ser uma aplicação que opera integralmente no navegador web (tanto nos computadores da bilheteria quanto nos smartphones dos clientes), não há necessidade de instalar ou atualizar programas nas máquinas físicas dos cinemas, o que reduz custos operacionais de implantação e simplifica o suporte.
- **Viabilidade Financeira:**
  - *Fase Inicial (Macroentrega 1):* Operação com custos de nuvem reduzidos para homologação e projetos-piloto.
  - *Fase de Escala Comercial (Macroentregas 2 e 3):* A infraestrutura de produção em nuvem, somando planos corporativos de banco de dados, hospedagem, e-mail transacional e auditoria, totaliza cerca de **US$ 90/mês (aproximadamente R$ 480/mês, conforme câmbio de referência)**. Considerando o ticket previsto de R$ 910 a R$ 1.270/mês por complexo (assinatura-base de R$ 790 mais R$ 120 por sala ativa), estima-se que esse custo seja coberto já com a mensalidade do **primeiro cinema contratante**, o que indica sustentabilidade financeira e margem operacional positiva.

▶ **Alocação de Recursos**

Os recursos do projeto são distribuídos por macroentrega:

- **Pessoas:** equipe de desenvolvimento da CineSoft Solutions, com papéis definidos no Capítulo 2.
- **Infraestrutura:** serviços em nuvem descritos na Seção 3.2, com custos reduzidos na fase inicial e plano de produção nas fases seguintes.
- **Prazo:** as macroentregas 1, 2 e 3 estabelecem o cronograma de referência.

▶ **Avaliação, Sustentação e Encerramento**

O portfólio é avaliado ao término de cada macroentrega, verificando se o projeto continua justificando o investimento. Os critérios de avaliação são:

- aderência aos requisitos dos stakeholders e do projeto;
- cumprimento de prazo e custo previstos;
- evolução do custo de infraestrutura em relação à receita prevista;
- resultado do projeto-piloto, incluindo a contratação de cinemas.

Com base nessa avaliação, a direção decide por uma das ações abaixo:

- **Sustentar:** o projeto atende ao acordo e aos requisitos e segue para a próxima macroentrega.
- **Redirecionar:** o projeto não atende parcialmente aos requisitos, e o escopo, o prazo ou os recursos são ajustados.
- **Cancelar:** os riscos superam os benefícios, por exemplo, se o projeto-piloto não resultar em cinema contratante ou se o custo de infraestrutura superar a receita prevista.
- **Encerrar:** o projeto atende integralmente ao acordo e a todos os requisitos, e as lições aprendidas são registradas para reutilização em projetos futuros.

3.4 Papéis, Competências e Plano de Capacitação (RACI)

A equipe da CineSoft Solutions é organizada de maneira multidisciplinar, distribuindo competências técnicas complementares para cobrir as necessidades do ciclo de vida da plataforma. Esta seção descreve os papéis, as responsabilidades, as competências requeridas e o plano de desenvolvimento da equipe, conforme o processo de Gerenciamento de Recursos Humanos da ISO/IEC/IEEE 12207.

Composição da Equipe e Atribuição de Papéis

Os papéis foram atribuídos com base na formação e na experiência de cada integrante, validada pela direção da CineSoft Solutions no início do projeto.

Tabela 8 – Composição da Equipe e Especialidades Técnicas

Integrante	Função Principal	Foco Técnico e Especialidades	Substituto
Gabriel Henrique Lourenço Dias	**Tech Lead & Arquiteto de Software**	Arquitetura Next.js 14, modelagem de banco relacional, transações concorrentes ACID (`SELECT FOR UPDATE`), multi-tenancy e testes de concorrência.	Carlos Eduardo
Carlos Eduardo Freire da Silva	**Engenheiro de Backend, Segurança & DevOps**	Criptografia aplicada e conformidade LGPD, APIs com validação estrita (Zod), CI/CD no GitHub Actions e monitoramento.	Gabriel Lourenço
Kayque Vicente Silva	**Engenheiro de Qualidade (QA) & Gerente de Projeto**	Gestão de cronograma e escopo, automação de testes no Vitest, métricas de qualidade e critérios de aceitação.	Yury Nogueira
Yury Nogueira de Oliveira Silva	**Engenheiro de Requisitos, UX & Compliance**	Elicitação de regras de negócio, casos de uso, diagramas de arquitetura, usabilidade (UI/UX) e conformidade normativa.	Kayque Vicente

Fonte: CineSoft Solutions (2026)

A direção da CineSoft Solutions é responsável por autorizar o projeto e decidir sobre sua continuidade (Seção 3.3). O gerente do projeto responde à direção pelo cumprimento de prazos, custos e requisitos.

Matriz de Responsabilidades (RACI)

A matriz abaixo estabelece a governança sobre as principais atividades do projeto. Cada atividade possui um único aprovador final (**A**).

Tabela 9 – Matriz de Responsabilidades por Atividade (RACI)

Atividade do Ciclo de Vida	Gabriel Lourenço	Carlos Eduardo	Kayque Vicente	Yury Nogueira
Planejamento de Sprints, Cronograma e Riscos	C	C	**A / R**	C
Elicitação de Requisitos e Especificações Técnicas (SDD)	C	I	C	**A / R**

Atividade do Ciclo de Vida	Gabriel Lourenço	Carlos Eduardo	Kayque Vicente	Yury Nogueira
Arquitetura da Solução e Decisões Técnicas (ADRs)	**A / R**	C	I	C
Modelagem de Dados e Isolamento de Tenants	**A / R**	R	I	C
Criptografia de Dados Pessoais e Conformidade LGPD	C	**A / R**	C	R
Implementação do Motor de Reservas e Bilheteria	**A / R**	R	C	I
Automação de CI/CD e Infraestrutura de Nuvem	C	**A / R**	C	I
Criação e Execução de Testes Automatizados (Vitest)	R	C	**A / R**	C
Governança de Qualidade e Revisão de Processos	C	I	**A / R**	C
Documentação Técnica e de Processos	C	C	C	**A / R**
Gestão de Configuração (Git) e Revisão de Código	**A**	R	R	I
Suporte e Manutenção Pós-Implantação	C	**A / R**	R	I

Fonte: CineSoft Solutions (2026)

Legenda: **R** = Responsável pela execução (*Responsible*); **A** = Aprovador final (*Accountable*); **C** = Consultado (*Consulted*); **I** = Informado (*Informed*).

Competências Requeridas e Lacunas

Tabela 10 – Competências Requeridas, Lacunas e Ações

Competência requerida	Responsável	Nível atual	Lacuna	Ação
Transações concorrentes e prevenção de *deadlocks*	Gabriel, Carlos	Intermediário	Picos de acesso simultâneo	Workshop 1
Criptografia e privacidade (LGPD)	Carlos, Yury	Intermediário	Anonimização sem corromper históricos	Workshop 2
Testes de alta concorrência	Kayque, Gabriel	Básico	Cenários de estresse automatizados	Workshop 3
Pagamentos e documentos fiscais	Carlos, Gabriel	Básico	Webhooks, PIX, cartão e NFC-e	Workshop 4

Fonte: CineSoft Solutions (2026)

Plano de Capacitação Contínua

O desenvolvimento das competências ocorre por meio de workshops práticos internos, realizados antes da macroentrega em que a competência é necessária.

Tabela 11 – **Plano de Capacitação**

Workshop	Conteúdo	Responsável	Prazo	Critério de eficácia
1. Transações e Concorrência	Ordenação determinística de chaves contra *deadlocks* e travas pessimistas	Gabriel	Antes da Macroentrega 1	Reservas simultâneas sem duplicidade de assento
2. Privacidade e LGPD	Criptografia autenticada, índices de busca anônimos e anonimização irreversível	Carlos	Antes da Macroentrega 2	Dados pessoais anonimizados sem perda de histórico de vendas
3. Alta Concorrência com Vitest	Cenários de estresse com múltiplas requisições simultâneas ao motor de reservas	Kayque	Antes da Macroentrega 1	Suíte de concorrência executada com zero falhas
4. Pagamentos e Fiscais	Conciliação de webhooks (PIX e cartão) e contingência de NFC-e na SEFAZ	Carlos	Antes da Macroentrega 3	Fluxo de pagamento conciliado em ambiente de homologação

Fonte: CineSoft Solutions (2026)

Avaliação, Registros e Riscos da Equipe

- **Avaliação da eficácia:** ao final de cada workshop, o critério de eficácia é verificado pelo gerente do projeto. Se não for atingido, a ação é repetida ou ajustada.
- **Registros de competência:** as lacunas, os workshops realizados e os resultados ficam registrados no repositório do projeto e são atualizados a cada macroentrega.
- **Dependência de pessoas-chave:** para reduzir o risco de concentração de conhecimento, adotam-se revisão cruzada de código, registro das decisões em ADRs e a designação de um substituto para cada papel (Tabela 8).
- **Acúmulo de papéis:** o integrante que atua como QA e gerente de projeto acumula funções. Para evitar conflito entre testar e cobrar prazos, os resultados dos testes são revisados por outro integrante da equipe.

3.5 Plano de Qualidade: Diretrizes, Critérios e Métricas

A política de qualidade da CineSoft Solutions estabelece barreiras automatizadas (*Quality Gates*) e princípios de desenvolvimento para garantir que nenhuma alteração degrade a segurança ou a estabilidade da plataforma em produção. Esta seção descreve a política, os objetivos, as responsabilidades, os critérios de controle, as métricas e o ciclo de melhoria, conforme o processo de Gerenciamento da Qualidade da ISO/IEC/IEEE 12207.

▶ Política e Objetivos de Qualidade

A direção da CineSoft Solutions aprova a política de qualidade, que consiste em entregar o CineDoom com integridade das reservas, isolamento entre cinemas e proteção de dados pessoais, verificados de forma automatizada antes de cada implantação.

Os objetivos de qualidade são:

- **Integridade das reservas:** nenhuma duplicidade de assento sob acesso concorrente.
- **Isolamento entre cinemas:** nenhum acesso a dados de outro cinema (*cross-tenant*).
- **Estabilidade:** nenhuma alteração integrada com falha nos gates.
- **Rastreabilidade:** toda funcionalidade vinculada a uma especificação documentada.

▶ Responsabilidades

Conforme o RACI (Seção 3.4), o Engenheiro de Qualidade (Kayque Vicente) é o aprovador final da governança de qualidade e dos testes automatizados. A revisão de cada *Pull Request* é feita por integrante diferente do autor, garantindo independência. Os resultados dos testes do próprio Engenheiro de Qualidade são revisados por outro integrante da equipe.

▶ Diretrizes e Princípios de Engenharia Adotados

Quatro pilares técnicos orientam a escrita de código em todos os repositórios. Cada pilar possui uma forma de verificação:

Tabela 12 – Diretrizes e Princípios de Engenharia Adotados

Princípio	Descrição	Verificação
Spec-Driven Development (SDD)	Nenhuma funcionalidade é implementada sem especificação prévia em `specs/`, com schemas de entrada e saída validados por contratos formais (Zod).	O *Pull Request* deve referenciar a especificação correspondente; caso contrário, é recusado na revisão.
Domain-Driven Design (DDD)	Organização por contextos delimitados (*Bounded Contexts*), isolando a lógica de negócio (sessões, ingressos, bloqueios temporários) de infraestrutura e persistência.	Checklist de revisão e regra `eslint no-cycle` contra dependências circulares.
Princípios SOLID	Código modular com responsabilidade única, desacoplamento de serviços e injeção de dependências.	Checklist de revisão de código.
TDD e Pirâmide de Testes	Testes automatizados das regras críticas de domínio escritos antes ou junto da implementação.	Gate de testes e meta de cobertura (Tabela de métricas).

Fonte: CineSoft Solutions (2026)

▶ Critérios de Qualidade e Bloqueios Automatizados (*Quality Gates*)

Para que qualquer código seja integrado aos ramos principais (`develop`, `staging` e `main`), os critérios abaixo devem ser atendidos na esteira do GitHub Actions:

1. **Validação Estática e Compilação:** tipagem estrita sem erros (`tsc --noEmit`) e ausência de dependências circulares (`eslint no-cycle`).
2. **Suíte de Testes: 100% de aprovação nos testes do Vitest**, incluindo testes unitários de regras de negócio, testes de concorrência com 50 threads simultâneas e 500 cenários de isolamento *cross-tenant*.
3. **Cobertura:** mínimo de 70% de *statements*, funções e linhas e 80% de *branches* nas regras de domínio (`src/modules/**` e `src/shared/**`).
4. **Segurança:** auditoria de dependências de produção (`pnpm security:audit`) sem vulnerabilidades altas ou críticas fora do baseline documentado, além de varredura de segredos no código sem ocorrências.
5. **Revisão Humana de Código:** pelo menos uma aprovação de outro desenvolvedor, com base em checklist (aderência à especificação, SOLID, tratamento de erros, proteção de dados pessoais e isolamento de cinemas).

6. **Verificação de Build:** compilação bem-sucedida do pacote de produção antes da autorização de deploy.

Métricas e Indicadores de Qualidade

Tabela 13 – Métricas de Qualidade

Métrica	Meta	Fonte de coleta	Frequência
Cobertura de testes nas regras de domínio	≥ 70% (*statements*, funções e linhas) e ≥ 80% (*branches*)	Relatório do Vitest no CI	A cada *Pull Request*
Aprovação da suíte de testes	100%	GitHub Actions	A cada *Pull Request*
Falhas de build no CI	Tendência decrescente	GitHub Actions	A cada macroentrega
Defeitos escapados para produção	0 críticos	Registro de incidentes	A cada macroentrega
Tempo médio de correção de defeitos	Definido na primeira macroentrega e reavaliado depois	Quadro de tarefas (GitHub Projects)	A cada macroentrega
Aderência aos critérios de aceitação	100% das funcionalidades entregues	Revisão do Engenheiro de Qualidade	A cada macroentrega

Fonte: CineSoft Solutions (2026)

Avaliação do Processo e Tratamento de Não Conformidades

Ao final de cada macroentrega, o Engenheiro de Qualidade realiza uma avaliação de conformidade com este manual, verificando se os gates foram respeitados e se as métricas atingiram as metas. As não conformidades são tratadas assim:

1. **Registro:** descrição, origem e gravidade, no quadro de tarefas.
2. **Ação corretiva:** definição de responsável e prazo.
3. **Verificação:** confirmação da correção pelo Engenheiro de Qualidade.

Melhoria Contínua

Ao término de cada macroentrega, a equipe realiza uma retrospectiva para analisar as métricas, as não conformidades e as lições aprendidas. Com base nela, os gates, as metas e o checklist de revisão são atualizados, e as mudanças são registradas neste manual.

3.6 Estratégia de Gestão do Conhecimento

A organização assegura que todo o conhecimento técnico, arquitetural e processual do CineDoom seja documentado, versionado e facilmente acessível, reduzindo a dependência de pessoas isoladas e preservando o capital intelectual da empresa. Esta seção descreve os objetivos, os ativos, os mecanismos de registro e compartilhamento, a manutenção e a medição da eficácia, conforme o processo de Gerenciamento do Conhecimento da ISO/IEC/IEEE 12207.

Objetivos

- Reduzir a dependência de integrantes específicos (risco registrado na Seção 3.4).
- Acelerar a integração de novos desenvolvedores.
- Preservar o histórico das decisões e a rastreabilidade entre requisitos, código e testes.

Ativos de Conhecimento

Tabela 14 – Ativos de Conhecimento

Ativo	Conteúdo	Local	Responsável
Especificações (SDD)	Requisitos funcionais, regras de negócio e contratos Zod	`specs/`	Engenheiro de Requisitos
ADRs	Decisões de arquitetura, `ADR-001` a `ADR-012`	Repositório Git	Tech Lead
Modelos de dados e planos de teste	Esquemas, cenários e critérios de aceitação	Repositório Git	Tech Lead e Engenheiro de Qualidade
Manual de processos	Processos, papéis e planos	Repositório Git	Gerente do Projeto
Guias técnicos e lições aprendidas	Soluções de problemas recorrentes	Repositório Git (guias internos)	Todos os integrantes

Fonte: CineSoft Solutions (2026)

Mecanismos de Registro e Preservação

- **Abordagem *Docs-as-Code*:** especificações, modelos de dados, planos de teste e manuais de processo residem no repositório Git e são atualizados e revisados no mesmo fluxo de *Pull Requests* do código.
- **Registro Formal de Decisões de Arquitetura (ADRs):** decisões estruturais, como o banco relacional gerenciado, os bloqueios pessimistas em vez de filas e a estratégia de multi-tenancy, são documentadas com contexto, opções avaliadas e consequências.
- **Rastreabilidade nos Artefatos de Código:** serviços, controladores e testes referenciam requisitos funcionais (`RF-XX`), regras de negócio (`RN-XX`) e critérios de aceitação (`CA-XX`), consolidados na matriz de rastreabilidade da Seção 5.1.2.
- **Lições Aprendidas e Guias Técnicos:** a solução de cada problema relevante, como limites de conexão no banco ou ajustes de concorrência, é registrada em guia interno ao final da correção.

Compartilhamento do Conhecimento

- **Revisão cruzada de código:** todo *Pull Request* é revisado por outro integrante (Seção 3.5).
- **Workshops internos:** o plano de capacitação (Seção 3.4) dissemina as competências críticas.
- **Integração de novos integrantes:** a leitura do manual, dos ADRs e das especificações compõe o roteiro de entrada.
- **Substitutos por papel:** cada papel crítico possui um substituto designado (Tabela 8).

Manutenção e Controle

- **Atualização:** alterações de código que afetem um ativo exigem a atualização do documento no mesmo *Pull Request*.
- **Revisão periódica:** ao final de cada macroentrega, os ativos são revisados quanto à atualidade.
- **Obsolescência:** documentos substituídos são marcados como obsoletos, e os ADRs são mantidos com o status “substituído” para preservar o histórico.
- **Controle de acesso:** o acesso ao repositório segue o controle descrito na Seção 3.2, e credenciais não são registradas na documentação.

Medição da Eficácia

- Proporção de *Pull Requests* com referência a `RF-XX` ou `RN-XX`.
- Proporção de decisões estruturais registradas em ADR.
- Tempo para um novo integrante realizar sua primeira contribuição.
- Resultado da revisão dos ativos ao final de cada macroentrega, avaliado na retrospectiva (Seção 3.5).

CineDoom

Manual de Processos de Software

CAPÍTULO 4

Processos de Gerenciamento Técnico

Capítulo 4 — Processos de Gerenciamento Técnico


4.1 Plano de projeto: escopo, cronograma, recursos e entregas

O planejamento do projeto (ABNT NBR ISO/IEC/IEEE 12207:2021 – cláusula 6.3.1) define o escopo, as macroentregas, o cronograma, os recursos, as premissas e a rotina de acompanhamento do CineDoom. A baseline do plano é aprovada pela direção da CineSoft Solutions (Seção 3.3). Alterações de escopo, prazo ou recursos são propostas pelo Gerente de Projeto (Kayque Vicente), aprovadas pela direção e registradas na ata de revisão da Sprint.

Estrutura Analítica do Projeto (EAP)

A Figura 7 decompõe o produto em três níveis: Nível 1 (produto), Nível 2 (macroentregas e governança) e Nível 3 (pacotes de trabalho verificáveis).

Figura 7 – Estrutura Analítica do Projeto (EAP) do CineDoom

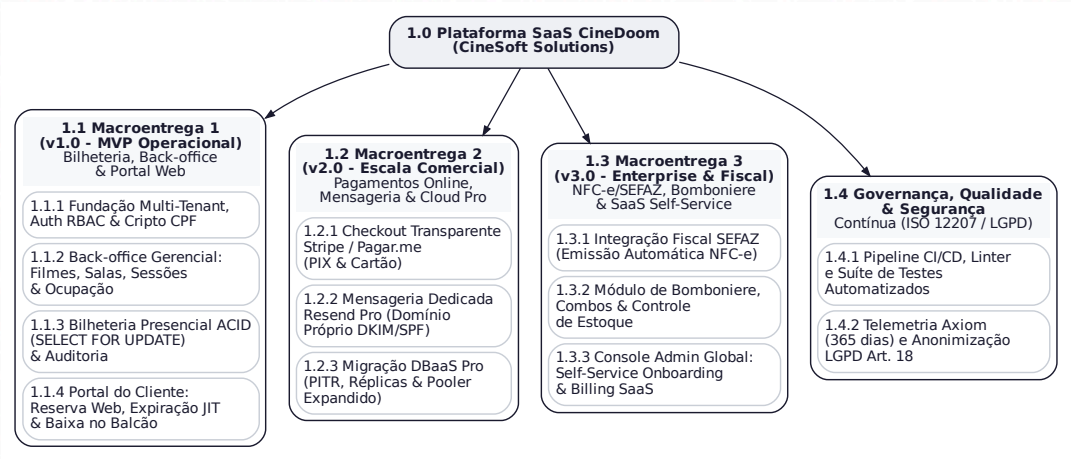

Fonte: CineSoft Solutions (2026)

Escopo e Marcos por Macroentrega

O ciclo de vida do CineDoom é dividido em três macroentregas, cada uma com critério de aceite verificável.

Tabela 15 – **Macroentregas, escopo e critérios de aceite**

Marco	Versão	Escopo	Critério de aceite	Responsável técnico	Janela	Status
Macroentrega 1 (MVP Operacional)	`v1.0.0`	Multi-tenant, RBAC, criptografia de CPF, CRUDs de filmes, salas e sessões, bilheteria atômica, portal de reservas com expiração JIT, painel de ocupação, anonimização LGPD e deploy (`RF-01` a `RF-18`).	`RF-01` a `RF-18` entregues e suíte de testes 100% aprovada.	Gabriel Lourenço	29/09/2026 a 09/11/2026	Concluído
Macroentrega 2 (Escala e Pagamentos)	`v2.0.0`	Gateway de pagamento (PIX e cartão), Resend Pro com domínio próprio, planos Pro de banco de dados e hospedagem.	Pagamento conciliado em homologação e e-mails com DKIM/SPF validados.	Carlos Eduardo	Dez/2026 a Jan/2027	Planejado
Macroentrega 3 (Enterprise e Fiscal)	`v3.0.0`	NFC-e via Focus NFe/SEFAZ, bomboniere e estoque, fidelidade e console global de tenants.	Emissão fiscal validada em homologação e *onboarding* de tenant sem intervenção manual.	Kayque Vicente e Yury Nogueira	Fev/2027 a Abr/2027	Backlog


Fonte: CineSoft Solutions (2026)

A M2 depende da conclusão da M1 e da definição do gateway de pagamento. A M3 depende da M2, pois a emissão fiscal exige o fluxo de pagamento consolidado. Essas dependências compõem o caminho crítico do projeto.

Cronograma

A Figura 8 apresenta o cronograma macro. A M1 foi executada em três Sprints de duas semanas.

Figura 8 – Cronograma macro das macroentregas

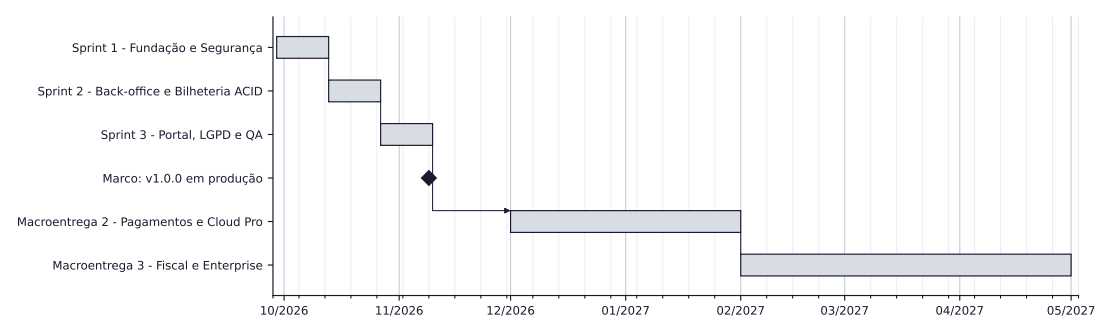

Fonte: CineSoft Solutions (2026)

Tabela 16 – **Execução das Sprints da Macroentrega 1**

Sprint	Pacotes de trabalho entregues	Responsáveis	Início	Término	Status
Sprint 1 – Fundação, arquitetura e segurança	Setup Next.js 14/TypeScript (#1), modelagem Prisma/PostgreSQL e trigger append-only (#2), multi-tenant (#3), autenticação e RBAC (#4), criptografia de CPF (#5), *log drain* (#16) e pipeline CI/CD (#17).	Gabriel Lourenço e Carlos Eduardo (apoio: Yury Nogueira)	29/09/2026	12/10/2026	Concluído
Sprint 2 – Back-office, salas e bilheteria ACID	Design System e mapa 2D (#9), CRUDs de filmes, salas e sessões (#6, #7, #8), *polling* de 2s (#10), venda atômica (#11) e atendentes (#14).	Gabriel Lourenço e Carlos Eduardo (QA: Kayque Vicente)	13/10/2026	26/10/2026	Concluído
Sprint 3 – Portal do cliente, LGPD e QA	Portal e reserva web com expiração JIT (#21), “Minhas Reservas” (#22), notificações e baixa no balcão (#23), cancelamento auditado (#12), painel de ocupação (#13), anonimização (#15), *seed* (#20) e suíte de testes com 500 cenários *cross-tenant* (#18, #19).	Toda a equipe	27/10/2026	09/11/2026	Concluído

Fonte: CineSoft Solutions (2026)

Recursos

A equipe é composta por quatro engenheiros (Seção 3.4). A infraestrutura é *serverless*, com planos gratuitos na M1 e planos pagos a partir da M2.

Tabela 17 – Recursos de infraestrutura e custo estimado

Recurso	Plano na M1	Plano na M2 e M3	Finalidade	Custo estimado
Vercel	Hobby (gratuito)	Pro	Hospedagem, CDN e ambientes de *Preview* e Produção	US$ 20/mês
Supabase DBaaS PostgreSQL	Gratuito	Pro (PITR e réplicas)	Persistência ACID, *pooler* e migrações Prisma	US$ 25/mês
Resend	Gratuito	Pro	Vouchers e confirmações com DKIM/SPF	US$ 20/mês
Axiom	Gratuito	Cloud (retenção de 365 dias)	*Log drain* e retenção legal	US$ 25/mês
Subtotal dos serviços base	–	–	Vercel, banco, Resend e Axiom	**US$ 90/mês**
GitHub	Gratuito	Team (4 assentos)	Repositórios, Projects e Actions	US$ 4/usuário
Focus NFe	Não utilizado	Somente M3	Emissão de NFC-e	R$ 149/mês
Gateway de pagamento	Não utilizado	Somente M2	PIX e cartão	3,99% + R$ 0,39 por transação

Fonte: CineSoft Solutions (2026)

Os itens GitHub, Focus NFe e gateway têm base de cobrança distinta (assento, emissão e transação) e por isso ficam fora do subtotal.

Premissas e Restrições

- **Premissas:** equipe de quatro engenheiros disponível durante todo o projeto; primeiro cinema contratante até a M2; câmbio de referência para a conversão de US$ 90/mês em cerca de R$ 480/mês.
- **Restrições:** os limites dos planos gratuitos na M1; a dependência de serviços de terceiros (gateway, SEFAZ); o prazo fixo das macroentregas.
- **Viabilidade:** com essas premissas, estima-se que o custo dos serviços base seja coberto pela mensalidade do primeiro cinema contratante, de R$ 910 a R$ 1.270/mês (Seção 3.3).

Rotina de Acompanhamento e Tratamento de Desvios


1. **Monitoramento diário:** todo cartão no GitHub Projects possui responsável nominal, data-limite, estimativa e critério de aceite. Tarefa parada em *In Progress* por mais de 48 horas sem atualização é sinalizada como impedimento.
2. **Revisão semanal:** o Gerente de Projeto e o Tech Lead comparam os pacotes concluídos com os planejados.
3. **Tratamento de desvios:** conforme a Tabela 18.

Tabela 18 – Protocolo de tratamento de desvios

Tipo de desvio	Critério	Ação	Registro
Leve	Atraso de até 24h em tarefa fora do caminho crítico	Pareamento técnico (*pair programming*) dentro da mesma Sprint	Quadro Kanban
Moderado ou crítico	Bloqueio no caminho crítico ou dependência externa	Repriorização MoSCoW, protegendo os requisitos *Must Have* de integridade transacional e LGPD, e adiamento do item secundário	Ata de revisão da Sprint, com ciência da direção

Fonte: CineSoft Solutions (2026)

Figura 9 – **Quadro Kanban do projeto no GitHub Projects**

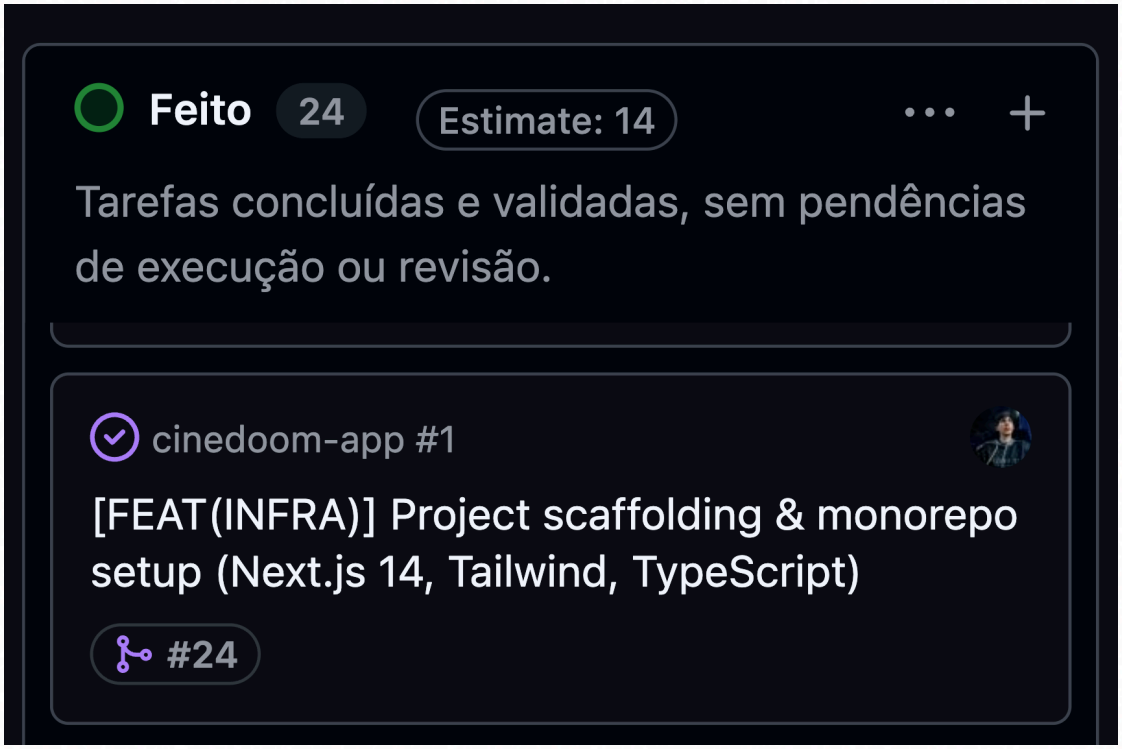

Fonte: CineSoft Solutions (2026)

4.2 Plano de gestão de riscos: identificação, probabilidade, impacto e respostas

A gestão de riscos (cláusula 6.3.4) identifica, analisa, trata e monitora as ameaças técnicas, operacionais, de segurança e de fornecedores que afetem a disponibilidade, a integridade financeira ou a conformidade legal do CineDoom. O Gerente de Projeto mantém o registro de riscos (*Risk Register*), que é revisado ao final de cada Sprint e antes de cada macroentrega. Riscos críticos são comunicados à direção.

Critérios de Classificação

Tabela 19 – **Escalas de probabilidade e impacto**

Nível	Probabilidade	Impacto
Alta / Alto	Tende a ocorrer em operação normal ou em picos de estreia	Indisponibilidade da bilheteria, venda dupla de assentos, perda financeira ou violação da LGPD
Média / Médio	Pode ocorrer sob condições específicas de carga ou falha de terceiros	Degradação parcial de funcionalidade secundária, com contorno disponível
Baixa / Baixo	Evento raro ou já contido por barreiras nativas	Inconveniência sem bloqueio operacional

Fonte: CineSoft Solutions (2026)

Tabela 20 – **Matriz de prioridade (probabilidade × impacto)**

Probabilidade \ Impacto	Baixo	Médio	Alto
Alta	Médio	Alto	**Crítico**
Média	Baixo	Médio	**Crítico**
Baixa	Baixo	Baixo	**Alto**

Fonte: CineSoft Solutions (2026)

Riscos **Críticos** exigem barreira arquitetural e teste automatizado obrigatório. Riscos **Altos** exigem mitigação ativa e monitoramento. Riscos **Médios** e **Baixos** são monitorados, com plano de contingência.

Registro de Riscos

Tabela 21 – **Identificação e análise dos riscos**

ID	Risco	Categoria	Prob.	Impacto	Prioridade
R-01	Venda dupla de assento (*double-booking*) por compras simultâneas no portal e no guichê em estreias	Técnico	Média	Alto	**Crítico**
R-02	Exaustão do pool de conexões ou indisponibilidade do banco por instâncias *serverless* em picos	Infraestrutura	Média	Alto	**Crítico**

ID	Risco	Categoria	Prob.	Impacto	Prioridade
R-03	Exposição de CPF ou vazamento de dados entre cinemas (*cross-tenant*)	Segurança e LGPD	Baixa	Alto	**Alto**
R-04	Retenção ociosa de poltronas (*no-show*) em reservas web	Negócio	Alta	Médio	**Alto**
R-05	Falha na entrega de e-mails de vouchers ou bloqueio por filtros anti-spam	Dependência externa	Média	Médio	**Médio**
R-06	Atraso por dependência entre módulos (UI responsiva e contratos de API)	Projeto	Média	Médio	**Médio**
R-07	Instabilidade da SEFAZ ou do gateway de pagamento no horário de pico (M2 e M3)	Dependência externa	Média	Alto	**Crítico**
R-08	Concentração de conhecimento em pessoas-chave (Seção 3.4)	Organizacional	Média	Médio	**Médio**
R-09	Estouro dos limites dos planos gratuitos ou pagos, elevando o custo acima do previsto	Financeiro	Média	Médio	**Médio**
R-10	Vulnerabilidade em dependências de terceiros	Segurança	Baixa	Alto	**Alto**
R-11	Lacuna de competência em pagamentos e NFC-e atrasar a M2 e a M3	Projeto	Média	Médio	**Médio**

Fonte: CineSoft Solutions (2026)

Tabela 22 – **Tratamento e monitoramento dos riscos**

ID	Resposta e mitigação	Gatilho de alerta	Responsável	Monitoramento
R-01	Pré-população de `SessionSeat`, ordenação de IDs contra *deadlock* e `SELECT ... FOR UPDATE` em transação ACID, validados por teste de concorrência com 50 threads (ADR-007)	Falha no teste de concorrência	Gabriel Lourenço	CI a cada PR
R-02	*Connection pooler* transacional (porta `6543`), índices por `tenant_id` e migração para plano Pro com réplicas e PITR na M2 (ADR-005)	Erros de conexão na telemetria	Carlos Eduardo	Telemetria e revisão por Sprint
R-03	CPF nunca em texto puro (`HMAC-SHA256` e `AES-256-GCM`), extensão Prisma com `tenant_id` automático e 500 cenários *cross-tenant* (ADR-008)	Falha em cenário *cross-tenant*	Carlos Eduardo e Yury Nogueira	CI a cada PR

ID	Resposta e mitigação	Gatilho de alerta	Responsável	Monitoramento
R-04	Bloqueio de reservas web a menos de 60 minutos da sessão e expiração *Just-in-Time* (ADR-012)	Taxa alta de reservas expiradas	Gabriel Lourenço	Painel de ocupação
R-05	Interface `EmailProvider` desacoplada, voucher exibido na confirmação e em “Minhas Reservas”, e Resend Pro com domínio próprio na M2	Falhas de entrega nos logs	Carlos Eduardo	Telemetria
R-06	Contratos `Zod`, CI bloqueante por PR e pareamento quando a tarefa excede 48h	Tarefa parada há mais de 48h	Kayque Vicente	Quadro Kanban
R-07	Fila assíncrona com contingência offline (Focus NFe) e recebimento presencial como alternativa ao gateway	Falhas de transmissão fiscal ou de pagamento	Gabriel Lourenço e Kayque Vicente	Telemetria (M2 e M3)
R-08	Revisão cruzada, ADRs e substituto por papel (Tabela 8)	Tarefa crítica dependente de uma só pessoa	Kayque Vicente	Revisão por macroentrega
R-09	Acompanhamento mensal do consumo e revisão de planos	Custo acima de 10% do teto	Carlos Eduardo	Painéis de cobrança
R-10	Auditoria de dependências e varredura de segredos no CI (Seção 3.5)	Vulnerabilidade alta/crítica fora do baseline documentado	Carlos Eduardo	CI a cada PR
R-11	Workshops 3 e 4 antes das macroentregas (Tabela 11)	Critério de eficácia do workshop não atingido	Kayque Vicente	Revisão do plano de capacitação

Fonte: CineSoft Solutions (2026)

O risco residual é avaliado a cada revisão. Um risco é encerrado quando a barreira correspondente passa a ser verificada automaticamente e o gatilho não ocorre ao longo de uma macroentrega.

4.3 Plano de gestão de configuração: controle de versões, branches e releases

A gestão de configuração (cláusula 6.3.5) assegura a integridade, o rastreamento e a reprodutibilidade dos ativos de software. O Tech Lead (Gabriel Lourenço) é o aprovador do controle de configuração, e o Engenheiro de DevOps (Carlos Eduardo) executa os processos de release (Seção 3.4).

Itens de Configuração

Tabela 23 – **Itens de configuração controlados**

Item	Localização	Controle
Código-fonte da aplicação e APIs	`src/`	Git, via Pull Request
Esquema, *seed* e *triggers* do banco	`prisma/schema.prisma`, `prisma/seed.ts` e `prisma/triggers.sql`	Git, via Pull Request
Testes automatizados	`tests/`	Git, via Pull Request
Pipelines e configuração de deploy	`.github/workflows/` e `vercel.json`	Git, via Pull Request
Especificações, ADRs e manual	`specs/` e `manual/`	Git, via Pull Request
Segredos e variáveis de ambiente	Variáveis dos serviços (Seção 3.2)	Fora do repositório; acesso restrito

Fonte: CineSoft Solutions (2026)

Estratégia de Branches

O fluxo usa três branches permanentes e branches efêmeras por funcionalidade (Figura 10).

Figura 10 – **Estratégia de branches**



Fonte: CineSoft Solutions (2026)

Tabela 24 – **Branches e regras de proteção**

Branch	Função	Regras
`main`	Produção (`https://cinedoom.vercel.app/`)	Proibido *force push*; somente código aprovado pelo CI; cada release recebe tag
`staging`	Homologação e aceite	Espelha a produção; promoção somente após validação
`develop`	Integração das entregas da Sprint	Recebe somente Pull Requests aprovados
`feat/*` e `fix/*`	Trabalho por requisito ou correção (ex.: `feat/RF-06-venda-atomica`)	Criadas a partir de `develop`; vinculadas a uma issue

Fonte: CineSoft Solutions (2026)

Todo Pull Request deve passar pelos *Quality Gates* da Seção 3.5 (compilação, testes, cobertura, segurança, revisão por outro integrante e build). Toda mudança em item de configuração entra por Pull Request vinculado a uma issue.

Baselines, Versionamento e Releases

Cada tag `vMAJOR.MINOR.PATCH` aplicada a `main` constitui uma **baseline** de release.


Tabela 25 – **Versionamento semântico e convenção de commits**

Elemento	Regra
`MAJOR` (`v1.0.0`, `v2.0.0`, `v3.0.0`)	Transição entre macroentregas ou mudança estrutural de arquitetura
`MINOR` (`v1.1.0`)	Funcionalidade retrocompatível dentro de uma macroentrega
`PATCH` (`v1.0.1`)	Correção de defeito ou ajuste sem quebra de contrato
Conventional Commits	`<tipo>(<escopo>): <descrição>`, com tipos `feat`, `fix`, `refactor`, `test`, `docs`, `chore` e `ci`, para gerar o *changelog* e rastrear as issues

Fonte: CineSoft Solutions (2026)

O fluxo de release, incluindo a reversão e a correção urgente, segue a Figura 11.

Figura 11 – Fluxo de release, reversão e correção urgente

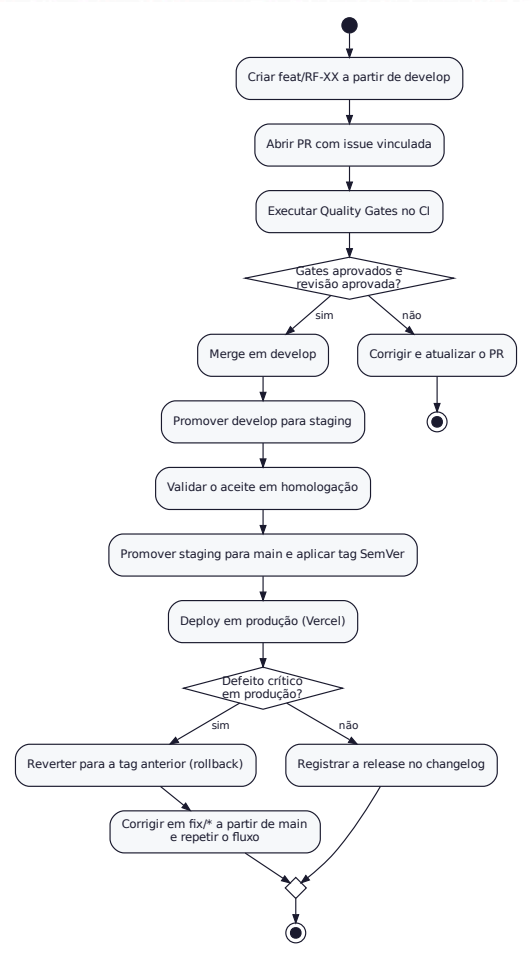


Fonte: CineSoft Solutions (2026)

Auditoria e Registro de Status


- **Auditoria:** antes de cada release, o Engenheiro de Qualidade verifica se a tag corresponde ao código aprovado e se os gates passaram.
- **Registro de status:** o *changelog*, as tags e o histórico de Pull Requests informam o estado de cada item de configuração.
- **Reversão:** a reversão consiste em publicar novamente a tag anterior no ambiente de produção.

Figura 12 – Execução do pipeline de integração contínua

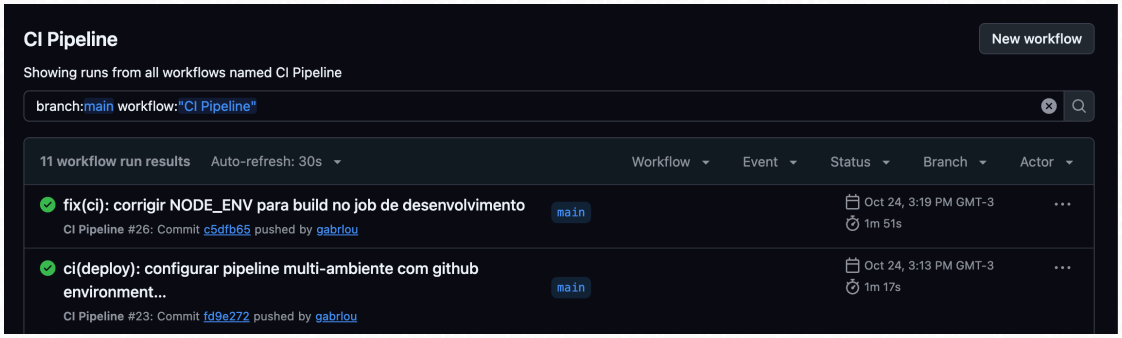

Fonte: CineSoft Solutions (2026)

Figura 13 – Baseline da versão `v1.0.0` no GitHub



Fonte: CineSoft Solutions (2026)


4.4 Registro de decisões técnicas relevantes (ADRs)

A gestão de decisões (cláusula 6.3.3) fundamenta as escolhas de alto impacto em análise multicritério e em fichas estruturadas de *Architecture Decision Records* (ADRs), mantidas em `specs/adrs/`.

▶ Processo de Decisão

- **Quando registrar:** toda decisão que afete a arquitetura, a segurança, o banco de dados, a infraestrutura ou o custo exige um ADR.
- **Quem decide:** o Tech Lead aprova, e o ADR é revisado em Pull Request por outro integrante.
- **Conteúdo mínimo:** contexto, alternativas consideradas, decisão, justificativa e consequências.
- **Ciclo de vida:** o ADR passa pelos estados da Figura 14. Uma decisão substituída é mantida no histórico, com referência ao ADR que a substituiu.

Figura 14 – Ciclo de vida de um ADR

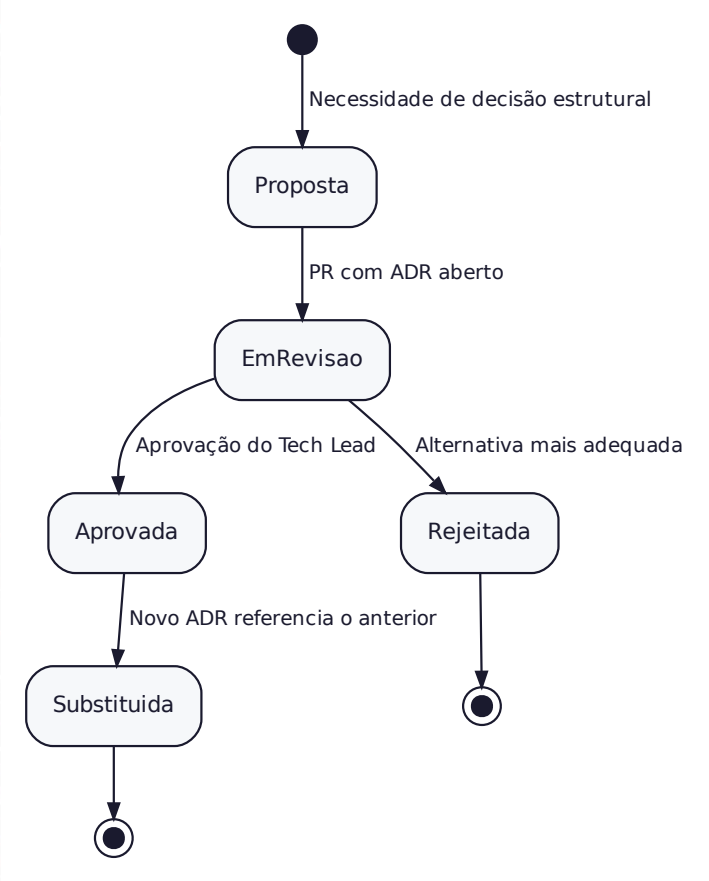

Fonte: CineSoft Solutions (2026)

Matriz de Decisão Ponderada: Arquitetura Base (ADR-001)

A arquitetura central foi escolhida entre três alternativas, avaliadas em cinco critérios ponderados (nota de 1 a 5, sendo 5 a melhor aderência).

Tabela 26 – **Matriz de decisão ponderada da arquitetura base**

Critério	Peso	A: Monólito modular (Next.js 14 e Prisma)	B: Microsserviços (Node/Go e Kafka)	C: SPA separada e backend em VM
Atomicidade transacional (anti-*double-booking*)	30%	5	2	5
Produtividade da equipe de 4 engenheiros	25%	5	1	3
Custo operacional (TCO inicial e escala)	20%	5	2	3
Isolamento multi-tenant e segurança LGPD	15%	5	3	4
Desempenho de borda e SEO do catálogo	10%	5	4	2
Pontuação ponderada	**100%**	**5,00 (adotada)**	**2,10**	**3,65**

Fonte: CineSoft Solutions (2026)

Tabela 27 – **Ficha do ADR-001**

Elemento	Descrição
Título e status	Arquitetura de monólito modular em Next.js 14 – Aprovada
Contexto	Integrar Portal do Cliente, Bilheteria e Back-office sob o mesmo motor transacional, com equipe enxuta
Alternativas	(1) Monólito modular Next.js; (2) Microsserviços; (3) SPA e API separadas
Decisão	Monólito modular com módulos de domínio verticais (`src/modules/*`) e regra ESLint `import/no-cycle`
Consequências	(+) Transações ACID simples e tipagem unificada; (-) exige disciplina do *linter* para manter as fronteiras entre módulos

Fonte: CineSoft Solutions (2026)

Índice de Decisões (ADR-001 a ADR-012)


As fichas completas dos 12 ADRs, com data e autor, estão em `specs/adrs/`. A tabela abaixo as relaciona aos riscos e requisitos que sustentam.

Tabela 28 – **Índice dos ADRs**

ADR	Título	Decisão resumida	Status	Relacionado a
001	Monólito modular em Next.js 14	Módulos verticais e `import/no-cycle`	Aprovada	R-06
002	Interface com Tailwind CSS	Tema escuro, sem CSS em tempo de execução	Aprovada	Usabilidade
003	Backend em TypeScript com Route Handlers	API REST tipada com validação `Zod`	Aprovada	R-06
004	PostgreSQL com Prisma ORM	Banco relacional ACID com transações interativas	Aprovada	R-01
005	Nuvem *serverless* (Vercel, DBaaS e CI)	Hospedagem na borda, *pooler* na porta `6543` e CI/CD no GitHub Actions	Aprovada	R-02
006	API REST e *polling* de 2s no mapa de sala	Atualização periódica sem conexões persistentes	Aprovada	`RF` de bilheteria
007	Pré-população de `SessionSeat` e `SELECT FOR UPDATE`	Lock pessimista ordenado por ID	Aprovada	R-01
008	Criptografia de CPF	`HMAC-SHA256` (busca) e `AES-256-GCM` (confidencialidade)	Aprovada	R-03
009	Anonimização *in-place* (LGPD Art. 18)	Sobrescrita irreversível, preservando `Ticket`	Aprovada	R-03
010	Auditoria *append-only* por *trigger*	`trg_protect_cancellation_audits` impede `UPDATE` e `DELETE`	Aprovada	Auditoria
011	*Log drain* gerenciado (Axiom, 365 dias)	Logs estruturados com PII mascarado	Aprovada	LGPD
012	Expiração *Just-in-Time* de reservas	Avaliação de `expiresAt` na leitura e na escrita	Aprovada	R-04

Fonte: CineSoft Solutions (2026)

Figura 15 – **Registro dos ADRs no repositório**

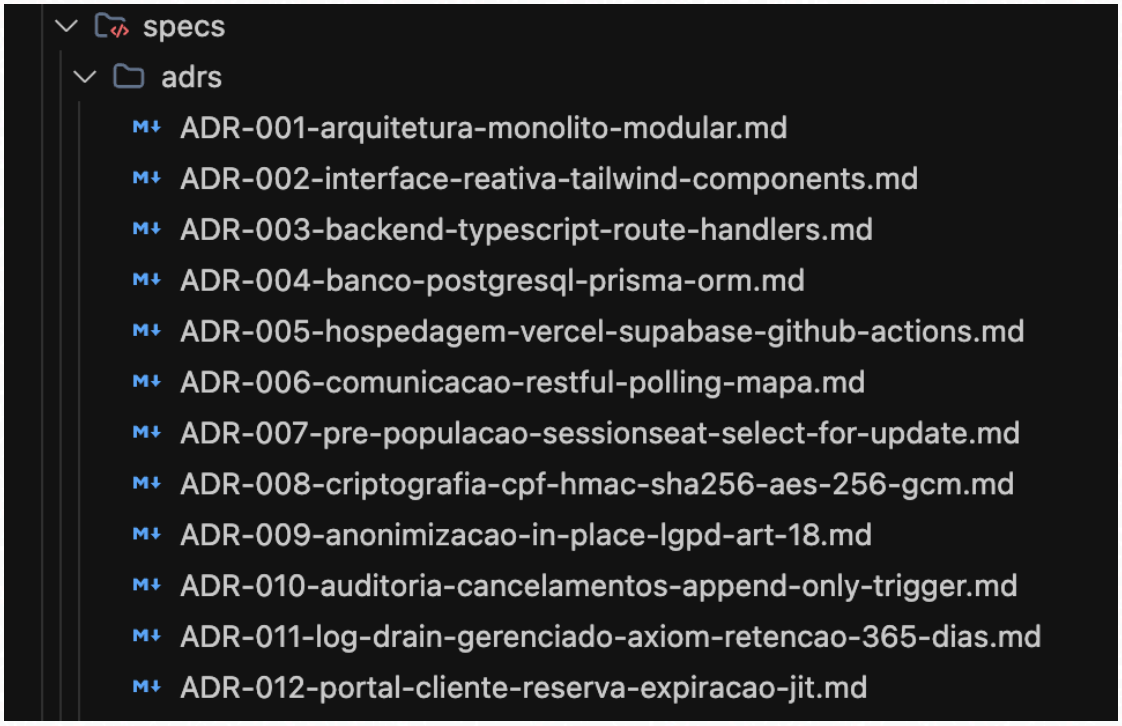


Fonte: CineSoft Solutions (2026)

4.5 Métricas de acompanhamento do projeto

O processo de medição (cláusula 6.3.7), junto com a avaliação e o controle do projeto (cláusula 6.3.2), usa indicadores coletados do GitHub, do CI, do Vitest e dos painéis de cobrança para responder a quatro necessidades de informação: o fluxo está saudável? A qualidade é mantida? O escopo avança conforme o plano? O custo está sob controle? A Figura 16 resume o ciclo de medição.

Figura 16 – **Ciclo de medição e decisão**

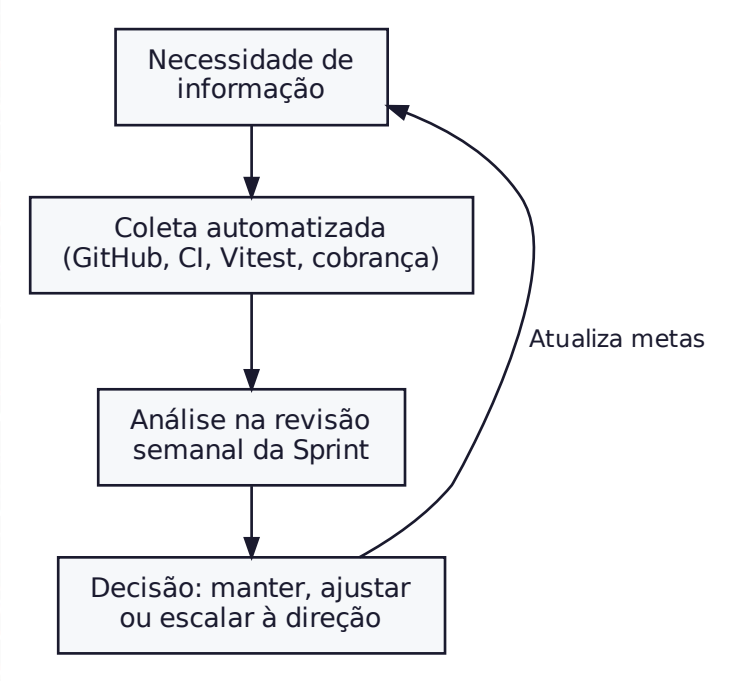

Fonte: CineSoft Solutions (2026)

Tabela 29 – **Plano de medição**

Indicador	Necessidade atendida	Meta	Fonte e frequência	Responsável
Lead time (da abertura da issue ao merge em `develop`)	Fluxo	≤ 48h por pacote	GitHub Projects, semanal	Kayque Vicente
WIP por engenheiro	Fluxo	≤ 2 tarefas	Quadro Kanban, diária	Kayque Vicente
Aprovação da suíte de testes	Qualidade	100%	GitHub Actions, a cada PR	Kayque Vicente
Cobertura nas regras de domínio	Qualidade	≥ 70% (*statements*, funções e linhas) e ≥ 80% (*branches*) (Seção 3.5)	Relatório do Vitest, a cada PR	Kayque Vicente
Defeitos críticos em produção	Qualidade	0	Telemetria e registro de incidentes, por macroentrega	Carlos Eduardo

Indicador	Necessidade atendida	Meta	Fonte e frequência	Responsável
Cumprimento do escopo	Progresso	100% dos requisitos do marco	Matriz de rastreabilidade (Seção 5.1.2), por Sprint	Kayque Vicente
Riscos críticos sem mitigação ativa	Risco	0	Registro de riscos (Tabela 22), por Sprint	Kayque Vicente
Custo mensal dos serviços base	Custo	≤ US$ 90/mês na M2 e na M3	Painéis de cobrança, mensal	Carlos Eduardo
Rollbacks por release	Configuração	Tendência decrescente	Tags e histórico de deploy, por release	Carlos Eduardo

Fonte: CineSoft Solutions (2026)

Tabela 30 – **Resultados na Macroentrega 1 (`v1.0.0`) e ação em caso de desvio**


Indicador	Resultado aferido	Ação em caso de desvio
Lead time	Média de 18 a 32 horas por issue	Acima de 48h, o Gerente de Projeto aciona pareamento técnico
WIP por engenheiro	Limite respeitado	Revisão do quadro na reunião diária
Suíte de testes	26 arquivos e 770 testes aprovados (100%)	O PR com teste falho não é integrado
Cobertura nas regras de domínio	71,2% de *statements*, 83,4% de *branches* e 76,3% de funções (gate: 70/80/70)	Abrir ação corretiva no registro de não conformidades (Seção 3.5)
Defeitos críticos em produção	0 (apenas ajustes cosméticos e de responsividade)	Defeito crítico aciona a reversão para a versão anterior e correção urgente (Figura 11)
Cumprimento do escopo	18 de 18 requisitos e 15 de 15 critérios de aceite	Ajuste de escopo conforme a Tabela 18
Riscos críticos sem mitigação	Medição iniciada a partir deste plano	Escalar à direção
Custo mensal	US$ 0 (planos gratuitos)	Desvio acima de 10% do teto aciona revisão de planos

Indicador	Resultado aferido	Ação em caso de desvio
Rollbacks por release	Medição iniciada a partir deste plano	Análise de causa na retrospectiva

Fonte: CineSoft Solutions (2026)

Os valores da Tabela 30 referem-se à entrega da `v1.0.0` e são atualizados a cada macroentrega.

Figura 17 – **Evidência do fluxo de trabalho**

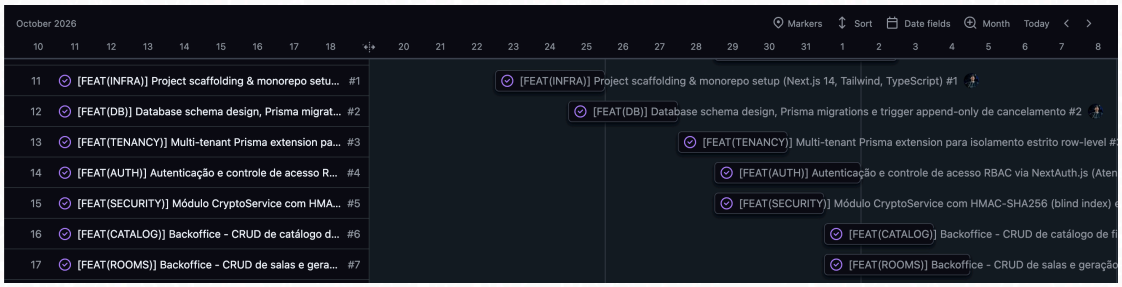

Fonte: CineSoft Solutions (2026)

CineDoom

Manual de Processos de Software

CAPÍTULO 5

Processos Técnicos

Capítulo 5 — Processos Técnicos

5.1 Requisitos

5.1.1 Documento de requisitos do sistema

A especificação formal de requisitos da plataforma **CineDoom** estrutura os requisitos funcionais (RF), não funcionais (RNF, segundo a norma ISO/IEC 25010) e restrições arquiteturais (RES), priorizados pelo método **MoSCoW**.

Catálogo Formal de Requisitos Funcionais (RF-01 a RF-18)

Tabela 31 – Catálogo Formal de Requisitos Funcionais (RF-01 a RF-18)

ID	Módulo	Requisito Funcional	Prioridade	Macroentrega
RF-01	Identidade & RBAC	Autenticar usuários via credenciais seguras (`bcrypt` cost 12) e sessão JWT contendo `userId`, `role` (`GERENTE`, `ATENDENTE`, `CLIENTE`) e `tenantId`.	*Must Have*	Macroentrega 1 (`v1.0`)
RF-02	Gestão de Operadores	Permitir ao `GERENTE` criar, listar, atualizar e inativar operadores com perfil `ATENDENTE` vinculados ao seu cinema (*tenant*), revogando sessões ativas.	*Must Have*	Macroentrega 1 (`v1.0`)
RF-03	Catálogo de Filmes	Permitir ao `GERENTE` manter o acervo de filmes (título, sinopse, gênero, duração em minutos, classificação indicativa e pôster).	*Must Have*	Macroentrega 1 (`v1.0`)
RF-04	Salas e Assentos	Permitir ao `GERENTE` cadastrar salas de exibição (Clássica, IMAX, VIP) e gerar automaticamente a matriz 2D de poltronas (fileiras A–Z e colunas numeradas).	*Must Have*	Macroentrega 1 (`v1.0`)
RF-05	Sessões	Permitir ao `GERENTE` agendar sessões (Filme + Sala + Data/Hora + Preço), validando choques de horário na mesma sala e pré-populando `SessionSeat`.	*Must Have*	Macroentrega 1 (`v1.0`)
RF-06	Bilheteria ACID	Disponibilizar mapa interativo da sessão com atualização por polling a cada 2 segundos.	*Must Have*	Macroentrega 1 (`v1.0`)

ID	Módulo	Requisito Funcional	Prioridade	Macroentrega
RF-07	Bilheteria ACID	Processar a venda presencial de múltiplos assentos em transação atômica ACID com bloqueio pessimista (`SELECT ... FOR UPDATE`), impedindo *double-booking*.	*Must Have*	Macroentrega 1 (`v1.0`)
RF-08	Bilheteria ACID	Emitir comprovante operacional de ingresso contendo código identificador único, filme, sala, horário, poltronas e valor pago.	*Must Have*	Macroentrega 1 (`v1.0`)
RF-09	Auditoria & Guichê	Realizar o cancelamento síncrono de ingresso vendido na bilheteria mediante justificativa obrigatória, gravando trilha *append-only* protegida por trigger SQL.	*Must Have*	Macroentrega 1 (`v1.0`)
RF-10	Governança LGPD	Proteger o CPF de compradores e clientes por indexação cega `HMAC-SHA256` e criptografia autenticada `AES-256-GCM`, permitindo anonimização *in-place* (Art. 18).	*Must Have*	Macroentrega 1 (`v1.0`)
RF-11	Ocupação & Logs	Apresentar painel gerencial com cálculo em tempo real da taxa de ocupação (vendidos, reservados e livres) por sessão/sala e exportar logs para o Axiom.	*Must Have*	Macroentrega 1 (`v1.0`)
RF-12	Portal do Cliente	Exibir catálogo público responsivo de filmes em cartaz com busca por título/sinopse, filtro por gênero e exibição da sinopse.	*Must Have*	Macroentrega 1 (`v1.0`)
RF-13	Portal do Cliente	Permitir ao espectador selecionar poltronas no mapa interativo e confirmar reserva online com status `PENDING` e bloqueio dos assentos como `RESERVED`, exclusivamente quando faltarem 60 minutos ou mais para o início da sessão.	*Must Have*	Macroentrega 1 (`v1.0`)
RF-14	Portal do Cliente	Permitir o cadastro e login de espectadores (`CLIENTE`) com validação matemática de CPF (Módulo 11) e termo explícito de consentimento LGPD.	*Must Have*	Macroentrega 1 (`v1.0`)
RF-15	Notificações	Emitir voucher digital com localizador único (`CD-XXXX`) e acionar o `NotificationService` (`ResendProvider` / `ConsoleLogger`), registrando `email_sent_at`.	*Must Have*	Macroentrega 1 (`v1.0`)

ID	Módulo	Requisito Funcional	Prioridade	Macroentrega
RF-16	Portal do Cliente	Disponibilizar área autenticada *"Minhas Reservas"* permitindo ao espectador consultar seus vouchers e realizar o cancelamento voluntário de reservas pendentes.	*Must Have*	Macroentrega 1 (`v1.0`)
RF-17	Bilheteria Híbrida	Permitir ao `ATENDENTE` localizar reservas web no balcão pelo código localizador (`CD-XXXX`) e confirmar o pagamento presencial, convertendo em `SOLD`.	*Must Have*	Macroentrega 1 (`v1.0`)
RF-18	Expiração JIT	Invalidar automaticamente reservas pendentes não pagas quando faltarem menos de 60 minutos para o início da sessão, liberando os assentos em tempo real.	*Must Have*	Macroentrega 1 (`v1.0`)

Fonte: CineSoft Solutions (2026)

Catálogo Formal de Requisitos Não Funcionais (RNF-01 a RNF-06 — ISO/IEC 25010)

Tabela 32 – Catálogo Formal de Requisitos Não Funcionais (RNF-01 a RNF-06 — ISO/IEC 25010)

ID	Característica ISO 25010	Especificação e Métrica Objetiva
RNF-01	**Eficiência de Desempenho**	Latência HTTP p95 < 800 ms e p99 < 1.500 ms nas transações de venda e reserva; sincronização visual do mapa de assentos por polling a cada 2 s.
RNF-02	**Confiabilidade e Atomicidade**	Zero ocorrências de venda ou reserva dupla (*double-booking*) sob carga concorrente de 50 threads simultâneas disputando a mesma poltrona.
RNF-03	**Segurança e Isolamento**	Isolamento multi-tenant absoluto validado por 500 cenários automatizados de intrusão *cross-tenant* e criptografia de CPF com `HMAC-SHA256` + `AES-256-GCM`.
RNF-04	**Usabilidade e Responsividade**	Interface adaptativa para smartphones (a partir de `320px`) e terminais desktop de bilheteria (`1024x768+`), aderente às diretrizes WCAG 2.1 Nível AA.
RNF-05	**Compatibilidade**	Operação integral via navegadores modernos (Chrome, Safari, Edge, Firefox) sem exigência de plugins locais ou aplicativos nativos.
RNF-06	**Manutenibilidade**	Arquitetura limpa orientada a módulos com tipagem estática estrita (`tsc --noEmit`) e zero dependências circulares (`ESLint import/no-cycle`).

Fonte: CineSoft Solutions (2026)

Restrições Técnicas e Limites de Escopo (RES-01 a RES-06)

Restrições arquiteturais e itens explicitamente fora do escopo da **Macroentrega 1 (MVP)**. As entregas previstas para as Macroentregas 2 e 3 (gateway de pagamento online, emissão fiscal NFC-e/SAT e bomboniere) são evoluções planejadas no roadmap e **não contradizem** estas restrições, que delimitam exclusivamente o MVP:

- **RES-01 — Pagamento Presencial Exclusivo no MVP (Sem Gateway Online):** No escopo da Macroentrega 1, o sistema não processa pagamentos eletrônicos online (cartão de crédito/débito ou checkout PIX web no portal); a liquidação financeira das reservas ocorre exclusivamente no balcão físico da bilheteria até 60 minutos antes da sessão. O gateway online (PIX/Stripe) está planejado para a Macroentrega 2.

- **RES-02 — Sem Integração de Hardware Fiscal no MVP (NFC-e / SAT):** No escopo da Macroentrega 1, o sistema emite comprovantes operacionais e *vouchers* de reserva/ingresso, não integrando módulos de comunicação direta com SEFAZ para emissão de nota fiscal eletrônica ao consumidor. A emissão fiscal automatizada está planejada para a Macroentrega 3.
- **RES-03 — Aplicação Web Responsiva (Sem App Nativo Mobile):** O acesso de espectadores, atendentes e gerentes ocorre integralmente via navegadores web (desktop e mobile responsivo), sem distribuição de aplicativos nativos nas lojas Google Play ou Apple App Store.
- **RES-04 — Exclusão de Bomboniere e Estoque de Alimentos no MVP:** No escopo da Macroentrega 1, o escopo restringe-se à gestão de catálogo cinematográfico, salas, sessões, reservas e bilheteria de ingressos, não abrangendo controle de estoque de pipoca, bebidas ou combos. O módulo de bomboniere está planejado para a Macroentrega 3.
- **RES-05 — Sem Distribuição de Mídia Digital ou DRM:** O sistema gerencia metadados e cartazes dos filmes, não realizando *streaming* de vídeo nem gerenciamento de chaves digitais de projetores (KDM/DCP).
- **RES-06 — Idioma e Localização Única (pt-BR):** A plataforma é projetada e localizada exclusivamente em português brasileiro, operando segundo o fuso horário e a legislação nacional (LGPD e CDC).

Regras de Negócio Estruturantes (RN-01 a RN-12)


As políticas de domínio que atravessam os requisitos estão consolidadas nas regras de negócio: exclusividade atômica do assento e máquina de estados (RN-01, RN-02); antecedência mínima de 60 minutos e expiração *Just-in-Time* (RN-03, RN-04); integridade do catálogo e anti-choque de sessões (RN-05, RN-06); auditoria imutável de cancelamento (RN-07); RBAC e segurança de credenciais (RN-08, RN-09); criptografia, consentimento e anonimização LGPD com retenção fiscal (RN-10, RN-11); e isolamento multi-tenant (RN-12).

5.1.2 Rastreabilidade de requisitos

A integridade da engenharia de software da CineSoft Solutions é garantida por uma matriz de rastreabilidade **bidirecional**: cada linha parte da necessidade do stakeholder (STK/NEC), passa pelo requisito (RF/RNF/RES) e pelo critério de aceite (CA), chega ao código-fonte e retorna pelo caso de teste, que declara explicitamente qual requisito e critério verifica.

Para tornar essa cadeia verificável, o diagrama a seguir percorre um **exemplo completo e real**, da macroentrega planejada até o teste de código que a comprova:

Figura 18 – Cadeia de Rastreabilidade: da Macroentrega 1 ao Teste de Código (exemplo real: Issues #9 e #10)

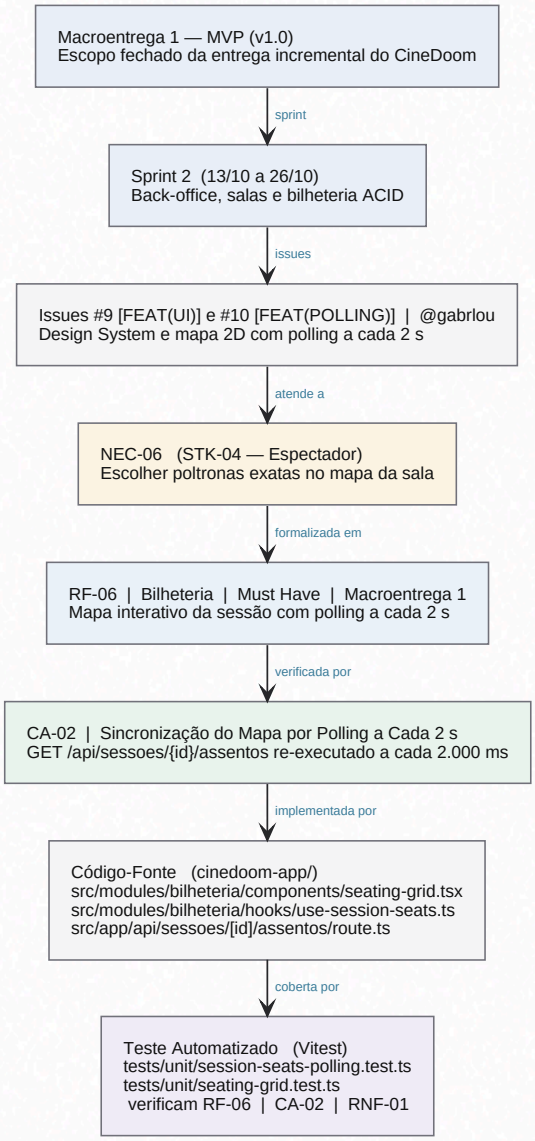

Fonte: CineSoft Solutions (2026)

O quadro a seguir resume, de forma compacta, as dez linhas da matriz completa; a coluna de código-fonte, suprimida aqui para preservar a legibilidade, é mantida no artefato `assets/capitulo-05/tabelas/matriz-rastreabilidade.tex`:

Tabela 33 – Matriz de Rastreabilidade — Visão Compacta

Necessidade / Stakeholder	Requisito(s)	Aceite	Caso de Teste (`tests/`)
STK-02 / NEC-02 (Controle de Acesso e Equipe)	RF-01, RF-02	CA-05	auth-rbac.test.ts (→ RF-01, CA-05); users-management.test.ts (→ RF-02, CA-05)
STK-02 / NEC-02 (Gestão de Acervo e Salas)	RF-03 a RF-05, RES-05	CA-08	catalog-filmes.test.ts (→ RF-03); rooms-layout.test.ts (→ RF-04); sessions-prepopulation.test.ts (→ RF-05)
STK-03, STK-04 / NEC-03, NEC-06 (Mapa Reativo e Guichê)	RF-06, RNF-01, RNF-04	CA-02	seating-grid.test.ts (→ RF-06, RNF-04, CA-02); session-seats-polling.test.ts (→ RF-06, RNF-01, CA-02)
STK-01, STK-03 / NEC-01, NEC-03 (Venda Atômica ACID)	RF-07, RF-08, RNF-02, RES-01, RES-02, RES-04	CA-01, CA-15	venda-atomica.test.ts (→ RF-07, CA-01); concurrency-acid-50-threads.test.ts (→ RF-07, CA-01); cancelamento-auditavel.test.ts (→ RF-08, CA-15)
STK-03, STK-05 / NEC-04, NEC-08 (Cancelamento Imutável)	RF-09	CA-03	cancelamento-auditavel.test.ts (→ RF-09, CA-03); database-schema.test.ts (→ RF-09, CA-03)
STK-05 / NEC-04 (Privacidade e LGPD Art. 18)	RF-10, RNF-03	CA-06	cryptoservice.test.ts (→ RF-10, RNF-03, CA-06); compliance-anonymization.test.ts (→ RF-10, CA-06)
STK-01 / NEC-01 (Isolamento Multi-Tenant SaaS)	RNF-03, RNF-06	CA-04	tenancy-isolation.test.ts (→ RNF-03, CA-04); security-cross-tenant-suite.test.ts (→ RNF-03, CA-04); modules.test.ts, ci-workflow.test.ts (→ RNF-06)
STK-02, STK-05 / NEC-02, NEC-04 (Painel de Ocupação e Logs)	RF-11	CA-07	observability-logger.test.ts (→ RF-11, CA-07); security-cross-tenant-suite.test.ts (→ RF-11, CA-07)
STK-04 / NEC-05, NEC-06 (Portal e Reserva Web)	RF-12 a RF-14, RNF-04, RNF-05, RES-01, RES-03, RES-06	CA-09, CA-10, CA-15	reserva-atomica.test.ts (→ RF-13, CA-09); cryptoservice.test.ts (→ RF-14, CA-10); auth-rbac.test.ts (→ RF-14, CA-10); seating-grid.test.ts (→ RNF-04)
STK-04, STK-03 / NEC-07, NEC-08 (Voucher, Cancelamento Web e JIT)	RF-15 a RF-18, RES-01, RES-02	CA-11 a CA-14	reserva-atomica.test.ts (→ RF-15, RF-16, RF-18, CA-11, CA-14); **sem automação:** RF-15 (e-mail/email_sent_at), RF-16/CA-12 (cancelamento web), RF-17/CA-13 (baixa presencial)

Fonte: CineSoft Solutions (2026)

RNF-05 e RES-01 a RES-06 não têm linha própria porque não pertencem a uma única tela ou módulo: são regras e qualidades que valem para várias partes do sistema ao mesmo tempo.

Evidência das restrições no repositório: RES-01/RES-02 — não existem rotas de gateway de pagamento nem modelos fiscais em `src/app/api/` e `prisma/schema.prisma`; RES-03 — a aplicação é web (`src/app/`), sem projeto mobile nativo; RES-04 — não há módulo de bomboniere/estoque; RES-05 — não há *streaming* ou DRM; RES-06 — `src/app/layout.tsx` declara `lang="pt-BR"`.

5.1.3 Critérios de aceitação (CA-01 a CA-15)

Os 15 critérios de aceitação foram definidos em formato comportamental BDD (*Dado que* / *Quando* / *Então*):

1. **CA-01 (Venda Presencial Atômica Anti-Double-Booking):** *Dado que* dois operadores ou clientes tentam adquirir a mesma poltrona `AVAILABLE` simultaneamente, *quando* as transações concorrentes são submetidas, *então* o banco deve serializar o acesso via `SELECT FOR UPDATE`, aprovar apenas a primeira (`HTTP 201`) e rejeitar a segunda com `HTTP 409 Conflict`.
2. **CA-02 (Sincronização do Mapa por Polling a Cada 2 s):** *Dado que* o mapa de assentos de uma sessão está aberto, *quando* o status de um assento muda para `RESERVED`, `SOLD` ou `AVAILABLE`, *então* o sistema deve consultar `GET /api/sessoes/{id}/assentos` a cada 2.000 ms e a resposta da consulta seguinte deve refletir o novo status em até 2 segundos.
3. **CA-03 (Auditoria Imutável de Cancelamento):** *Dado que* um ingresso vendido é cancelado na bilheteria, *quando* a operação é executada, *então* um registro imutável deve ser gravado em `cancellation_audits` (protegido por trigger PostgreSQL contra `UPDATE/DELETE`) antes de liberar o assento.
4. **CA-04 (Isolamento Estrito Multi-Tenant):** *Dado que* um operador do *Tenant A* está autenticado, *quando* tenta ler ou modificar filmes, salas, sessões ou reservas do *Tenant B*, *então* a extensão de tenancy deve bloquear o acesso em 100% dos 500 cenários de teste.
5. **CA-05 (Controle de Acesso RBAC e Gestão de Operadores):** *Dado que* um usuário autenticado possui perfil `ATENDENTE` ou `CLIENTE`, *quando* tenta acessar rotas administrativas (`/admin/*` ou `/api/admin/*`), *então* o sistema deve responder `HTTP 403 Forbidden`; *dado que* o `GERENTE` gerencia operadores do próprio cinema, *quando* cria, lista, atualiza ou inativa um atendente, *então* a operação deve ser persistida e a inativação deve revogar o acesso do operador, retornando `HTTP 403` nas APIs e redirecionando ao login nas páginas.
6. **CA-06 (Criptografia de CPF e Anonimização LGPD):** *Dado que* um CPF é fornecido na compra ou cadastro, *quando* o registro é persistido, *então* o CPF não deve ser armazenado em texto puro, sendo gravado como `HMAC-SHA256` (`cpf_hash`) e `AES-256-GCM` (`cpf_encrypted`); *quando* a anonimização é solicitada pelo titular, *então* nome, e-mail e CPF cifrado devem ser sobrescritos *in-place*, `anonymized_at` preenchido, os vínculos com os ingressos preservados e uma segunda solicitação rejeitada.
7. **CA-07 (Painel de Ocupação e Trilha de Logs Estruturados):** *Dado que* uma sessão possui assentos vendidos, reservados, bloqueados e livres e que operações críticas são

executadas, *quando* o GERENTE consulta o painel de ocupação, *então* o sistema deve exibir as contagens por status e o percentual de ocupação calculado como `(vendidos ÷ capacidade) × 100`, arredondado a uma casa decimal; e, para cada operação crítica efetivamente executada (venda, cancelamento, conflito ACID, violação de segurança, autenticação e anonimização), emitir log estruturado em JSON contendo `tenant_id`, `user_id`, timestamp UTC e identificador do recurso, com retenção de 365 dias no Axiom.

8. **CA-08 (Gestão Validada de Catálogo, Salas e Sessões):** *Dado que* o GERENTE gerencia a programação, *quando* cria, edita ou lista filmes, salas com layout de assentos e sessões cinematográficas, *então* o sistema deve rejeitar com `HTTP 422` qualquer campo obrigatório ausente, rejeitar com `HTTP 409` sessões com sobreposição de horário na mesma sala e pré-popular os assentos da sessão (`SessionSeat`) com status inicial `AVAILABLE`.

9. **CA-09 (Reserva Online com Antecedência de 60 min):** *Dado que* faltam 60 minutos ou mais para o início da sessão, *quando* o espectador seleciona assentos livres no portal, *então* o sistema deve criar a reserva com status `PENDING` e bloquear os assentos como `RESERVED`.

10. **CA-10 (Cadastro e Login de Espectador com LGPD):** *Dado que* um espectador preenche nome, e-mail, senha, CPF válido (Módulo 11) e aceita o termo de consentimento LGPD, *quando* conclui o cadastro e efetua login, *então* o sistema deve persistir o CPF como `HMAC-SHA256` + `AES-256-GCM`, gravar `lgpd_consent_at` e autenticar a sessão com perfil `CLIENTE`.

11. **CA-11 (Voucher Digital com Localizador Único):** *Dado que* uma reserva web é concluída, *então* o sistema deve gerar o voucher digital com código localizador `CD-XXXX` e disponibilizá-lo em `GET /api/portal/reservas/{id}` e na página `/portal/reservas/{id}/comprovante`, contendo filme, sala, data e horário da sessão, assentos e valor total, com instruções para pagamento presencial.

12. **CA-12 (Cancelamento Voluntário pelo Espectador):** *Dado que* o cliente possui uma reserva com status `PENDING` e `reservation_expires_at` futuro, *quando* solicita o cancelamento em *"Minhas Reservas"*, *então* o status deve mudar para `CANCELLED` e os assentos devem voltar imediatamente para `AVAILABLE`; reservas não pendentes ou expiradas devem ser rejeitadas com `HTTP 400`.

13. **CA-13 (Baixa Presencial de Reserva no Balcão):** *Dado que* o cliente apresenta o código localizador `CD-XXXX` na bilheteria, *quando* o atendente consulta a reserva e confirma o pagamento enquanto `reservation_expires_at` for futuro, *então* a reserva deve mudar para `CONFIRMED` e os assentos para `SOLD`; reservas não pendentes ou expiradas devem ser rejeitadas com `HTTP 400`.

14. **CA-14 (Expiração Just-in-Time a 60 min da Sessão):** *Dado que* uma reserva `PENDING` possui `reservation_expires_at` igual ou anterior ao instante atual, *quando* o atendente tenta confirmar o pagamento ou o mapa de assentos é consultado, *então* a baixa presencial deve ser rejeitada com `HTTP 400` e o assento deve ser retornado como `AVAILABLE`, podendo ser reservado ou vendido para outro cliente.

15. **CA-15 (Catálogo Público e Comprovante de Ingresso):** *Dado que* existem filmes em cartaz com sessões futuras e ingressos vendidos, *quando* o espectador acessa o catálogo público ou o operador consulta um ingresso pelo identificador único, *então* (a) o catálogo deve listar os filmes em cartaz, permitir busca por título ou sinopse e filtro por gênero, exibindo a sinopse do filme; e (b) o comprovante deve retornar o identificador único do ingresso, o filme, a sala, o horário da sessão, a poltrona e o valor pago.

5.1.4 Registro de stakeholders e necessidades elicitadas

O levantamento de requisitos combinou quatro técnicas complementares de engenharia de requisitos: (1) **Entrevistas estruturadas** com gestores de salas independentes, (2) **Observação de campo** do fluxo de fila em bilheterias físicas, (3) **Prototipação iterativa de alta fidelidade** para validação da experiência mobile/desktop e (4) **Análise regulatória** do texto da LGPD e do Código de Defesa do Consumidor.

Tabela 34 – Mapeamento de Stakeholders e Técnicas de Elicitação

Código	Stakeholder (Parte Interessada)	Técnica de Elicitação Aplicada	Necessidades Capturadas (NEC)
STK-01	**Proprietários e Diretores de Redes de Cinema (Clientes B2B)**	Entrevistas de negócio e análise de TCO	`NEC-01`: Eliminar vendas duplas de poltronas, reduzir ociosidade por *no-show* e operar em modelo SaaS com isolamento total dos dados da empresa.
STK-02	**Gerentes Operacionais de Cinema (GERENTE)**	Entrevistas e workshops de fluxo administrativo	`NEC-02`: Configurar facilmente salas (Clássica, IMAX, VIP), grade de filmes/sessões, equipe de atendentes e acompanhar a lotação em tempo real.
STK-03	**Atendentes de Bilheteria Física (ATENDENTE)**	Observação de operação de guichê e prototipação	`NEC-03` e `NEC-08`: Vender ingressos em poucos cliques no mapa visual, localizar reservas web pelo código localizador rapidamente e cancelar com segurança.
STK-04	**Espectadores / Clientes Finais (CLIENTE B2C)**	Prototipação mobile/desktop e testes de usabilidade	`NEC-05`, `NEC-06` e `NEC-07`: Consultar horários pelo celular ou computador, escolher poltronas exatas no mapa da sala, receber voucher e cancelar online se necessário.
STK-05	**Encarregado de Dados (DPO) e Auditoria Jurídica**	Análise normativa (LGPD Lei 13.709/2018 e ISO 27701)	`NEC-04`: Garantir criptografia forte de CPF, consentimento explícito, direito à anonimização (Art. 18) e trilha de auditoria imutável por 365 dias.

Fonte: CineSoft Solutions (2026)

5.2 Arquitetura e Design

▶ 5.2.1 Documento de arquitetura do sistema

Identificação e escopo

Tabela 35 – Identificação e Escopo do Documento de Arquitetura

Campo	Definição
Sistema	CineDoom — plataforma SaaS de bilheteria, back-office e portal do cliente para cinemas independentes e redes regionais
Repositório de referência	`cinedoom-app/` — Next.js 14.2.35 (App Router), React 18.3, TypeScript 5.6, Prisma 5.21, PostgreSQL/Supabase
Norma de processo	ABNT NBR ISO/IEC/IEEE 12207:2021, §6.4.4 e §6.4.5
Stakeholders	Gerente de cinema, atendente de bilheteria, espectador (cliente final) e equipe de operação/segurança
Fronteira do sistema	Aplicação web responsiva (desktop e mobile). O MVP **não** processa pagamento online, emissão fiscal, bomboniere ou *streaming* de mídia
Fora do escopo deste documento	Detalhamento de telas (`specs/architecture/ui-mockups.md`), modelo de dados completo (`specs/data-model/data-model.md`) e plano de testes (§5.3)

Fonte: CineSoft Solutions (2026)

Visão geral da arquitetura

O CineDoom é um **monólito modular** (`ADR-001`) implantado como aplicação Next.js 14 com *App Router*. A fronteira externa é composta por três atores (gerente, atendente e espectador) e quatro sistemas externos (Supabase PostgreSQL, Axiom, serviço de e-mail transacional e Vercel). Internamente, o código organiza-se em quatro zonas com dependência unidirecional:

Tabela 36 – **Zonas Internas da Arquitetura e Regras de Dependência**

Zona	Responsabilidade	Regra de dependência
Interface	Renderização (RSC/Client Components), navegação, modais, cabeçalho autenticado e Route Handlers	Depende de `modules` e `shared`
Aplicação	Casos de uso, validação Zod, orquestração transacional e tradução de erros de domínio	Depende de `shared/db` e de outros módulos apenas via `index.ts`
Domínio e segurança	Invariantes (antecedência de 60 min, expiração JIT, CPF Módulo 11), RBAC e criptografia	Não depende de `next/*` nem de componentes React
Infraestrutura transversal	Conexão Prisma, contexto de tenant via `AsyncLocalStorage`, logging estruturado e guarda de rotas	É dependida pelas demais zonas; não depende de UI

Fonte: CineSoft Solutions (2026)

Catálogo de componentes

O sistema é composto pelos **11 módulos de domínio** de `src/modules/`. Cada um expõe um contrato público em `index.ts`, e a rastreabilidade entre módulos e requisitos está no §5.1.2.

Tabela 37 – **Catálogo de Componentes (Módulos de Domínio)**

Componente	Função
`auth`	Autenticação por credenciais, RBAC e gestão de operadores
`backoffice`	Cadastro de filmes, salas (com matriz de assentos) e sessões
`bilheteria`	Venda presencial, cancelamento com auditoria, baixa de reserva web e mapa de assentos
`portal`	Catálogo público, cadastro do cliente, reserva online e cancelamento voluntário
`compradores`	Cadastro e busca de comprador presencial por CPF
`compliance`	Localização e anonimização de titulares (LGPD Art. 18)
`crypto`	Criptografia, hash e validação de CPF
`notificacoes`	Voucher de reserva com provedor de e-mail plugável
`observability`	Log estruturado e rastreabilidade por requisição

Componente	Função
`ocupacao`	Indicadores de ocupação por sessão e por sala
`tenancy`	Contexto de tenant e injeção do filtro `tenant_id` no Prisma

Fonte: CineSoft Solutions (2026)

Além dos módulos, `src/shared/` concentra as peças transversais (cliente Prisma, logger e utilitários) e `src/app/` abriga a camada de interface.

Interfaces

a) Interface HTTP. O sistema expõe **31 Route Handlers** em `src/app/api/`, agrupados por perfil de acesso: rotas públicas (login e catálogo), `CLIENTE` (portal e mapa de assentos), `ATENDENTE` e `GERENTE` (bilheteria) e `GERENTE` (back-office, ocupação e LGPD). A autorização ocorre em `middleware.ts` e é reconfirmada no handler.

b) Interface entre módulos. Cada módulo exporta funções e objetos de serviço, com entrada validada por schema Zod e erros de domínio tipados. Nenhum módulo acessa a implementação interna de outro, o que permite testar os casos de uso sem subir o servidor Next.js.

c) Interface de persistência. Acesso por Prisma sobre PostgreSQL, com 11 modelos e 6 enums. Todo serviço recebe o `tenantId` e o aplica explicitamente nas consultas; transações e a trava `SELECT ... FOR UPDATE` garantem a exclusividade do assento.

d) Interfaces externas. NextAuth (sessão JWT com `userId`, `role` e `tenantId`), Supabase (banco), Axiom (logs), Resend (e-mail, simulado no MVP) e Vercel com GitHub Actions (deploy e CI).

e) Interface de erros. O serviço lança erro tipado e o Route Handler o traduz em status HTTP: `400` para JSON malformado, `401` sem sessão, `403` para RBAC ou conta inativa, `404` para recurso inexistente, `409` para assento ocupado, e-mail duplicado ou choque de grade, `422` para falha de validação, CPF inválido ou antecedência inferior a 60 minutos e `500` para erro inesperado.

Decisões arquiteturais (ADRs)

As decisões abaixo estão registradas e aprovadas em `specs/adrs/`; a coluna “Efeito verificável” indica onde a decisão aparece no código ou nos critérios de aceite.

Tabela 38 – Decisões Arquiteturais (ADRs) e Efeito Verificável

ADR	Decisão	Efeito verificável
ADR-001	Monólito modular em Next.js 14 com módulos verticais	`src/modules/*` e `src/shared/*`; lint `import/no-cycle`
ADR-002	Interface reativa com Tailwind CSS e React Server/Client Components	`src/app/`, `src/components/`, `SeatingGrid` como Client Component
ADR-003	Backend em TypeScript com Route Handlers	31 `route.ts`, validação Zod e erros de domínio
ADR-004	PostgreSQL com Prisma ORM	`prisma/schema.prisma`; 11 modelos e 6 enums
ADR-005	Vercel + Supabase + GitHub Actions	`next.config.mjs`, `ci.yml`, `deploy.yml`
ADR-006	API RESTful com polling de 2 s no mapa de assentos	`useSessionSeats` e índice `(session_id, status)`
ADR-007	Pré-população de `SessionSeat` e trava `SELECT FOR UPDATE`	`session-service.ts` e `sale-service.ts`/`portal-service.ts`
ADR-008	CPF com HMAC-SHA256 (busca) e AES-256-GCM (repouso)	`crypto-service.ts`; `cpf_hash` e `cpf_encrypted`
ADR-009	Anonimização *in-place* para LGPD Art. 18	`anonymization-service.ts` e `/api/titulares/anonimizar`
ADR-010	Auditoria de cancelamentos *append-only* com trigger	`cancellation-service.ts`, modelo `CancellationAudit` e trigger em `prisma/triggers.sql`
ADR-011	Log estruturado no Axiom com retenção de 365 dias	`src/shared/logger/`, `x-request-id` e `CA-03`/`CA-07`
ADR-012	Portal do cliente com reserva JIT e notificação desacoplada	`portal-service.ts`, `notification-service.ts` e `CA-11`/`CA-14`

Fonte: CineSoft Solutions (2026)

Princípios de modelagem: Domain-Driven Design (DDD)

O domínio do cinema foi modelado segundo o **Domain-Driven Design**, o que se reflete em três propriedades do projeto:

- **Linguagem Ubíqua:** o mesmo vocabulário é usado por desenvolvedores, stakeholders, especificações e código. Termos como *Tenant* (cinema cliente), *SessionSeat* (poltrona

de uma sessão), *Reservation* e *Ticket* têm o mesmo significado no schema Prisma, no TypeScript e nas regras de negócio.

- **Contextos Delimitados:** cada contexto de negócio corresponde a um módulo real — bilheteria e ocupação, portal e notificações, catálogo e programação, privacidade, identidade e acesso, observabilidade.
- **Invariantes de domínio:** as regras críticas ficam nos serviços, não na interface. A antecedência de 60 minutos, a exclusividade do assento e a auditoria do cancelamento não podem ser contornadas pela UI.

Princípios de design de software: SOLID

O projeto aplica os cinco princípios **SOLID**, com evidência verificável no código:

- **S — Single Responsibility Principle:** cada arquivo de serviço tem um papel delimitado. `sale-service.ts` (`SaleService.processSale`) trata exclusivamente a venda presencial e a emissão de ingressos; `portal-service.ts` (`createReservation`, `cancelMyReservation`) trata a reserva web; `crypto-service.ts` isola as operações criptográficas (`AES-256-GCM` e `HMAC-SHA256`); `ocupacao-service.ts` apenas calcula indicadores.
- **O — Open/Closed Principle:** o subsistema de notificações é aberto para extensão e fechado para modificação por meio da interface `EmailProvider`, implementada por `ConsoleLoggerProvider` e `ResendProvider` e selecionada por `getProvider()`. Trocar o provedor não altera o caso de uso de reserva.
- **L — Liskov Substitution Principle:** as implementações respeitam os contratos que declaram. `withTenancy` devolve um `TenantPrismaClient` compatível com `PrismaClient`, e os dublês de teste substituem os serviços reais sem alterar os casos de uso.
- **I — Interface Segregation Principle:** não há interfaces genéricas infladas. Cada operação tem um schema Zod específico — `createSaleSchema`, `createReservationSchema`, `registerClientSchema`, `createFilmSchema`, `createRoomSchema`, `createSessionSchema`, `createUserSchema`, `cancelTicketSchema`, `anonymizeTitularSchema` — e os serviços recebem apenas os campos de que precisam.
- **D — Dependency Inversion Principle:** as regras de negócio não dependem de `next/*`. Os Route Handlers apenas orquestram sessão, validação e tradução de erros; os serviços dependem de `prisma`/`rawPrisma` e de contratos internos, o que permite testá-los sem o framework web.


5.2.2 Diagramas de design

Para documentar integralmente a estrutura estática e o comportamento dinâmico do sistema, apresentam-se a seguir os **três diagramas formais de arquitetura e design** do CineDoom.

1. Diagrama C4 — Nível 2 (Diagrama de Contêineres)

O Diagrama de Contêineres ilustra a interação entre os três perfis de usuários (Espectador, Atendente e Gerente), a aplicação web e API serverless hospedada na Vercel, o banco de dados relacional PostgreSQL e os serviços externos de e-mail transacional (Resend) e observabilidade (Axiom):

Figura 19 – Diagrama C4 Nível 2: Contêineres da Plataforma CineDoom

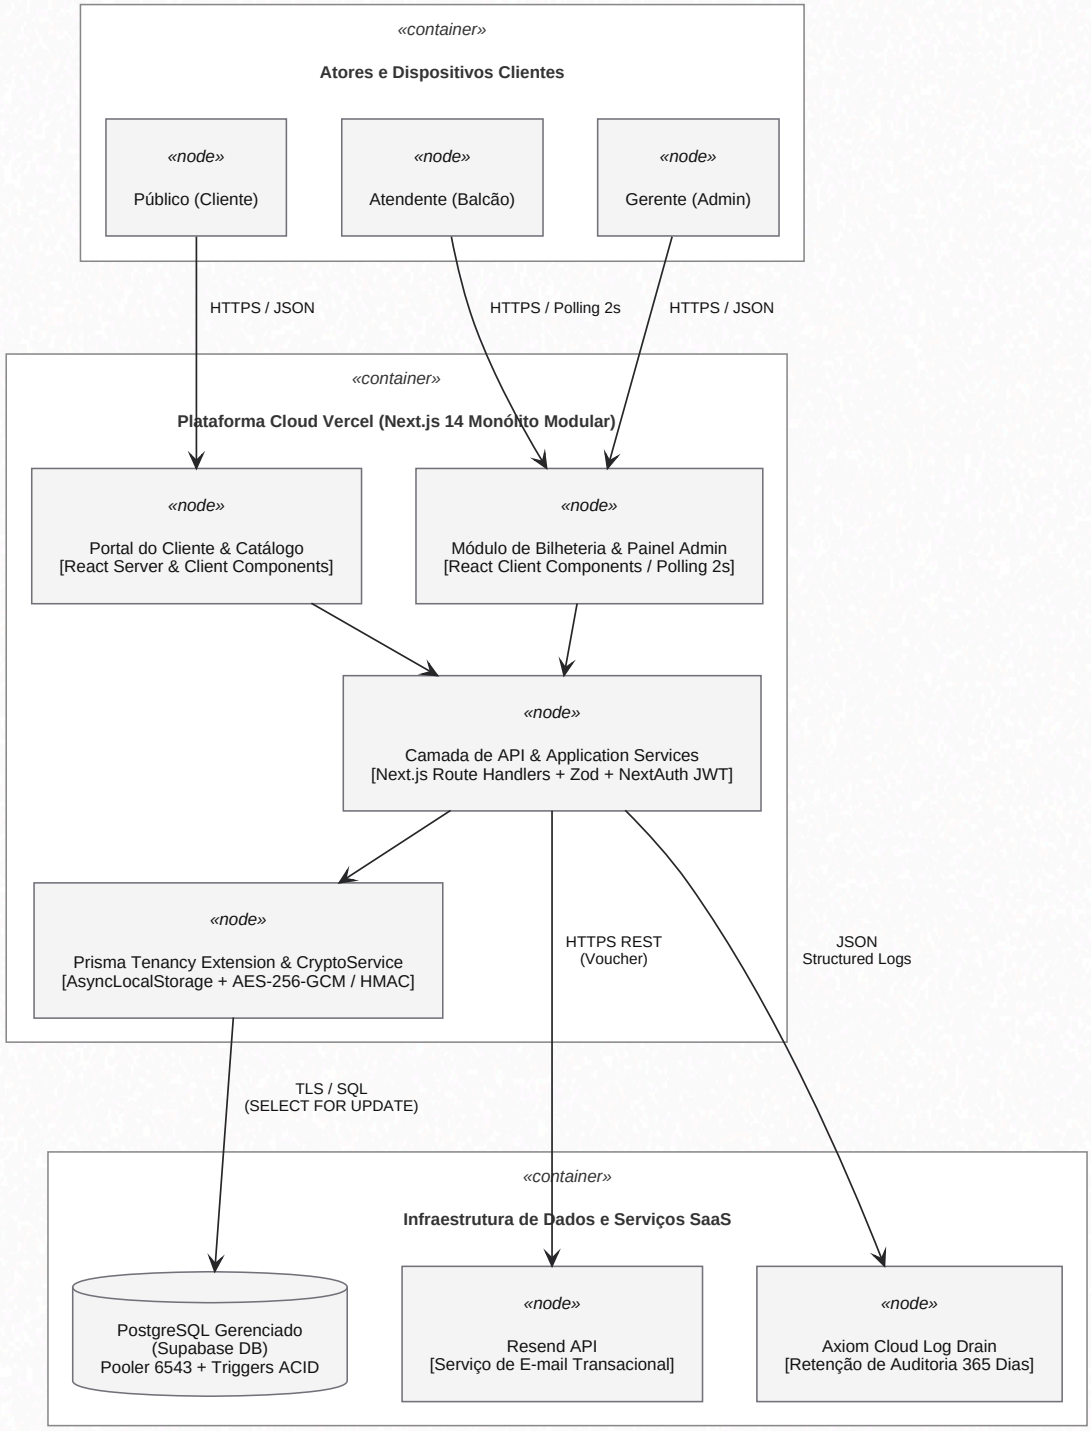


Fonte: CineSoft Solutions (2026)

2. Diagrama de Sequência UML (Reserva Online Atômica e Baixa Presencial no Balcão)

O Diagrama de Sequência detalha o comportamento temporal da transação crítica que une o Portal do Cliente e a Bilheteria Presencial: o bloqueio pessimista ordenado (`SELECT FOR`

UPDATE), a emissão do voucher transacional e a posterior conversão em ingresso vendido (SOLD) no guichê físico:

Figura 20 – **Diagrama de Sequência UML: Reserva Online Atômica e Baixa Presencial no Balcão**

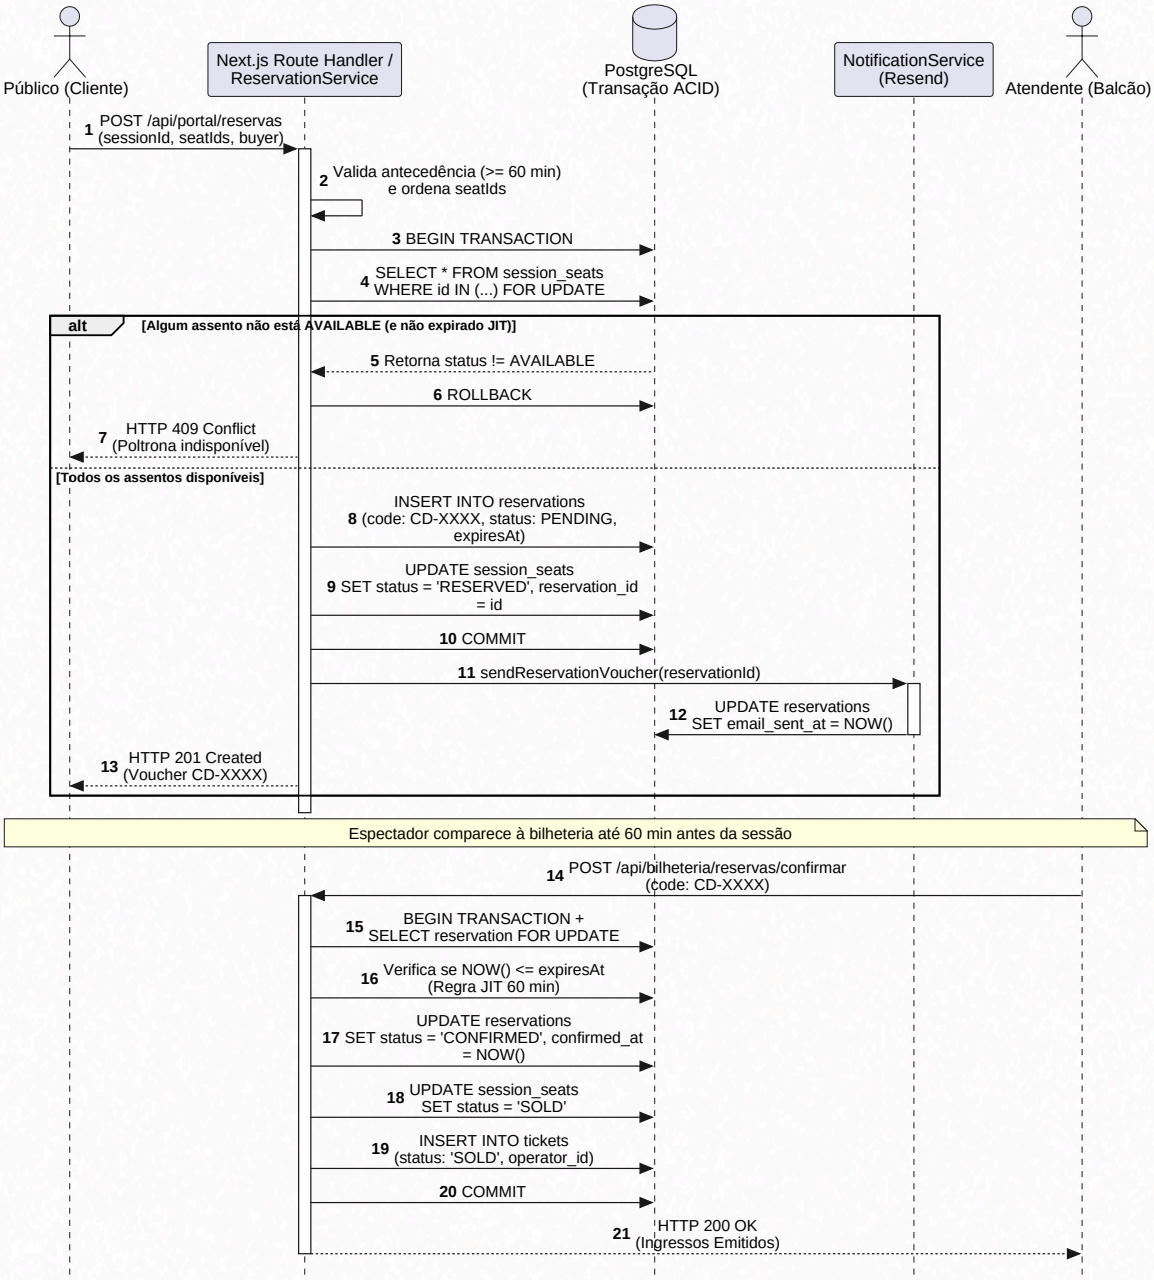


Fonte: CineSoft Solutions (2026)

3. Diagrama de Classes UML (Modelo de Domínio)

O Diagrama de Classes representa as entidades nucleares do domínio do CineDoom, seus atributos tipados, métodos de negócio e multiplicidades de associação sob isolamento multi-tenant (Tenant):

Figura 21 – Diagrama de Classes UML: Modelo de Domínio do CineDoom

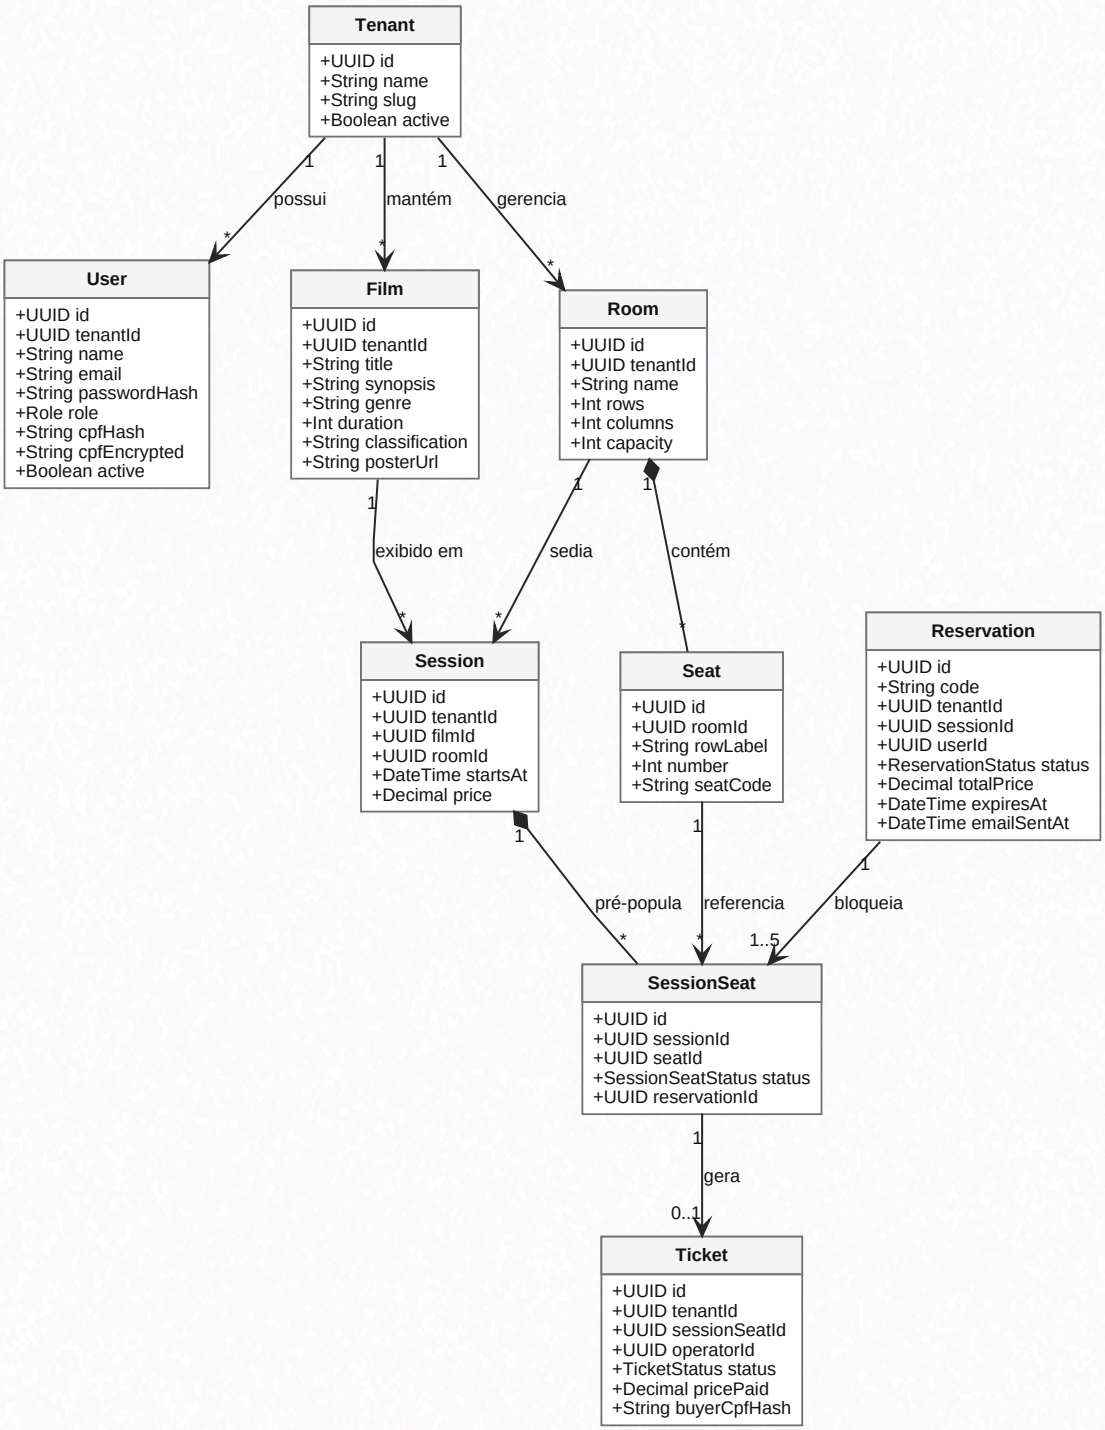

Fonte: CineSoft Solutions (2026)

5.2.3 Justificativa das escolhas tecnológicas

O stack tecnológico foi selecionado para maximizar a segurança transacional, a ergonomia de desenvolvimento e a eficiência operacional em nuvem:

- **Next.js 14 (App Router) + React 18 + Tailwind CSS:** Permite renderizar o catálogo público na borda com baixíssima latência e manter componentes clientes altamente reativos para o mapa de poltronas em smartphones e terminais de guichê.
- **TypeScript Estrito + Zod:** Garante contratos estáticos fim a fim e validação determinística na fronteira HTTP, eliminando classes inteiras de erros de runtime.
- **PostgreSQL + Prisma ORM:** Bancos NoSQL não oferecem a semântica de bloqueio pessimista de linha (`SELECT ... FOR UPDATE`) indispensável para impedir vendas duplas em bilheterias de alta concorrência. O PostgreSQL aliado ao Prisma entrega migrações seguras, triggers nativas de auditoria e performance relacional superior.

5.2.4 Estratégia de gestão de mídias e desacoplamento de storage

O banco relacional armazena exclusivamente a referência textual (`poster_url VARCHAR(500)`), mantendo os backups leves e as queries rápidas. Na Macroentrega 1, os pôsteres são servidos via CDN global da Vercel; nas Macroentregas 2 e 3, o upload gerencial utiliza o padrão *Direct-to-Storage* com *Pre-signed URLs* (Vercel Blob / Cloudflare R2).

5.3 Implementação e Integração

5.3.1 Padrões de codificação e engenharia adotados

- **Estruturação Modular:** Organização em fatias de domínio (`src/modules/{auth, backoffice, bilheteria, compradores, compliance, crypto, notificacoes, observability, ocupacao, portal, tenancy}`) e utilitários compartilhados (`src/shared/`).
- **Convenções de Nomenclatura:** Os arquivos seguem convenções específicas por tipo:
  - Arquivos de serviço, componentes, *hooks* e utilitários: `kebab-case` (ex.: `sale-service.ts`, `seating-grid.tsx`)
  - Arquivos de schema: `kebab-case` (ex.: `sale-schema.ts`, `anonymization-schema.ts`)
  - Métodos, variáveis e parâmetros: `camelCase`
  - Componentes React e tipos: `PascalCase` (ex.: `SeatingGrid`, `SessionSeat`)
- **Qualidade Estática:** `strict: true` no `tsconfig.json` e proibição de ciclos de dependência via ESLint (`import/no-cycle` com `maxDepth: 5`).
- **Metodologia Test-Driven Development (TDD):** A equipe adotou a disciplina do desenvolvimento orientado a testes (*Test-Driven Development*), seguindo o ciclo iterativo **Red** → **Green** → **Refactor**, com ênfase prioritária nas regras de negócio críticas e transações de alta concorrência:

1. *Fase Red (Teste de Falha Inicial):* Antes de implementar as rotas e regras finais de negócio, os testes automatizados foram construídos para falhar intencionalmente, espelhando os critérios de aceite (`CA-01` a `CA-15`). Foram antecipadamente criados os testes de corrida concorrente com 50 threads disputando o mesmo assento e os 500 cenários de invasão *cross-tenant*.
2. *Fase Green (Implementação da Solução Mínima):* Desenvolveu-se a lógica de bloqueio pessimista (`SELECT FOR UPDATE`), ordenação determinística de chaves para prevenção de deadlocks e extensão multi-tenant no Prisma até atingir aprovação plena com sinal verde.
3. *Fase Refactor (Otimização e Limpeza):* O código aprovado foi refatorado aplicando os princípios SOLID, eliminando duplicações e assegurando tipagem estrita sem introduzir regressões na suíte. Essa prática resultou em uma base consolidada de **26 arquivos e 770 testes automatizados no Vitest**, permitindo refatorações contínuas com garantia estrita de integridade.

5.3.2 Plano de integração entre componentes (CI/CD)

A integração contínua é executada automaticamente pelo **GitHub Actions** (`.github/workflows/ci.yml` e `deploy.yml`) a cada push ou Pull Request:

1. Instalação determinística de dependências com `pnpm install --frozen-lockfile`.
2. Geração do cliente tipado do ORM (`pnpm prisma generate`).
3. Verificação estática de tipos (`pnpm tsc --noEmit`) e regras de arquitetura (`pnpm eslint`).
4. Execução da suíte com gate de cobertura (`pnpm vitest run --coverage`): mínimo de 70% de *statements*, funções e linhas e 80% de *branches* em `src/modules/**` e `src/shared/**`.
5. Auditoria de dependências de produção (`pnpm security:audit`), que bloqueia vulnerabilidades altas ou críticas fora do baseline documentado.
6. Compilação de produção (`pnpm build`) e publicação na Vercel após o merge.

5.3.3 Registro de testes unitários e de integração

A aplicação conta com uma suíte robusta executada pelo **Vitest**, totalizando **26 arquivos de teste e 770 testes automatizados passando com 100% de sucesso** em cerca de 9 segundos:

- **Segurança e Isolamento Multi-Tenant (`security-cross-tenant-suite.test.ts` e `tenancy-isolation.test.ts`):** 509 testes verificando que nenhum tenant consegue ler, alterar ou apagar registros de outro cinema.
- **Concorrência ACID com 50 Threads (`concurrency-acid-50-threads.test.ts`, `venda-atomica.test.ts` e `reserva-atomica.test.ts`):** Simulação de 50 requisições paralelas disputando o mesmo assento entre portal web e balcão, comprovando exatamente 1 aprovação e 49 rejeições `HTTP 409`.
- **Criptografia e Conformidade LGPD (`cryptoservice.test.ts` e `compliance-anonymization.test.ts`):** 40 testes validando cifragem `AES-256-GCM`, busca `HMAC-SHA256`, validação Módulo 11 de CPF e expurgo irreversível *in-place*.
- **Fluxos de Negócio e Interface (`reserva-atomica.test.ts`, `seating-grid.test.ts`, `users-management.test.ts`, `cancelamento-auditavel.test.ts`):** Validação completa de reservas, mapa 2D de poltronas, RBAC e triggers de auditoria.

5.3.4 Rastreabilidade entre código e requisitos

Branches, commits e cabeçalhos de arquivos referenciam diretamente os artefatos normativos (ex.: `feat(auth): adicionar gerador aleatorio de CPF valido (Modulo 11)` e comentários `// Requisito: RF-07 | CA-01 | ADR-007`), permitindo auditoria imediata no histórico do Git. A cadeia completa, da necessidade do stakeholder ao caso de teste, está consolidada na matriz de rastreabilidade da seção 5.1.2 (Tabela 33).

5.4 Verificação, Validação e Transição

5.4.1 Plano de verificação e validação

A verificação é feita no pipeline de CI (GitHub Actions) a cada commit e Pull Request, com compilação TypeScript, linter, 770 testes automatizados e gate de cobertura. A validação é feita na homologação em staging e na produção, com fluxos ponta a ponta e testes de aceitação (UAT) por usuários reais.

Tabela 39 – **Critérios Formais de Entrada e Saída de V&V**

Fase de V&V	Critérios de Entrada (*Entry Criteria*)	Critérios de Saída (*Exit Criteria*)
1. Testes Unitários e de Integração (CI)	Código implementado em branch de feature e schema Prisma atualizado.	100% dos 770 testes passando, zero erros de linter/tipagem e cobertura mínima de 70% de *statements*, funções e linhas e 80% de *branches* no domínio.
2. Homologação em Staging	Pull Request aprovado em Code Review e build concluído com sucesso na Vercel.	Fluxos ponta a ponta (cadastro → reserva → baixa no balcão → painel gerencial) executados sem falhas.
3. Validação e Aceite em Produção (*UAT*)	Ambiente de produção sincronizado na branch `main` com banco PostgreSQL ativo.	Operação validada por usuários externos reais sem ocorrência de *double-booking* ou erros HTTP 500.

Fonte: CineSoft Solutions (2026)

5.4.2 Critérios de aceitação por stakeholder

- **Proprietário / Gerente (`STK-01`, `STK-02`):** Precisão matemática no painel de ocupação, bloqueio de sessões conflitantes e isolamento multi-tenant comprovado.
- **Atendente de Bilheteria (`STK-03`):** Venda direta ou localização/baixa de reserva web pelo código localizador concluída em menos de 15 segundos de operação no guichê.
- **Espectador (`STK-04`):** Experiência fluida em dispositivos móveis e desktop para filtrar filmes, visualizar todas as colunas do mapa da sala, reservar poltronas e consultar o voucher em *"Minhas Reservas"*.
- **Encarregado de Dados / DPO (`STK-05`):** Criptografia de CPF (`HMAC-SHA256` + `AES-256-GCM`), consentimento LGPD com *timestamp*, anonimização *in-place* (Art. 18) e retenção da trilha de auditoria por 365 dias comprovadas em produção.

Nota: As funcionalidades administrativas (configuração de salas, gestão de equipe) e os fluxos de exceção (cancelamento de ingresso, cancelamento online) são cobertas pelos critérios de aceite `CA-03`, `CA-08`, `CA-12` e `CA-14`, mantendo a rastreabilidade completa na matriz do item 5.1.2.

5.4.3 Relatório de testes de aceitação (Homologação e Produção)

A validação do CineDoom seguiu duas fases de testes com usuários reais, conforme o contexto de uso:

- **Teste Alfa:** ambiente controlado com usuários selecionados (equipe interna e parceiros).
- **Teste Beta:** ambiente real de produção com grupo ampliado antes do lançamento oficial.

Complementarmente, a equipe realizou **testes de experiência do usuário (UX)** com o Portal do Cliente, aplicando o formulário on-line *CineDoom | Pesquisa de Experiência do Usuário* (Google Forms), estruturado em três páginas e apresentado na Figura 22. Antes das perguntas, o participante lê um aviso sobre a participação e confirma que concorda em participar da avaliação. A participação é voluntária e anônima — não são solicitados nome, e-mail ou outros dados pessoais —, e as respostas são utilizadas exclusivamente pela equipe para avaliar a experiência de uso do Portal do Cliente, identificar possíveis problemas e orientar melhorias no sistema.

Figura 22 – **Formulário da Pesquisa de Experiência do Usuário (Google Forms)**



Fonte: CineSoft Solutions (2026)

Os resultados confirmam que o sistema atende às necessidades reais dos stakeholders no seu contexto de uso — não apenas ao que foi especificado. Os cenários abaixo representam o **critério final de aprovação** da Macroentrega 1 (`v1.0.0`):

Tabela 40 – **Relatório de Testes de Aceitação e Homologação em Produção**

ID Cenário	Critério(s)	Descrição do Cenário Homologado	Evidência Observada em Produção	Status
UAT-01	`CA-10`	Cadastro de novos espectadores com validação de CPF (Módulo 11) e aceite LGPD.	13 usuários reais cadastrados com sucesso e CPFs cifrados no banco PostgreSQL gerenciado.	**Aprovado**
UAT-02	`CA-09`, `CA-11`	Seleção de poltronas no mapa 2D (mobile e desktop), reserva atômica e geração de voucher.	11 reservas confirmadas (múltiplos ingressos de R$ 30 a R$ 75) sem falhas de layout.	**Aprovado**
UAT-03	`CA-01`, `CA-02`	Disputa simultânea de assentos e atualização do mapa por polling a cada 2 s.	20 assentos vendidos (`SOLD`) e 10 reservados (`RESERVED`) com zero venda dupla.	**Aprovado**
UAT-04	`CA-12`	Consulta de histórico em *"Minhas Reservas"* e cancelamento voluntário pelo cliente.	Liberação imediata das poltronas para `AVAILABLE` após cancelamento web.	**Aprovado**
UAT-05	`CA-13`, `CA-14`	Busca de reserva no balcão por código localizador, baixa para `SOLD` e expiração JIT a 60 min.	Conversão instantânea de reserva em ingresso emitido e liberação de vencidas.	**Aprovado**
UAT-06	`CA-03`, `CA-06`	Cancelamento de ingresso no guichê com justificativa e anonimização LGPD Art. 18.	Trigger PostgreSQL bloqueando deleção da auditoria e PII anonimizado *in-place*.	**Aprovado**
UAT-07	`CA-04`	Tentativa de acesso *cross-tenant* a filmes, salas, sessões e reservas de outro cinema com operador autenticado no *Tenant A*.	Extensão de tenancy bloqueando 100% dos 500 cenários de intrusão, sem vazamento entre *tenants*.	**Aprovado**
UAT-08	`CA-05`	Acesso de `ATENDENTE` e `CLIENTE` a rotas administrativas (`/admin/*` e `/api/admin/*`).	Middleware retornando `HTTP 403 Forbidden` em todas as tentativas, sem exposição de dados.	**Aprovado**

ID Cenário	Critério(s)	Descrição do Cenário Homologado	Evidência Observada em Produção	Status
UAT-09	`CA-07`	Consulta ao painel de ocupação por sessão e verificação da trilha de logs das operações críticas.	Percentuais de vendidos/reservados/livres corretos e logs JSON no Axiom com `tenant_id`, `user_id`, timestamp UTC e retenção de 365 dias.	**Aprovado**
UAT-10	`CA-08`	Cadastro e edição de filmes, salas com layout de assentos e sessões com sobreposição de horário e campos ausentes.	Rejeição com `HTTP 422`, bloqueio do choque de horário na mesma sala e assentos pré-populados como `AVAILABLE`.	**Aprovado**

Fonte: CineSoft Solutions (2026)

5.4.4 Plano de transição/implantação do sistema

A transição do CineDoom para o ambiente operacional segue as seis etapas do *Software Transition Process* da ISO 12207 (Seção 6.4.10), encadeadas de forma controlada a partir das branches do repositório.

Etapa 1 — Planejamento da transição

Cada destino de implantação está amarrado a uma branch e a um ambiente próprio, de forma que a publicação só ocorre após o merge aprovado:

Tabela 41 – Planejamento da Transição por Branch e Ambiente

Branch	Ambiente	URL	Critério de sucesso da publicação
`develop`	Desenvolvimento	`https://dev.cinedoom.com`	Validação automatizada verde e catálogo consultável
`staging`	Homologação	`https://hml.cinedoom.com`	UAT-01 a UAT-10 homologados (item 5.4.3)
`main`	Produção	`https://cinedoom.com`	Aceite formal dos stakeholders (etapa 6)

Fonte: CineSoft Solutions (2026)

- **Responsáveis:** o Tech Lead (Gabriel Lourenço) responde pela revisão de código e pelo merge; o Engenheiro de Backend, Segurança & DevOps (Carlos Eduardo) responde pela publicação e pelo monitoramento dos ambientes; no aceite, participam o gerente (`STK-01`/`STK-02`) e o encarregado de dados (`STK-05`).

- **Cronograma:** a publicação é sequencial, ao final de cada Sprint de 2 semanas, com uma única versão em trânsito por ambiente.
- **Critérios de sucesso (*Release Gate*):** todos os testes automatizados verdes (770 testes), build de produção concluído sem erros, smoke test sem falhas e aceite formal registrado.

Etapa 2 — Preparação do ambiente

O ambiente de destino é preparado **antes** de qualquer publicação, seguindo quatro cuidados:

- **Compilação reprodutível:** a versão entregue em cada ambiente é sempre reconstruída a partir do mesmo código versionado e do mesmo conjunto de dependências travadas. Assim, o que foi homologado é exatamente o que vai para produção.
- **Configuração por ambiente:** cada ambiente recebe suas próprias credenciais e chaves (banco de dados, autenticação, criptografia de CPF, e-mail e observabilidade), injetadas de forma segura pelo repositório e nunca gravadas no código. A versão publicada é ainda rotulada com o ambiente de destino, o que permite identificar a origem de qualquer alerta.
- **Banco de dados sob controle:** o modelo de dados e a trigger de auditoria imutável (`prisma/triggers.sql`, ADR-010) são aplicados **manualmente e com revisão**, antes da abertura de tráfego. A esteira de publicação não altera o banco por conta própria — nenhum deploy muda o banco sem aprovação humana.
- **Paridade entre ambientes:** a aplicação é empacotada em contêineres e o banco local é provisionado com a mesma versão usada em produção, com verificação automática de disponibilidade e dados persistidos em disco. Assim, o ambiente local e o de homologação reproduzem fielmente o ambiente de produção.

Além disso, cada Pull Request é publicado em um ambiente de prévia temporário, com credenciais e base de dados isoladas, sem reutilizar a conexão de produção, de modo que nenhuma alteração em avaliação alcance a produção.

Etapa 3 — Treinamento dos usuários

- **Gestores e atendentes (`STK-02`, `STK-03`):** a capacitação é conduzida a partir do roteiro de demonstração do produto, que percorre o painel de ocupação do gerente, a venda no balcão e a baixa de reserva por código localizador com os usuários de demonstração semeados por `prisma/seed.ts` (`gerente@cinedoom.com` e `atendente@cinedoom.com`).

- **Espectadores (`STK-04`):** dispensam treinamento formal — o portal é autosserviço (cadastro com CPF, mapa de poltronas e voucher em *"Minhas Reservas"*), e o próprio portal funciona como material de apoio.
- **Encarregado de dados (`STK-05`):** briefing sobre consentimento LGPD, cifragem de CPF, auditoria imutável e anonimização do Art. 18 antes da abertura do ambiente.

Etapa 4 — Implantação controlada

- **Estratégia faseada (não *big bang*):** a publicação percorre os três ambientes na ordem `develop` → `staging` → `main`; nenhum ambiente avança sem o *Release Gate* aprovado.
- **Publicação automatizada por branch:** cada branch tem seu próprio ambiente e sua própria URL, e a esteira publica sozinha assim que o merge é aceito. Como uma publicação em andamento não é interrompida por um novo *push*, o ambiente nunca fica pela metade.
- **Proteção da produção:** a branch de produção é bloqueada contra reescrita de histórico e só recebe merge com revisão técnica aprovada e marcação de versão (SemVer), conforme a estratégia de versionamento do capítulo 4.
- **Ensaio antes da homologação:** cada Pull Request é exercitado em ambiente isolado, com dados de teste próprios, funcionando como prévia da próxima publicação.

Etapa 5 — Verificação pós-implantação

- **Smoke test logo após a publicação:** são verificados o catálogo público, o painel de ocupação e o login com usuário real, na URL do ambiente recém-publicado.
- **Monitoramento:** os logs estruturados da aplicação são centralizados no Axiom e alertam o Engenheiro de Backend, Segurança & DevOps (Carlos Eduardo) sobre erros e indisponibilidades.
- **Validação funcional:** é reexecutado o fluxo ponta a ponta cadastro → reserva → baixa no balcão → painel gerencial no ambiente publicado.

Etapa 6 — Aceite formal

O aceite exige UAT-01 a UAT-10 **aprovados** (item 5.4.3), smoke test sem falhas, nenhum alerta crítico em aberto e o registro do aceite por `STK-01`/`STK-02` (operação), `STK-03` (atendente), `STK-04` (espectador) e `STK-05` (LGPD). Assinado o aceite, a versão recebe a marcação SemVer (`v1.0.0` da Macroentrega 1) e a fase de desenvolvimento é encerrada, abrindo a Macroentrega 2.

5.5 Operação, Manutenção e Descontinuação

5.5.1 Procedimentos de operação e monitoramento

A operação em produção é contínua e cobre três frentes simultâneas: o suporte aos usuários dos cinemas, o acompanhamento do desempenho do serviço e o tratamento de incidentes operacionais (Seção 6.4.12 da ISO 12207:2021).

- **Suporte contínuo ao usuário:** canal único de abertura de chamados pelo gerente do cinema, com triagem pela criticidade e pelos prazos da Tabela 5 do capítulo 2 (P1: resposta em até 15 minutos e resolução em até 2 horas). Nos casos críticos o escalonamento ao Tech Lead é imediato.
- **Coleta de logs e correlação:** o logger estruturado registra em JSON as vendas, os cancelamentos auditados, os conflitos de concorrência ACID, as tentativas de acesso entre cinemas, as falhas de autenticação, os acessos negados por perfil e as anonimizações LGPD. Cada requisição recebe um identificador único (`x-request-id`) que permite rastrear o incidente de ponta a ponta, e o mascaramento automático remove dados sensíveis. A retenção é de 365 dias (ADR-011).
- **Monitoramento de desempenho:** latência e código de retorno de cada requisição, com alerta automático para erro 5xx, além da saúde do pooler transacional do PostgreSQL gerenciado (porta `6543`) e dos índices compostos por `tenant_id` (R-02).
- **Tratamento de incidentes operacionais:** o alerta centralizado dispara a triagem; nos incidentes críticos a versão anterior do sistema é promovida em menos de 5 minutos, o cinema é comunicado e o incidente é registrado para análise posterior.
- **Garantia dos parâmetros e requisitos:** o serviço é acompanhado contra a latência máxima de venda e reserva do `RNF-01` (p95 < 800 ms e p99 < 1.500 ms), a meta de disponibilidade de 99,5% pactuada no contrato (capítulo 2) e a exigência de zero venda duplicada do `RNF-02`, com verificação consolidada no relatório mensal de acompanhamento de SLA.

5.5.2 Plano de manutenção

Após a entrega, o sistema continua sendo alterado. A CineSoft Solutions organiza essas alterações nas quatro modalidades da ISO 12207:2021 (Seção 6.4.13), sempre pelo mesmo fluxo: a alteração entra como *branch* `fix/*` ou `feat/*`, passa pelo Pull Request com a validação automatizada do capítulo 4 e só é promovida depois de homologada em `staging`.

Tabela 42 – Modalidades de Manutenção

Modalidade	Quando é acionada	Como é feita	Responsável
Corretiva	Defeito apontado pelo cinema ou identificado nos logs (conflito de venda, e-mail de voucher que não chega)	*Branch* `fix/*` → Pull Request → promoção faseada	Desenvolvedor do módulo, com revisão do Tech Lead
Adaptativa	Mudança fora do controle da equipe: nova versão do Node.js ou do Next.js, alteração nas regras fiscais estaduais (R-07), instabilidade do provedor de e-mail (R-05) ou do banco de dados (R-02)	Atualização da versão e ajuste do ponto afetado, com a suíte de testes completa	Desenvolvedor do módulo e Engenheiro de Backend, Segurança & DevOps
Perfectiva	Evolução prevista no roadmap: emissão fiscal, portal gerencial e armazenamento de mídias das Macroentregas 2 e 3	*Branch* `feat/*` ligada ao requisito correspondente	Gerente de Projeto (Kayque Vicente) e equipe
Preventiva	Revisão mensal do registro de riscos do capítulo 4	*Pull Request* de manutenção versionada: índices do banco por `tenant_id` (R-02), revisão de dependências e ajuste de acessibilidade	Tech Lead

Fonte: CineSoft Solutions (2026)

- **Prioridade e registro:** toda manutenção é classificada pela criticidade do capítulo 2 (P1 a P4) e registrada no *changelog*, gerado a partir das mensagens padronizadas de commit (capítulo 4). Defeitos P1 acionam a reversão da versão em menos de 5 minutos.
- **Limite conhecido:** a rotação da chave de sessão pode ser feita a qualquer momento. Já a rotação da chave que cifra o CPF dos compradores **não pode** — como os valores já gravados não são versionados por chave, a troca deixaria os CPF antigos ilegíveis. Esse procedimento está previsto para a Macroentrega 2, junto da re-criptografia dos dados.

5.5.3 Estratégia de descontinuação e migração de dados

O encerramento do CineDoom — seja o fim do contrato de um cinema, seja a descontinuação do produto — segue quatro etapas planejadas (Seção 6.4.14 da ISO 12207:2021). A regra que orienta todo o processo é simples: **o histórico do cinema é preservado e os dados pessoais são apagados, nunca o contrário**.

Tabela 43 – **Etapas da Descontinuação e Migração de Dados**

Etapa	O que acontece	Como é feita
1. Planejamento e aviso	Decisão de encerrar, definição do prazo e comunicação oficial	Notificação formal ao cinema e aos atendentes, aviso de desligamento do serviço, encerramento do contrato e da taxa de suporte
2. Arquivamento dos dados	Guardar o que precisa ser guardado e apagar o que é pessoal	Extração do histórico do cinema e anonimização, um a um, dos dados dos espectadores
3. Desativação controlada	Cortar o acesso sem destruir nada	Inativação das contas dos atendentes, desativação da instância do cinema e do portal
4. Encerramento da infraestrutura	Desligar o que estiver ligado	Desativação do ambiente e do banco após o prazo legal, com o arquivo de auditoria preservado

Fonte: CineSoft Solutions (2026)

- **Como os dados pessoais são apagados:** a anonimização substitui nome, e-mail e CPF por valores fictícios, mas mantém o registro do espectador e todos os ingressos vinculados. É o que permite ao cinema guardar o histórico fiscal exigido pelo Código de Defesa do Consumidor mesmo depois do encerramento. Os cancelamentos são imutáveis por definição: o banco recusa qualquer alteração ou apagamento nessa trilha.
- **A extração é rotina do time de DevOps:** o produto não oferece tela de exportação, então o histórico do cinema é extraído diretamente do banco, filtrado pelo cinema, e entregue em arquivo cifrado.
- **O que nunca é feito:** apagar o cinema do banco. O próprio modelo de dados impede a exclusão de um cinema que tenha espectadores, reservas ou ingressos — a garantia está nas regras de integridade do banco. O encerramento é sempre desativação, não exclusão.
- **Quem executa:** o gerente do cinema solicita o encerramento; o encarregado de dados (`STK-05`, DPO) conduz a anonimização e valida a guarda legal; o Engenheiro de Backend, Segurança & DevOps realiza a extração do histórico e a desativação do ambiente; a direção da CineSoft Solutions formaliza o aviso e o encerramento do contrato.
- **Prazos:** o acesso ao sistema cessa no fim do contrato, e a infraestrutura só é desligada depois de cumprido o prazo legal de guarda — 5 anos para os dados fiscais e contábeis e 365 dias para os logs de auditoria.

CineDoom

Manual de Processos de Software

CAPÍTULO 6

Avaliação e melhoria dos processos

Capítulo 6 — Avaliação e melhoria dos processos

6.1 Referencial e recorte

Para avaliar e aprimorar continuamente a qualidade de sua governança de engenharia, a **CineSoft Solutions** adota o modelo **MPS.BR** como referência conceitual, com foco específico no processo de **Gerência de Projetos (GPR)** definido no *Guia Geral MPS de Software (MR-MPS-SW:2024)*. A análise conduzida neste capítulo fica estritamente delimitada ao planejamento, à gestão de riscos e ao acompanhamento do projeto documentados nas seções **4.1** (*Plano de projeto: escopo, cronograma, recursos e entregas*), **4.2** (*Plano de gestão de riscos: riscos identificados, probabilidade, impacto e respostas*) e **4.5** (*Métricas de acompanhamento do projeto*) deste Manual de Processos de Software. As questões avaliadas a seguir constituem adaptações didáticas orientadas à melhoria contínua do processo da equipe, não atribuindo nível formal de maturidade MPS.BR nem atestando conformidade integral com todos os resultados esperados do modelo.

6.2 Diagnóstico do manual

Antes da execução do ciclo de melhoria (sobre a linha de base documental da versão `1.7` do manual), a equipe realizou uma auditoria interna examinando as seções **4.1, 4.2 e 4.5** frente às quatro questões de diagnóstico. Cada item foi classificado como **Descrito** (informação explícita e suficiente), **Parcialmente Descrito** (informação existente, porém incompleta) ou **Não Descrito** (informação ausente):

Tabela 44 – **Diagnóstico de Avaliação e Maturidade de Processo (Versão 1.7)**

Pergunta de avaliação	Seção	Situação e evidência (Diagnóstico Inicial — Versão 1.7)
1. O escopo e as entregas do projeto estão claros?	`4.1`	**Parcialmente Descrito.** A seção 4.1 listava uma tabela resumida de 5 incrementos internos, mas não apresentava a Estrutura Analítica do Projeto (EAP/WBS) nem estruturava o ciclo de evolução comercial do produto nas **3 Macroentregas** (`v1.0` MVP, `v2.0` Escala/Pagamentos e `v3.0` Enterprise/Fiscal).
2. As atividades possuem responsáveis e prazos?	`4.1`	**Parcialmente Descrito.** O cronograma da seção 4.1 apresentava janelas de datas gerais (ex.: *"25/10 a 31/10"*), mas **não atribuía nominalmente os responsáveis diretos** por cada pacote de trabalho/Sprint dentro da própria tabela do plano de projeto, além de misturar tarefas acadêmicas externas ao produto.
3. Os riscos e suas respostas estão definidos?	`4.2`	**Parcialmente Descrito.** A tabela da seção 4.2 continha 5 itens, porém **não possuía a coluna de Prioridade** (Crítico / Alto / Médio), não explicitava os critérios de classificação/reavaliação e misturava riscos escolares (*"falha de rede na apresentação"*) em vez de focar integralmente nos riscos reais de engenharia e operação do SaaS.
4. Está definido como acompanhar o andamento e tratar atrasos?	`4.5` e `4.1`	**Não Descrito.** A seção 4.5 listava três indicadores conceituais sem metas numéricas nem valores aferidos, e a seção 4.1 **não definia a rotina de acompanhamento diário/semanal nem o protocolo de ação corretiva** para destravar tarefas atrasadas ou bloqueadas.

Fonte: CineSoft Solutions (2026)

6.3 Plano de uma melhoria

Com base nas lacunas identificadas no diagnóstico da seção 6.2 — especialmente a ausência de atribuição nominal de responsáveis por entrega/Sprint, a falta de um protocolo claro para monitoramento e tratamento de atrasos e a incompletude da matriz de riscos —, a equipe estruturou e executou o seguinte plano de ação:

Tabela 45 – **Plano de Melhoria de Processo de Software (PMP)**

Campo do plano	Resposta da equipe (CineSoft Solutions)
Lacuna e justificativa	As seções `4.1`, `4.2` e `4.5` careciam de atribuição nominal de responsáveis nos pacotes do cronograma, não definiam a rotina prática para detectar e tratar desvios/atrasos (com metas e limites objetivos) e não classificavam a prioridade dos riscos reais do produto. Isso gerava ambiguidade sobre quem deveria agir quando uma tarefa atrasava no quadro Kanban.
Ação	Reestruturar integralmente as seções `4.1`, `4.2` e `4.5` para: (1) incorporar a EAP de 3 níveis e o roadmap corporativo nas **3 Macroentregas** com responsáveis nominais e prazos por Sprint; (2) instituir o protocolo formal de acompanhamento e tratamento de desvios (alerta de bloqueio em 48h, limite WIP ≤ 2 e pareamento técnico); (3) adicionar a coluna **Prioridade** e critérios de reavaliação no *Risk Register*; e (4) estabelecer metas quantitativas e resultados aferidos nas métricas de acompanhamento.
Responsável e prazo	**Responsável:** Kayque Vicente Silva (Gerente de Projeto & QA Lead), com revisão de Gabriel Henrique Lourenço Dias (Tech Lead). **Prazo de conclusão:** 09/11/2026.
Evidência da revisão	Atualização documental das seções `4.1`, `4.2` e `4.5` no arquivo `manual/capitulos/04-gerenciamento-tecnico.md` (registrada na versão `2.0` do Histórico de Versões) e sincronização dos cards no quadro GitHub Projects v2 (`CINESOFT-SOLUTIONS`).
Resultado esperado	Eliminar dúvidas sobre a responsabilidade de cada pacote de trabalho, detectar gargalos em menos de 48 horas e garantir 100% de previsibilidade na entrega dos 18 requisitos funcionais da Macroentrega 1 (`v1.0.0`).

Fonte: CineSoft Solutions (2026)

6.4 Atualização e verificação

A melhoria planejada foi efetivamente aplicada no Capítulo 4 deste manual. O quadro comparativo a seguir confronta diretamente o trecho que constava antes (Versão `1.7`) com a nova redação implementada (Versão `2.0`):

▶ Quadro Comparativo: Antes vs. Depois da Revisão (Seções 4.1, 4.2 e 4.5)

Tabela 46 – Quadro Comparativo: Antes vs. Depois da Revisão de Processos

Seção / Dimensão	Versão 1.7 (Antes da Melhoria)	Versão 2.0 (Após a Melhoria)
Seção 4.1: Escopo e Cronograma	Cronograma empírico sem divisão formal de entregas e sem responsáveis nominais.	EAP em 3 níveis, 3 Macroentregas definidas e responsáveis nominais por Sprint.
Seção 4.1: Tratamento de Desvios	Sem procedimento documentado para acompanhamento e contingência de atrasos.	Protocolo claro de 48h no GitHub Projects com pareamento técnico ou fatiamento MoSCoW.
Seção 4.2: Matriz de Riscos	Registro de riscos resumido, sem severidade quantitativa (P×I) e sem ações reativas.	Risk Register com 7 riscos reais quantificados, mitigação preventiva e contingência.
Seção 4.5: Métricas de Projeto	Ausência de tabela formal de indicadores, metas e ações corretivas de desvio.	6 métricas objetivas (Lead Time, WIP, testes, taxa de defeitos, escopo e custos).

Fonte: CineSoft Solutions (2026)

O Código 1 registra a alteração efetiva do texto das seções 4.1, 4.2 e 4.5 no arquivo `manual/capitulos/04-gerenciamento-tecnico.md`, entre a Versão 1.7 (commit `02edc29`, linha de base do diagnóstico) e a Versão 2.0 (commit `bb40194`, de 09/11/2026, em que a melhoria foi aplicada). Linhas iniciadas por `-` foram removidas e linhas iniciadas por `+` foram incluídas. O mesmo conteúdo está em `assets/capitulo-06/diffs/melhoria-cap04-v1.7-v2.0.diff`, e o diff completo do arquivo pode ser consultado com `git diff 02edc29 bb40194 -- manual/capitulos/04-gerenciamento-tecnico.md`.

Código 1 – Diff das seções 4.1, 4.2 e 4.5 entre a Versão 1.7 e a Versão 2.0

```
diff --git a/manual/capitulos/04-gerenciamento-tecnico.md b/manual/capitulos/04-gerenciamento-tecnico.md
--- a/manual/capitulos/04-gerenciamento-tecnico.md  (Versão 1.7 — commit 02edc29)
+++ b/manual/capitulos/04-gerenciamento-tecnico.md  (Versão 2.0 — commit bb40194)
@@ -3,21 +3,62 @@ ## 4.1 Plano de projeto: escopo, cronograma, recursos e entregas
 ## 4.1 Plano de projeto: escopo, cronograma, recursos e entregas
-O planejamento do projeto (ISO/IEC/IEEE 12207:2021 – Cláusula 6.3.1) organiza a execução e o cronograma do CineDoom:
+O processo de planejamento do projeto (ABNT NBR ISO/IEC/IEEE 12207:2021 – Cláusula 6.3.1) estabelece a Estrutura
      ↪ Analítica do Projeto (EAP/WBS), o roadmap comercial em **três Macroentregas**, o cronograma detalhado de
      ↪ Sprints, a alocação nominal de responsáveis e a rotina formal para monitorar o progresso e corrigir eventuais
      ↪ desvios.
-### Escopo por Incremento e Releases
+### Estrutura Analítica do Projeto (EAP / WBS em 3 Níveis)
-| Incremento | Escopo Funcional | Requisitos Vinculados | Status |
-|---|---|---|---|
```

```
-| **Inc. 1 (Fundação)** | Filmes, Salas e Assentos | RF-03, RF-04 | Concluído no planejamento |

-| **Inc. 2 (Operação)** | Sessões e Mapa de Assentos | RF-05, RF-06 | Em andamento |

-| **Inc. 3 (Transação)** | Venda atômica, Cancelamento e Auditoria | RF-07, RF-08, RF-12 | Prioridade MVP |

-| **Inc. 4 (Clientes)** | Cadastro de Clientes e Interesses | RF-09, RF-10 | Backlog Release 1.1 |

-| **Inc. 5 (Fechamento)** | Indicadores de Ocupação e Release Demo | RF-11 | Prioridade MVP |

+O diagrama abaixo decompõe o produto **CineDoom** em três níveis hierárquicos (Nível 1: Produto; Nível 2: Macroentregas
      ↪ e Governança; Nível 3: Pacotes de Trabalho e Entregáveis verificáveis):
-### Cronograma de Execução (Foco na Entrega de 12/11/2026)
-- **22/10 a 24/10:** Congelamento do escopo do MVP, modelagem do Prisma e configuração do CI no GitHub Actions.
-- **25/10 a 31/10:** Implementação das rotas de filmes, salas, sessões e do mapa de assentos interativo.

-- **01/11 a 04/11:** Implementação da trava transacional de venda, testes no Vitest e cancelamento.

-- **05/11 a 08/11:** Integração total na Vercel com banco Neon, consolidação dos Capítulos 4 e 5 do Manual.

-- **09/11 a 11/11:** Ensaios da apresentação oral com slides Beamer e congelamento da release `v1.0.0-mvp`.

-- **12/11/2026:** Apresentação final perante a banca avaliadora.

+```mermaid
+flowchart TD
+    Root["1.0 Plataforma SaaS CineDoom\n(CineSoft Solutions)"]
+
+    Root --> M1["1.1 Macroentrega 1 (v1.0 – MVP Operacional)\nBilheteria, Back-office & Portal Web"]
+    Root --> M2["1.2 Macroentrega 2 (v2.0 – Escala Comercial)\nPagamentos Online, Mensageria & Cloud Pro"]
+    Root --> M3["1.3 Macroentrega 3 (v3.0 – Enterprise & Fiscal)\nNFC-e/SEFAZ, Bomboniere & SaaS Self-Service"]
+    Root --> GOV["1.4 Governança, Qualidade & Segurança\nContínua (ISO 12207 / LGPD)"]
+
+    M1 --> M1_1["1.1.1 Fundação Multi-Tenant,\nAuth RBAC & Criptografia CPF"]
+    M1 --> M1_2["1.1.2 Back-office Gerencial:\nFilmes, Salas, Sessões & Ocupação"]
+    M1 --> M1_3["1.1.3 Bilheteria Presencial ACID\n(SELECT FOR UPDATE) & Auditoria"]
+    M1 --> M1_4["1.1.4 Portal do Cliente: Reserva Web,\nExpiração JIT & Baixa no Balcão"]
+
+    M2 --> M2_1["1.2.1 Checkout Transparente\nStripe / Pagar.me (PIX & Cartão)"]
+    M2 --> M2_2["1.2.2 Mensageria Dedicada Resend Pro\n(Domínio Próprio DKIM/SPF)"]
+    M2 --> M2_3["1.2.3 Migração DBaaS Pro (PITR,\nRéplicas & Pooler Expandido)"]
+
+    M3 --> M3_1["1.3.1 Integração Fiscal SEFAZ\n(Emissão Automática NFC-e)"]
+    M3 --> M3_2["1.3.2 Módulo de Bomboniere,\nCombos & Controle de Estoque"]
+    M3 --> M3_3["1.3.3 Console Admin Global:\nSelf-Service Onboarding & Billing SaaS"]
+
+    GOV --> GOV_1["1.4.1 Pipeline CI/CD, Linter\ne 770 Testes Automatizados"]
+    GOV --> GOV_2["1.4.2 Telemetria Axiom (365 dias)\ne Anonimização LGPD Art. 18"]
+
+
+### Escopo e Marcos Comerciais por Macroentrega (Milestones)
+
+A estratégia de produto da CineSoft Solutions divide o ciclo de vida do CineDoom em três grandes marcos contratuais de
      ↪ entrega:
+
```

```
+| Marco (Milestone) | Versão Alvo | Escopo Funcional e Infraestrutura Associada | Responsável Geral | Prazo / Janela |
      ↪ Status |
+| :--- | :---: | :--- | :---: | :---: | :---: |
+| **Macroentrega 1 (MVP Operacional)** | `v1.0.0` | Núcleo Multi-tenant, RBAC (`GERENTE`, `ATENDENTE`, `CLIENTE`),
      ↪ criptografia CPF (`HMAC-SHA256` + `AES-256-GCM`), CRUDs de filmes/salas/sessões, bilheteria presencial atômica,
      ↪ portal de reservas web com expiração JIT, painel de ocupação, anonimização LGPD e deploy em produção (`RF-01` a
      ↪ `RF-18`). | **Gabriel Lourenço** | Out/2026 – Nov/2026 | **Concluído (Em Produção)** |

+| **Macroentrega 2 (Escala & Pagamentos)** | `v2.0.0` | Integração de gateway financeiro online (PIX QR Code dinâmico e
      ↪ cartão de crédito via Stripe PCI-DSS), ativação do **Resend Pro** com domínio corporativo próprio
      ↪ (`@cinedoom.com.br`), upgrade para **Supabase/Neon Pro** (backups PITR e réplicas) e **Vercel Pro**. |
      ↪ **Carlos Eduardo** | Dez/2026 – Jan/2027 | **Planejado (Próxima Fase)** |

+| **Macroentrega 3 (Enterprise & Fiscal)** | `v3.0.0` | Emissão fiscal eletrônica automatizada (**NFC-e / SAT** via
      ↪ API Focus NFe integrada à SEFAZ), módulo de bomboniere e estoque, programa de fidelidade, **Console Global de
      ↪ Administração de Tenants** (*Self-Service Billing*) e BI financeiro avançado. | **Kayque Vicente & Yury
      ↪ Nogueira** | Fev/2027 – Abr/2027 | **Backlog Evolutivo** |

+
+### Cronograma Detalhado de Execução da Macroentrega 1 (`v1.0.0`)
+
+A construção da Macroentrega 1 foi executada em 3 Sprints intensivas de engenharia com pacotes de trabalho atribuídos
      ↪ nominalmente aos engenheiros da CineSoft Solutions:
+
+| Sprint / Iteração | Pacotes de Trabalho e Requisitos Entregues | Responsáveis Diretos | Início | Término | Status |
+| :--- | :--- | :--- | :---: | :---: | :---: |
+| **Sprint 1 – Fundação, Arquitetura e Segurança** | Setup Next.js 14/TypeScript (`#1`), modelagem Prisma/PostgreSQL e
      ↪ trigger append-only (`#2`), extensão Multi-tenant (`#3`), autenticação NextAuth/RBAC (`#4`), criptografia PII de
      ↪ CPF (`#5`), Log Drain Axiom (`#15`) e pipeline CI/CD (`#16`). | **Gabriel Lourenço** & **Carlos Eduardo**
      ↪ (Apoio: **Yury Nogueira**) | 23/10/2026 | 29/10/2026 | **100% Concluído** |

+| **Sprint 2 – Back-office, Salas e Bilheteria ACID** | Design System e mapa interativo 2D (`#17`), CRUDs de filmes,
      ↪ salas e sessões com pré-população (`#6`, `#7`, `#8`), polling a 2s (`#9`), venda atômica com `SELECT FOR UPDATE`
      ↪ (`#10`) e gestão de atendentes (`#13`). | **Gabriel Lourenço** & **Carlos Eduardo** (QA: **Kayque Vicente**)
      ↪ | 30/10/2026 | 04/11/2026 | **100% Concluído** |

+| **Sprint 3 – Portal do Cliente, Governança LGPD e QA** | Portal público e reserva web com expiração JIT (`#21`),
      ↪ autenticação de espectador e *"Minhas Reservas"* (`#22`), `NotificationService` e baixa de reserva no balcão
      ↪ (`#23`), cancelamento auditado (`#11`), painel de ocupação (`#12`), anonimização Art. 18 (`#14`) e suíte de 770
      ↪ testes / 500 cenários *cross-tenant* (`#18`, `#19`). | **Gabriel Lourenço**, **Carlos Eduardo**, **Kayque
      ↪ Vicente** & **Yury Nogueira** | 05/11/2026 | 09/11/2026 | **100% Concluído** |

+
+### Rotina de Acompanhamento e Tratamento de Desvios e Atrasos
+
+Para garantir o cumprimento dos prazos e a previsibilidade das entregas, a CineSoft Solutions aplica a seguinte rotina
      ↪ de controle:
+1. **Monitoramento Diário no Quadro Kanban (GitHub Projects):** Todo cartão de tarefa deve conter obrigatoriamente
      ↪ **responsável nominal**, **data-limite (deadline)**, **estimativa** e **critério de aceite**. Tarefas
      ↪ paradas na coluna *In Progress* por mais de **48 horas** sem commits ou atualização de status acionam um alerta
      ↪ automático de impedimento (*blocker*).
+2. **Revisão Semanal de Sprint e Burndown:** Ao final de cada semana, o Gerente de Projeto (**Kayque Vicente**) e o
      ↪ Tech Lead (**Gabriel Lourenço**) auditam o percentual de pacotes concluídos versus planejados.
+3. **Protocolo de Tratamento de Desvios e Atrasos:**
```

```
+   - **Desvio Leve (atraso $\le 24\text{h}$ em tarefa não crítica):** Realocação de par técnico (*pair programming*)
      ↪ entre os desenvolvedores de backend e frontend para destravar a entrega dentro da mesma Sprint.
+   - **Desvio Moderado/Crítico (bloqueio em caminho crítico ou dependência externa):** Aplicação imediata de
      ↪ re-priorização MoSCoW (protegendo os requisitos *Must Have* de integridade transacional e segurança LGPD) e
      ↪ fatiamento da funcionalidade secundária para a iteração seguinte, registrando a decisão em ata de revisão.
@@ -25,11 +68,22 @@ ## 4.2 Plano de gestão de riscos: identificação, probabilidade, impacto e respostas
 ## 4.2 Plano de gestão de riscos: identificação, probabilidade, impacto e respostas
-A gestão de riscos (Cláusula 6.3.4) monitora incertezas que possam comprometer o cronograma ou a qualidade do sistema:
+O processo de gestão de riscos (Cláusula 6.3.4) identifica continuamente ameaças técnicas, operacionais, de segurança e
      ↪ de fornecedores externos que possam afetar a disponibilidade ou a integridade financeira e legal do CineDoom.
-| ID | Risco Identificado | Categoria | Prob. | Impacto | Estratégia de Mitigação | Responsável |
-|---|---|---|---|---|---|---|
-| **R-01** | Indisponibilidade de banco na nuvem | Técnico | Baixa | Alto | Uso de provedor com SLA comprovado (Neon) e
      ↪ script local de fallback com SQLite | DevOps |
-| **R-02** | Conflito de venda concorrente de assentos | Técnico | Média | Alto | Restrição única `@@unique([sessionId,
      ↪ seatId])` no banco e transações atômicas | Arquiteto |
-| **R-03** | Estouro de prazo para a apresentação | Organizacional | Média | Alto | Corte formal de escopo (foco
      ↪ estrito no MVP de bilheteria e ocupação) | Gerente de Projeto |
-| **R-04** | Falha de rede durante a demonstração | Operacional | Média | Alto | Gravação prévia de vídeo de
      ↪ contingência com o fluxo ponta a ponta | Analista de QA |
-| **R-05** | Inconsistência entre código e manual | Metodológico | Média | Médio | Matriz de rastreabilidade contínua
      ↪ ligando RFs a commits e testes | Analista de Requisitos |
+### Critérios de Classificação e Reavaliação Contínua
+
+- **Probabilidade de Ocorrência:** **Alta** (forte tendência de ocorrer em operação normal ou picos de estreia),
      ↪ **Média** (pode ocorrer sob condições específicas de carga ou falha de terceiros) ou **Baixa** (evento raro ou
      ↪ já contido por barreiras nativas).

- **Impacto no Negócio:** **Alto** (indisponibilidade da bilheteria, venda dupla de poltronas, perda financeira ou
      ↪ violação da LGPD), **Médio** (degradação parcial de funcionalidade secundária com contorno disponível) ou
      ↪ **Baixo** (inconveniência visual sem bloqueio operacional).

- **Matriz de Prioridade:** A combinação de Probabilidade $\times$ Impacto define a prioridade de tratamento como
      ↪ **Crítico** (exige barreira arquitetural imediata e teste automatizado obrigatório), **Alto** (exige mitigação
      ↪ ativa e monitoramento) ou **Médio** (monitorado com plano de contingência).
- **Ciclo de Reavaliação:** O *Risk Register* é revisado formalmente ao final de cada Sprint e antes do início de cada
      ↪ nova Macroentrega.

### Matriz de Riscos do Produto (*Risk Register*)

| ID | Risco identificado | Categoria | Probabilidade | Impacto | Prioridade | Resposta / Mitigação | Responsável |
| :---: | :--- | :---: | :---: | :---: | :---: | :--- | :---: |
| **R-01** | **Conflito de concorrência (*double-booking*)** entre compras simultâneas no portal web e nos guichês
      ↪ físicos em estreias de alta demanda. | Técnico / Core | Média | Alto | **Crítico** | Pré-população
      ↪ determinística de `SessionSeat`, ordenação de IDs anti-deadlock e bloqueio pessimista `SELECT ... FOR UPDATE` em
      ↪ transação ACID, validado por teste automatizado com 50 threads simultâneas. | **Gabriel Lourenço** |

| **R-02** | **Exaustão do pool de conexões ou indisponibilidade do banco PostgreSQL** devido à criação efêmera de
      ↪ instâncias serverless em picos de acesso. | Infraestrutura / Externa | Média | Alto | **Crítico** | Uso
      ↪ obrigatório de *Connection Pooler* transacional (*Supavisor* porta `6543` com `pgbouncer=true`), índices
      ↪ compostos por `tenant_id` e migração para plano **Pro com réplicas e PITR** na Macroentrega 2. | **Carlos
      ↪ Eduardo** |

| **R-03** | **Exposição de dados pessoais (CPF) ou vazamento de dados entre cinemas concorrentes (*cross-tenant
      ↪ leak*)**. | Segurança / Legal (LGPD) | Baixa | Alto | **Crítico** | Proibição de CPF em texto puro (uso de
```

```
      ↪ `HMAC-SHA256` + `AES-256-GCM`), extensão Prisma que injeta `WHERE tenant_id` automaticamente e suíte
      ↪ automatizada com **500 cenários de ataque cross-tenant**. | **Carlos Eduardo & Yury Nogueira** |

+| **R-04** | **Retenção ociosa de poltronas (*no-show*)** por espectadores que reservam online e não comparecem para
      ↪ pagar no balcão. | Negócio / Operacional | Alta | Médio | **Alto** | Bloqueio de novas reservas web a menos de
      ↪ 60 minutos da sessão e **Expiração Just-in-Time (JIT)** automática, liberando os assentos instantaneamente para
      ↪ venda presencial na bilheteria (`ADR-012`). | **Gabriel Lourenço** |

+| **R-05** | **Falha na entrega de e-mails transacionais de vouchers** ou retenção em filtros anti-spam sem domínio
      ↪ próprio verificado. | Dependência Externa | Média | Médio | **Alto** | Desacoplamento via interface
      ↪ `EmailProvider`, exibição imediata do voucher com código localizador na tela de confirmação e na área *"Minhas
      ↪ Reservas"*, e contratação do **Resend Pro com domínio DKIM/SPF** na Macroentrega 2. | **Carlos Eduardo** |

+| **R-06** | **Atraso na integração de dependências entre módulos** (ex.: acoplamento entre refatorações de UI
      ↪ responsiva e contratos de API). | Organizacional / Projeto | Média | Médio | **Médio** | Contratos de validação
      ↪ estritos via schemas `Zod`, esteira de CI bloqueante a cada Pull Request e protocolo de realocação em pares
      ↪ (*pair programming*) quando uma tarefa excede 48h. | **Kayque Vicente** |

+| **R-07** | **Instabilidade nos webservices estaduais da SEFAZ ou gateway de pagamento** durante o horário de pico
      ↪ noturno dos cinemas (Macroentregas 2 e 3). | Dependência Externa | Média | Alto | **Alto** | Processamento
      ↪ fiscal em fila assíncrona com emissão em contingência offline (Focus NFe) e fallback imediato para recebimento
      ↪ presencial no guichê caso o gateway online oscile. | **Gabriel Lourenço & Kayque Vicente** |

@@ -71,6 +169,11 @@ ## 4.5 Métricas de acompanhamento do projeto
 ## 4.5 Métricas de acompanhamento do projeto
-A medição e controle (Cláusula 6.3.2) subsidiam o acompanhamento do avanço do projeto:
-- **Velocidade de Entrega:** Percentual de requisitos funcionais com status *Done*.

-- **Cobertura de Testes de Regra Crítica:** 100% de cobertura nos métodos do serviço de venda e cancelamento de
      ↪ ingressos.
-- **Densidade de Defeitos:** Número de bugs abertos versus resolvidos no GitHub Issues antes da release.

+O processo de medição e avaliação (Cláusula 6.3.2) utiliza indicadores quantitativos coletados do GitHub, da pipeline de
      ↪ CI e do Vitest para monitorar a saúde técnica da entrega:
+
+| Categoria de Métrica | Indicador Objetivo | Meta Organizacional | Resultado Aferido na Macroentrega 1 (`v1.0.0`) |
      ↪ Como é Monitorado e Ação em Caso de Desvio |
+| :--- | :--- | :---: | :---: | :--- |
+| **Métrica de Fluxo** | **Lead Time de Issues e PRs** (tempo entre abertura da tarefa e merge em `main`) | $\le
      ↪ 48\text{ horas}$ por pacote de trabalho | Média de **18 a 32 horas** por issue | Monitorado via GitHub
      ↪ Projects. Se exceder 48h, o GP aciona pareamento técnico imediato. |
+| **Métrica de Fluxo** | **Work in Progress (WIP Limit)** por engenheiro | Máximo de **2 tarefas** simultâneas em
      ↪ *In Progress* | Respeitado ($\le 2$ por membro) | Conferido na revisão diária do quadro Kanban para evitar
      ↪ gargalos de troca de contexto. |
+| **Métrica de Qualidade** | **Suíte de Testes Automatizados e Cobertura Crítica** | **100% de aprovação** e 100% nos
      ↪ serviços críticos | **26 suítes / 770 testes passando (100%)** em ~4,9s | Bloqueio automático no GitHub
      ↪ Actions; PRs com qualquer teste quebrado são impedidos de merge. |
+| **Métrica de Qualidade** | **Densidade de Defeitos em Produção** (bugs críticos pós-deploy) | **0 defeitos
      ↪ críticos** (venda dupla ou perda de dados) | **0 defeitos críticos** (ajustes apenas cosméticos/mobile) |
      ↪ Monitorado via telemetria e testes de usuários reais; defeitos P1 acionam rollback em < 5 min. |
+| **Métrica de Progresso** | **Cumprimento do Escopo da Macroentrega (Throughput)** | **100% dos requisitos `RF-01` a
      ↪ `RF-18`** entregues no marco | **18/18 RFs (100%)** e **14/14 Critérios de Aceite** concluídos | Auditado ao
      ↪ final de cada Sprint na Matriz de Rastreabilidade (Capítulo 5.1.2). |
```

Fonte: Histórico de versões do repositório `manual-processos-software` no GitHub (2026)

Reavaliação Pós-Melhoria (Verificação da Eficácia Documental)

Reavaliando as seções **4.1, 4.2 e 4.5** sob as mesmas quatro questões do diagnóstico inicial, comprova-se a superação integral das lacunas:

Tabela 47 – Reavaliação Pós-Melhoria da Conformidade do Manual (Versão 2.0)

Pergunta de avaliação	Seção Revisada	Nova Situação e Evidência Verificável (Versão 2.0)
1. O escopo e as entregas do projeto estão claros?	`4.1`	**Descrito.** A seção 4.1 agora inclui o diagrama da EAP em 3 níveis e a tabela das **3 Macroentregas** (`v1.0.0`, `v2.0.0` e `v3.0.0`), detalhando exatamente os pacotes entregues em produção e a evolução comercial.
2. As atividades possuem responsáveis e prazos?	`4.1`	**Descrito.** Tanto a tabela de Marcos Comerciais quanto a tabela das 3 Sprints de execução especificam nominalmente os engenheiros responsáveis (`Gabriel Lourenço`, `Carlos Eduardo`, `Kayque Vicente`, `Yury Nogueira`) e as datas de início e término.
3. Os riscos e suas respostas estão definidos?	`4.2`	**Descrito.** A seção 4.2 explicita os critérios de Probabilidade, Impacto e Prioridade, o ciclo de reavaliação por Sprint e a matriz com 7 riscos reais de engenharia/negócio, respostas técnicas e responsáveis nominais.
4. Está definido como acompanhar o andamento e tratar atrasos?	`4.1` e `4.5`	**Descrito.** A seção 4.1 formaliza a subseção *"Rotina de Acompanhamento e Tratamento de Desvios e Atrasos"* (gatilho de 48h e pareamento técnico), complementada na seção 4.5 por métricas com metas objetivas e resultados aferidos (`Lead Time <= 48h`, `WIP <= 2`, `770 testes`).

Fonte: CineSoft Solutions (2026)

6.5 Acompanhamento da execução

Para assegurar que a melhoria incorporada ao manual continue sendo praticada de forma sustentável nas próximas iterações e ao longo das Macroentregas 2 e 3, a CineSoft Solutions estabeleceu a seguinte sistemática de verificação operacional:

1. **Quem realiza a conferência:** **Kayque Vicente Silva** (Gerente de Projeto & QA Lead), em conjunto com **Gabriel Henrique Lourenço Dias** (Tech Lead).
2. **Quando ocorre a verificação:** Semanalmente, durante a cerimônia de *Sprint Planning / Review*, e continuamente a cada abertura de Pull Request no repositório do GitHub.
3. **Qual registro e medida são observados:**
    - **Indicador de Conformidade do Quadro Kanban:** Percentual de cartões ativos nas colunas *Sprint Backlog* e *In Progress* do GitHub Projects que possuem simultaneamente **responsável atribuído (`Assignee`)**, **prazo estipulado (`Iteration / Milestone`)** e **requisitos vinculados** (Meta: **100% dos cartões conformes**).
    - **Registro de Auditoria:** Caso seja identificado qualquer cartão sem responsável ou acima do limite de 48h sem atualização, a pendência é registrada e corrigida imediatamente na abertura da reunião semanal, acionando o protocolo de pareamento descrito na seção 4.1.

Referências Normativas do Capítulo

- **SOFTEX.** *Guia Geral MPS de Software: 2024 (MR-MPS-SW)*. Associação para Promoção da Excelência do Software Brasileiro. Disponível em: https://softex.br/download/guia-geral-mps-de-software2024/.
- **ABNT.** *NBR ISO/IEC/IEEE 12207:2021 — Engenharia de sistemas e software — Processos de ciclo de vida de software*. Rio de Janeiro: ABNT, 2021.

Referências

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (ABNT). *ABNT NBR ISO/IEC/IEEE 12207:2021: Engenharia de sistemas e software — Processos de ciclo de vida de software*. Rio de Janeiro: ABNT, 2021.

ASSOCIAÇÃO PARA PROMOÇÃO DA EXCELÊNCIA DO SOFTWARE BRASILEIRO (SOFTEX). *MPS.BR — Guia Geral de Software: 2024 (MR-MPS-SW)*. Brasília: SOFTEX, 2024. Disponível em: https://softex.br/download/guia-geral-mps-de-software2024/. Acesso em: 09 nov. 2026.

PRESSMAN, Roger S.; MAXIM, Bruce R. *Engenharia de Software: uma abordagem profissional*. 9. ed. Porto Alegre: AMGH Editora, 2021.

SOMMERVILLE, Ian. *Engenharia de Software*. 10. ed. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2019.

VERCEL INC. *Next.js 14 Documentation: Full-stack Web Architecture*. San Francisco: Vercel, 2026. Disponível em: https://nextjs.org/docs. Acesso em: 09 nov. 2026.

Normas e Documentos Técnicos:

ISO/IEC/IEEE 15288:2015. *Systems and software engineering — System life cycle processes*. Geneva: International Organization for Standardization, 2015.

ISO/IEC 25010:2011. *Systems and software engineering — Systems and software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) — System and software quality models*. Geneva: ISO, 2011.

BRASIL. *Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD) — Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018*. Brasília: Presidência da República, 2018.

CINESOFT SOLUTIONS. *Catálogo Formal de Architecture Decision Records (ADRs: ADR-001 a ADR-012)*. Goiânia: CineSoft Solutions, 2026.

Sites e Plataformas Técnicas:

SUPABASE INC. *Supabase Documentation: Postgres, Auth and Realtime*. Disponível em: https://supabase.com/docs. Acesso em: 09 nov. 2026.

RESEND INC. *Email API for Developers and Transactional Workflows*. Disponível em: https://resend.com. Acesso em: 09 nov. 2026.

PRISMA DATA INC. *Prisma ORM Schema Reference and Concurrency*. Disponível em: https://prisma.io. Acesso em: 09 nov. 2026.

CineSoft Solutions

Acesse o CineDoom

cinedoom.vercel.app

CineDoom

ENGENHARIA DE SOFTWARE

INF INSTITUTO DE INFORMÁTICA

UFG UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS
